Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dans l'Adamaoua et l'Est

Partenaire : MINEE (Ministère de l'Eau et de l'Énergie) · Durée prévue : 12 mois



Source : rapports annuels de l'AAEDC (2022-2024).

Table des matières

Sigles **4**

PROJET 3 : LA MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC) DANS 200 VILLAGES/COMMUNAUTES DES REGIONS DE L'ADAMAOUA ET DE L'EST **6**

2.1 Contexte et justification 6

2.2 Introduction 7

2.2.1 L'objectif principal 7

2.2.2 Objectifs spécifiques 7

2.2.3 Résultats attendus de l'activité 7

2.2.4 La méthodologie de travail 8

2.2.5 Partenariat 9

2.2.6 Durabilité et qualité 9

2.2.7 Responsabilité des parties prenantes 9

2.2.8 Visibilité du projet 10

2.2.9 Genre 10

2.2.10 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et autres exploitations et abus sexuels (EAS) 10

2.2.11 Leçons apprises dans la mise en œuvre de l'ATPC 11

2.2.12 Organisation du travail 11

2.3 Information des autorités 18

2.3.1 La Région de l'Adamaoua 18

2.3.2 La Région de l'Est 19

2.3.3 Programme d'activités et calendrier des livrables 20

2.3.4 Planning d'activités 21

2.4 Etats des lieux 23

2.4.1 Introduction 23

2.4.2 L'objectif principal 23

2.4.3 Objectifs spécifiques 23

2.4.4 Résultats attendus de l'activité 23

2.4.5 La méthodologie de travail 24

2.4.6 Activités menées pour la période 25

2.4.6.1 La rencontre avec les différentes autorités 25

2.4.6.2 La prospection des localités 27

2.4.6.3 Etat des lieux dans le département du DJEREM 27

2.4.6.4 Etat des lieux dans le département du MAYO BANYO 38

2.4.6.5 Etat des lieux dans le département du HAUT-NYONG 52
2.5 Le déclenchement des communautés 65
2.5.1 Introduction 65
2.5.2 L'objectif principal 65
2.5.3 Objectifs spécifiques 65
2.5.4 Résultats attendus de l'activité 65
2.5.5 La méthodologie de travail 65
2.5.6 Activités menées pour la période 68
2.5.6.1 Le recyclage du personnel du terrain sur l'approche ATPC et l'IEC/C4D 68
2.5.6.2 La rencontre avec les différentes autorités 68
2.5.7 Le déclenchement de l'ATPC 69
2.5.7.1 Les déclenchements dans le département du DJEREM 69
2.5.7.2 Les déclenchement dans le département du MAYO BANYO 79
2.5.7.3 Les déclenchements dans le département du HAUT-NYONG 98
2.5.8 La mise en place des CLS et des plans d'action communautaire 108
2.6 Le suivi des plans d'action communautaire 108
2.6.1 Contexte de la mission 108
2.6.2 L'objectif principal 109
2.6.3 Objectifs spécifiques 109
2.6.4 Résultat attendu de l'activité 109
2.6.5 La méthodologie de travail 109
2.6.6 Activités menées 110
2.6.6.1 Le renforcement des capacités des CLS 110
2.6.6.2 Le suivi des plans d'action communautaire dans les Régions de l'Adamaoua et de l'Est 110
2.7 Résultats obtenus 164
2.8 Difficultés rencontrées et solutions proposées 165
2.9 Suggestions 165
2.10 Leçons apprises et un succes story (l'histoire raconté par un maire relativement à l'adoption des bonne pratiques 166
2.11 Conclusion 166

Sigles

AAEDC : Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire
ACF : Action Contre la Faim
ASC : Agent de Santé Communautaire
ASFH : Association Serbowel Facilitateur Humanitaires
ATMS : Assainissement Total en Milieu Scolaire
ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté
BAD : Banque Africaine de Développement
BH : Boko Haram
CAL : Comité d'Aide au Logement
CERF : Central Emergency Response Fund
CERPLE : Centre Régional de Prévention et de la Lutte contre les Epidémie
CHAST : Child Hygiene and Sanitation Training
CGPE : Comité de Gestion du Point d'Eau
CLS : Comité Local de Suivi
CNI : Carte Nationale d'Identité
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
C4D : Comminication For Development
DAL : Défécation à l'Air Libre
DDEE : Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie
DLM : Dispositif lave-mains
DS : District de Santé
DREE : Délégation Régionale de l'Eau et de l'Energie
DS : District de Santé
DTM : Displacement Tracking Matrix
EAS : Exploitation et Abus Sexuels
ECHO : Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement
ETT : Emergency Tracking Toll
EMS : Evaluation Multisectorielle
FDAL : Fin de la Défécation à l'Aire Libre
FOSA : Formation Sanitaire
IDPs : Internally Displaced Person
GANE : Groupes Armés Non Etatiques
GHM : Gestion de l'Hygiène Menstruelle
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
MINEDUB : Ministère de l'Education de Base
MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINSANTE : Ministère de la Santé
MSA : Multisectoral Assessment
NFIs: No Food Items
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PA : Personnes âgées
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PDIs : Populations déplacées internes
PEAS : Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels

PEV : Programme Elargi de Vaccination
PF : Point Focal
PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation
PUI : Première Urgence Internationale
RRM : Rapid Response Mechanism
SRO : Solution de Réhydratation Orale
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
VAD : Visite A Domicile
VBG : Violences Basées sur le Genre
WASH : Water Sanitation Health

PROJET 3 : LA MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC) DANS 200 VILLAGES/COMMUNAUTES DES REGIONS DE L'ADAMAOUA ET DE L'EST

2.1 Contexte et justification

L'assainissement dans toutes ses dimensions constitue un aspect fondamental du bien-être social, économique et sanitaire des populations. Ce caractère a été reconnu en 2010 par l'Assemblée générale des Nations Unies qui a déclaré que le droit à l'assainissement fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Garantir ce droit est aussi l'une des cibles du sixième Objectif de Développement Durable (ODD): « D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. »

Au Cameroun, les résultats de l'enquête EDS1 2018, montrent qu'en dépit des efforts du gouvernement et ses partenaires, 12 % des ménages en milieu rural contre 5% dans l'ensemble des zones urbaines et rurales, pratiquent encore la défécation à l'air libre qui constitue le plus bas niveau de 'pratique' d'assainissement. Ce même document de référence présente encore un bilan peu élogieux en révélant que dans le quintile de bien-être économique le plus bas, 24 % des ménages n'utilisent pas de toilettes et défèquent en plein air. A travers sa Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), le Gouvernement est conscient du problème et reconnait que la situation de l'assainissement est préoccupante aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Il s'est ainsi fixé l'objectif d'atteindre un taux d'assainissement de 60% à l'horizon 2035.

Une stratégie nationale d'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) accompagnée d'un guide harmonisé de mise en œuvre de l'ATPC a été élaborée en 2017. La vision du Gouvernement dans le secteur de l'assainissement telle que stipulée dans ce guide étant de faire du Cameroun, « Un pays émergent, débarrassé de la défécation à l'air libre, avec un accès de tous à un assainissement équitable et durable, un des leviers essentiels de sa transformation socio-économique. ». L'objectif de changement stratégique adopté pour la mise en œuvre de l'ATPC au Cameroun est de 'mettre fin à la défécation d'ici 2035, palier essentiel vers l'accroissement du taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement des ménages et écoles en milieu rural de 15% à 50% en 2025 et 60% en 2035.

C'est dans ce contexte que s'inscrira la mission de l'ONG qui sera retenue pour la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté dans 200 villages/communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est.

[1] Enquête Démographique et de Santé 2018, Institut National de la Statistique (INS), Ministère de la Santé Publique Yaoundé, Cameroun (2018)

2.2 Introduction

2.2.1 L'objectif principal

L'objectif visé par la présente activité consiste à affranchir les populations de 200 villages/communautés ciblées (y compris dans les écoles, formations sanitaires et autres lieux publics des localités concernées) dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est de la pratique de la défécation à l'air libre à travers la mise en œuvre de l'approche « ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE(ATPC)

2.2.2 Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, il s'agit de :

- Identifier parmi les communautés/villages ciblées dans la liste ci-jointe, celles qui sont éligibles conformément aux indications du guide méthodologique de l'ATPC ;
- Renforcer les capacités de toutes les CTD locales ainsi que des associations à base communautaire à l'appropriation de l'Approche ATPC ;
- Mettre en œuvre toutes les étapes de l'ATPC conformément aux directives de la stratégie et du guide méthodologique ;
- Porter au moins 80% des communautés déclenchées au statut FDAL (marqué par leur certification) au terme de la mission ;
- Accompagner les populations pour la santé et l'hygiène menstruelles dans les communautés, écoles et formations sanitaires concernées ;
- Assurer en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisée, la pérennisation des résultats en élaborant des mécanismes de durabilité ;

Il est attendu de l'ONG de :

- Entreprendre la prospection des villages/communautés :
- Organiser 5 ateliers (en regroupant certaines communes) de formation à l'ATPC des personnels en charge des questions d'assainissement et d'hygiène, auprès des communes, des districts de santé, des services déconcentrés du MINEE, des Associations à base communautaires ;
- Déclencher l'ATPC dans 200 Communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est
- Mettre en place et renforcer les capacités des membres des comités locaux de suivi
- Elaborer et signer avec les Communes respectives les plans d'actions communales relatifs au suivi-évaluation post-déclenchement et post-FDAL qui intègre les plans d'action communautaires;
- Suivre les Communautés déclenchés jusqu'à l'organisation des campagnes de certification FDAL au profit d'au moins 80% des Villages/communautés déclenchés.

2.2.3 Résultats attendus de l'activité

Les résultats attendus sont les suivants :

- Les 200 villages/communautés éligibles à l'ATPC sont identifiées selon les règles de l'art ;
- Les ateliers d'appropriation de l'approche ATPC sont organisés à l'attention des personnels des CTD ainsi que des associations à base communautaires;
- Toutes les étapes de l'ATPC sont mises en œuvres dans les communautés identifiées.
- 80% au moins des communautés déclenchées ont acquis le statut FDAL (marqué par leur certification) au terme de la mission.

2.2.4 La méthodologie de travail

La réalisation de l'ATPC suit un phasage et des tâches globalement bien arrêtées. Toute la différence tient dans la cohérence de la description méthodologique du consultant. Ainsi, il est attendu du consultant une méthodologie présentant des activités/tâches bien structurées, cohérentes avec les résultats attendus, les périodes de mise en œuvre et le budget. Il décrira les mesures pratiques pour prendre en considération le genre, l'équité et la durabilité.

Ce projet entre en droite ligne de :

- **Des Objectifs de l'ATPC** : Ce projet contribue directement à **l'objectif 6** (Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau) et indicateur 6.2 (D'ici à 2030, assurer l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable)

- **Des objectifs et résultats fixés pour la composante Eau, Assainissement et Hygiène** dans le cadre du Programme de Coopération gouvernement du Cameroun et Banque d'Afrique de Développement. Il s'intègre dans **l'effet 01** (D'ici 2022, les populations vulnérables des zones cibles (y compris celles affectées par les situations d'urgence) utilisent les points d'eau et infrastructures d'assainissement de base et adoptent de bonnes pratiques d'hygiène) Plus spécifiquement, les activités du projet contribueront au produit 01-01 (Les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de base sont disponibles pour les populations vulnérables des zones cibles). Les résultats atteints dans la mise en œuvre de ce projet permettront de renseigner l'indicateur 1-4 du produit 1 : Nombre de communautés ayant atteint le statut de Fin de Défécation à l'Air Libre (FDAL)

- **Au Plan Communal de Développement des communes** concernées qui présente comme principaux problèmes :

  - Difficultés d'accès à l'eau potable ;
  - Difficultés liées lié à la protection de l'environnement dont l'absence de latrine et Absence de point de dépôt d'ordure et Insalubrité publique (ordures, toilettes publiques et privées, abattoirs) avec pour effet entre autres la présence des matières fécales à l'air libre et la perte des biens et des vies.

2.2.5 Partenariat

Pour la mise en œuvre de ce projet, les différents partenariats seront noués ou mobilisés :

- Le MINEE qui a signé un partenariat avec AAEDC pour la mise en œuvre du projet dans la région de l'Est et l'Adamaoua.
- Les acteurs gouvernementaux : MINEE, MINSANTE, MINJEC et MINEDUB seront également partie prenante de la mise en œuvre de ce projet.
- Les districts des santés, les communes et les aires de santé de la zone cible serons au centre du projet.
- Les ONG intervenant dans les localités. Des synergies seront établies et noués entre AAEDC et les interventions des autres acteurs dans le domaine qui sont présents dans les communes. Des discussions seront entamées pour une collaboration dans le cadre de la mise en place des comités de gestion des points d'eau basé sur les outils développés et sur un modèle d'auto-détermination communautaire.

2.2.6 Durabilité et qualité

Pour la qualité des résultats, un accent particulier sera mis sur la maitrise des objectifs visés par le projet et le renforcement des capacités de l'ONG dans la mise en œuvre des interventions. Le projet mettra les communes au cœur des interventions non seulement pour une meilleure appropriation mais surtout pour assurer la durabilité des résultats du projet. Un processus d'accompagnement dans les communes sera mis en place pour permettre à cette dernière de jouer efficacement son rôle. Tenant compte des leçons tirées des précédents programmes, les ressources pour le suivi seront allouées aux services déconcentrés du MINEE à temps afin de leur permettre de mieux assumer leurs fonctions de lead des comités de suivi composés du MINEE, MINSANTE et MINEDUB.

2.2.7 Responsabilité des parties prenantes

Les différentes parties prenantes (BANQUE D'AFRIQUE de DEVELOPPEMENT, ONG, Gouvernement, Communes, communautés) collaboreront de manière étroite et constructive pour l'atteinte des résultats du projet.

- **Commune** Les communes seront chargées de la mobilisation des conseillers municipaux et autorités traditionnelles dans les différentes phases de mise en œuvre du projet. Elle mettra à la disposition de l'ONG le personnel en charge des questions d'hygiène et d'assainissement pour un accompagnement permanent. Elle mobilisera les ressources financières requises pour s'acquitter de ses responsabilités convenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
- **MINEE/MINSANTE/MINEDUB/ MINJEC et services déconcentrés**
  - Appui technique à la mise en œuvre du projet ;
  - Renforcement des capacités de l'ONG ;
  - Facilitation des activités ;
  - Mise en œuvre des activités spécifiques ;
  - Suivi et évaluation des activités ;

- Evaluations du projet ;
- Suivi et supervision des activités ;
- Capitalisation du projet.

- **AAEDC :** Responsabilité de la mise en œuvre complète des activités telle que décrites dans les TRDs du document de projet. Elle bénéficiera de l'assistance technique et appui institutionnel des gouvernementaux (MINEE et MINSANTE). Elle assurera une mobilisation des structures locales et une collaboration étroite avec les communes. Elle assurera la Co-facilitation de la coordination du projet sous le lead du MINEE.

2.2.8 Visibilité du projet

Pour assurer une plus grande visibilité du projet :

- Une réunion de présentation du projet sera organisée en présence des acteurs locaux.
- De même, le matériel de visibilité produit comportera le logo des organisations partenaires clefs et le titre du projet.
- Une équipe de communication effectuera des descentes dans les localités en mi-parcours du projet afin de présenter les résultats du projet.
- Il sera en plus demandé aux ONG partenaire de produire en moyenne une ‘’Human Interest story’’ relative au projet chaque mois accompagné de photos.

2.2.9 Genre

Dans les comités locaux de suivi, un comité ne sera valide que si la proportion des femmes est au moins de 1/3. Dans les comités de gestion des points d'eau, selon les modèles de gestion choisies, les femmes seront encouragées à prendre une part active. Des thématiques spécifiques liées aux problèmes spécifiques aux femmes notamment la gestion de l'hygiène menstruelle sera abordée.

2.2.10 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et autres exploitations et abus sexuels (EAS)

Toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) constituent une violation des droits de l'homme et un abus de pouvoir sur une population vulnérable que les Nations Unies et d'autres acteurs humanitaires et de développement se sont engagés à protéger. L'EAS et les VBG peuvent entraîner des conséquences néfastes graves, parfois permanentes, pour les survivants, en particulier les enfants survivants. En outre, cela porte atteinte à l'intégrité et à la réputation des nations Unies et des autres acteurs humanitaires et de développement et peut menacer la sécurité de leur personnel et de leurs opérations.

Promouvoir une politique de tolérance zéro en matière d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) pour tous les employés de l'ONG et le personnel concerné et veiller à ce que les rôles, les responsabilités et les normes de conduite attendues en matière d'EAS soient connus au sein d'AAEDC. Créer et maintenir un environnement sûr, exempt d'ESE, en prenant des mesures appropriées à cette fin, en interne et dans les communautés où l'ONG opère, par un travail de prévention et de réponse solide.

2.2.11 Leçons apprises dans la mise en œuvre de l'ATPC

L'expérience acquise par le programme dans la mise en œuvre de l'ATPC a relevé :

- **Importance du suivi** : le suivi des bénéficiaires (communauté, CLS) aussi par les ONG que les services déconcentrés du Gouvernement est un élément important pour assurer le respect des engagements pris par les communautés lors des déclenchements de l'ATPC.
- **Nécessité d'implication des communes et autorités locales** : dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC, il est important pour une plus grande durabilité et un meilleur suivi et appropriation des résultats de l'ATPC d'assurer une meilleure implication des communes et autorités administratives (sous-Préfet et Préfet). L'implication des communes doit être matérialisée en début du projet.
- **ATPC** : Porte d'entrée du paquet d'interventions WASH au niveau communautaires. La mise en œuvre de l'ATPC dans le précédent cycle du programme de coopération BANQUE D'AFRIQUE DE Développement Gouvernement du Cameroun a prouvé que l'ATPC est une opportunité de promotion d'un ensemble des bonnes pratiques liée à l'eau l'hygiène et l'assainissement. Cette approche offre également un mécanisme pour assurer une synergie avec les secteurs de Santé, Nutrition, Education et Hygiène menstruelle.
- **Motivation des animateurs/membres des comités locaux de suivi**. Les membres du comité local de suivi jouent un rôle très important dans la mise en œuvre du projet et l'atteinte des résultats. Pour ce faire, comme éléments de motivations, les membres du comité local de suivi seront équipés en matériel de visibilité (T-shirt, casquette, sacs). Chaque membre du comité local recevra 5 morceaux de savon une fois sa latrine achevée ou mise en conformité. Et dès ce moment un total de 5 morceaux de savons lui sera remis mensuellement par l'ONG durant toute la durée du projet.
- **Durée du projet** : la durée de mise en œuvre des projets est de 12 mois. Il permettra d'assurer un suivi minimum Post FDAL. Il est important d'assurer la durabilité des résultats obtenus d'accompagner les communes pendant une période pour un meilleur ancrage du suivi post FDAL dans ses activités.

2.2.12 Organisation du travail

Les activités suivantes seront mises en œuvre en étroite collaboration avec les autorités administratives et communales. Ces activités comprennent :

a. Formation de l'ONG

Au total 02 sessions de formation seront organisées au profit des ONG :

✓ **Session #1 : formation de l'ONG sur l'Etat de lieu**

Une session de formation de l'ONG sur la réalisation des enquêtes rapides sera organisée. Les formulaires et méthodologie d'enquêtes couvriront les thématiques sur l'eau,

l'hygiène, l'assainissement, la nutrition, hygiène menstruelle, le VIH-SIDA et la santé. Les participants à cet atelier de formation comprendront :

- Les représentants des ONG de mise en œuvre (Chef de mission, facilitateurs, co-facilitateurs, agents de santé, agents d'éducation et agents d'ambiance,)
- Les responsables des formations sanitaires de la zone du projet
- Les Représentants des services déconcentrés du MINEE (DDEE, Chef service Régional de l'Eau,) ;
- Les chefs services hygiène des communes

✓ **Session #2 : Recyclage de l'ONG sur l'ATPC**

Un atelier de recyclage du personnel de mise en œuvre de l'ONG sera organisé sur l'ATPC. Cet atelier sera basé sur le guide de mise en œuvre de l'ATPC au Cameroun. Un rappel des outils du PHAST sera également présenté. L'accent sera mis au cours de cet atelier de formation sur les outils de suivi et module de formation des communautés. Cet atelier de formation sera organisé à l'intention du personnel (agent de terrain, superviseur, assistant, coordinateur) et des chefs services hygiène des communes couvertes. Cet atelier participatif sera facilité par le personnel du MINEE et MINSANTE avec l'assistance des points focaux régionaux.

b. Réalisation des enquêtes sur l'Etat de lieu

Deux enquêtes d'état de lieu seront réalisées durant la période de mise en œuvre du projet. Cette enquête couvrira les domaines de l'eau et l'assainissement mais également quelques indicateurs clefs des secteurs tels que la protection, la santé, l'hygiène menstruelle et nutrition. Avoir une base de donner des District des santés de la zone d'intervention dans les Délégation Région de la santé de l'EST et L'Adamaoua.

- Une enquête rapide initiale qui sera réalisée dans les communes concerner avant le démarrage des activités de promotion des bonnes pratiques sur l'eau l'hygiène et l'assainissement et cela permettra aussi d'avoir la situation de départ. Lors de l'enquête d'état de lieu rapide initiale, la situation de l'assainissement sera également examinée et permettra d'identifier les communautés remplissant les critères pour le déclenchement de l'ATPC. La consultation des sources secondaires (commune et des projets, programme et organismes) complètera cette collecte d'information pour la connaissance des différents groupes existants.
- Une enquête finale réalisée au terme du projet. Celle-ci permettra de mesurer les changements survenus dans le niveau de connaissance, aptitude et pratiques des populations en relation avec l'eau l'hygiène et l'assainissement, le VIH, la nutrition, hygiène menstruelle et la santé. Cette enquête sera également l'occasion de collecter les informations sur les associations de jeunes, de femmes et autres groupes existant au sein des communes, pour la pérennisation du projet.

c. Présentation du Projet, déclenchement institutionnel et validation des villages

Une réunion sera organisée avec l'ensemble des parties prenantes des communes cibles avec un triple objectif :

- Présenter et valider les résultats de l'enquête rapide d'état de lieu menée dans les communes cibles
- Procéder au déclenchement institutionnel de l'ATPC
- Présenter et assurer le cadrage du projet.

Cette réunion de voir les villages remplissant les critères minimums pour le déclenchement de l'ATPC.

- Au moins 50 ménages dans le village ou une population de plus de 250 personnes ;
- Plusieurs cas de DAL sont observés et observables dans le village ou la communauté,
- Au moins 50% des ménages ne disposent pas de latrines avant le déclenchement de l'ATPC ;
- Pas de projet sur l'assainissement en cours dans la zone (ATPC, Projet subventionné).

Ce sera également l'occasion d'identifier les pratiques et connaissances néfastes les plus présentes et à accorder une importance dans le cours du projet.

d. Déclenchement de l'ATPC

Au terme de la formation, des équipes de facilitateurs de déclenchement seront constituées. Chaque équipe sera responsable d'un nombre pré déterminé de villages et procédera au déclenchement de l'ATPC en 3-4 jours tenant compte des réalités de terrain. Dans le respect du processus de déclenchement de qualité, aucune équipe ne devra déclencher plus de 4 villages en une journée et ce, quelle que soit la distance séparant deux villages. L'équipe sera accompagnée de l'agent Communal d'Hygiène, d'un conseilleur municipal dans la mesure du possible, du Superviseur, et du Chef de l'aire de Santé. Au terme de chaque déclenchement, un comité local de suivi volontaire sera mis en place et composé de trois membres dont au moins une femme. Le guide de déclenchement servira d'outil principal à l'animation des déclenchements. Chaque déclenchement sera matérialisé par le remplissage d'une fiche de déclenchement signé par le chef du village ou de la communauté.

e. Formation des comités locaux de suivi (CLS)

Pour les villages ayant été déclenchés : les leaders naturels identifiés dans les villages participeront à une formation visant à leur transmettre les connaissances et aptitudes requises pour mener à bien le suivi de la mise œuvre du plan d'action élaboré par la communauté. La formation portera sur les mesures de prévention et de lutte contre le choléra, les techniques de construction des latrines, le suivi des activités de promotion des bonnes pratiques, sensibilisation sur la prévention de Covd 19 et la protection sur le PEAS. Cette formation sera animée par les animateurs terrain et le superviseur avec l'appui des points focaux régionaux.

Dans les villages non déclenchés et possédant des relais/animateurs communautaires, ceux-ci seront invités à prendre part aux sessions de formation. Pour les communautés situées en zone urbaine ou semi urbaine, 2 représentants au moins de chaque association (formelle ou

non formelle) de femmes ou de jeunes seront invités à la formation. Cet atelier portera sur la définition d'un mécanisme de collecte de données, la formation sur les bonnes pratiques et l'élaboration d'un plan d'action de chaque entité.

f. Suivi de comités de gestion des points d'eau de la zone

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le personnel de l'ONG devra assurer le suivi des comités de gestion des points d'eau situés dans la zone d'implémentation du projet. A cet effet, il devra : (i) recenser et géo référencer l'ensemble des points d'eau existant dans la commune et le statut de leur comité de gestion (i) Mobiliser les communautés pour la mise en place/redynamisation du comite de gestion de points d'eau ; (ii) Former et Accompagner les comités pour la mobilisation des ressources financières nécessaire à l'entretien et la réparation des points d'eau en panne. L'artisan réparateur de la commune concerné sera chargé du suivi technique des points d'eau de la zone (forage). Le modèle de gestion sera laissé à l'appréciation des communautés. L'ONG facilitera le choix du mécanisme de gestion le mieux adapté par et pour chaque communauté. A cet effet, il effectuera des descentes pour le suivi technique une fois chaque deux mois dans les communautés. L'outil de mise en place des comités de gestion des points d'eau sera l'outil principal d'animation de cette formation.

g. Mise en œuvre des interventions intégrées (WASH, Education, Santé, Nutrition et l'hygiène menstruelle) au niveau communautaire.

Les séances de sensibilisation porteront sur différents thèmes. Celles-ci seront conduites à l'aide des différents outils.

- Intervention WASH et Nutrition

Les membres du comité local de suivi de l'ATPC seront en charge de la mise en œuvre du paquet intégré d'activités WASH, hygiène menstruelle et Nutrition au niveau communautaire. Leurs interventions seront renforcées par les animateurs de l'ONG et responsables des aires de santé en charge du suivi des membres du CLS. Ces interventions comprennent :

- Le dépistage des enfants notamment la mesure du périmètre brachial par les mères/donneurs de soins d'enfants MAS (malnutrition sévère) et leur référencement pour prise en charge (y compris la sensibilisation sur le respect des rendez-vous dans les centres nutritionnels) ;
- La sensibilisation sur les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
- Le suivi de la qualité de l'eau. Il sera assuré autant par les membres du CLS que par les animateurs de l'ONG et responsables des formations sanitaires en charge du suivi.
- Participer aux séances de sensibilisation de groupe du programme de fortification alimentaire à domicile pour renforcer la sensibilisation sur les pratiques WASH ;
- Une séance de sensibilisation sera organisée sur l'hygiène menstruelle de la jeune fille.

Les kits WASH doivent être fournis aux enfants MAS via le centre de santé. Cependant le suivi de l'utilisation de ces kits se fera au niveau familial par les membres du CLS avec l'appui des animateurs de l'ONG.

- Intervention WASH et Santé

Les ménages seront sensibilisés sur les pratiques familiales essentielles notamment la prise en charge à domicile des cas de diarrhée simple. Les interventions WASH viseront également à s'assurer que les formations sanitaires disposent du minimum de services WASH. De ce fait un point de formation des communautés sur les prototypes de lavage des mains et la potabilisation de l'eau à domicile sera assuré dans l'ensemble des communautés.

- Intervention WASH, Education, Covid 19, ATMS (Assainissement Total en Milieu scolaire)

Afin de s'assurer de la durabilité des interventions, les enfants et la communauté éducative (enseignants, directeurs, Associations des Parents d'Elevés, des Enseignants et des Mères d'Elèves, le comité de Gestion des centres Préscolaires communautaires) seront ciblés au travers l'assainissement total en milieu scolaire. L'ONG assurera la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au sein des écoles et leurs édifier sur la prévention de Covid 19. A cet effet, chaque animateur sera responsable du suivi des écoles se trouvant dans sa zone d'intervention. Il favorisera l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'action scolaire pour la promotion et l'adoption des bonnes pratiques sur l'eau l'hygiène et l'assainissement. Les manuels CHAST, hygiène et assainissement en milieu scolaire serviront d'outil pour la mise en œuvre de cette formation. Ceci devra se faire en étroite collaboration avec les comités de suivi des points d'eau alimentant l'école, les APEE/AME et les gouvernements d'enfants ou autre club existant au sein desdites écoles.
Un plaidoyer sera fait par l'ONG pour la prise en compte des problématiques liées au changement climatique dans le choix des options d'ouvrages (latrine, point d'eau, aménagement des espaces vert) à mettre en place.

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque thématique, les outils d'animation minimum recommandés.

Thèmes	Outils	Observations
Technique et moment clé de lavage des mains	Boite à Image Choléra, autocollant lavages des mains	Version revue
Prévention et lutte contre le Choléra :	Boite à Image Choléra	UNICEF
Prévention et lutte contre le Covid 19	Boite à image Choléra	UNICEF/MINASANTE
Technique simple de potabilisation de l'eau	Affiches	UNICEF
Conservation et transport de l'eau	Manuel WASH	
Hygiène Menstruelle	Manuel/Guide GHM	
ATMS	Manuel CHAST	UNICEF
Gestion des points d'eau	Guide d'animation des COGES	Version revue par le groupe standard Wash National
Malnutrition	Stratégie WASH in Nut	

Ces séances seront animées par les animateurs de l'ONG.

h. Suivi des activités du projet

Le suivi des activités sera assuré par différents acteurs selon la périodicité ci-dessous :

- Les relais communautaires: effectuent des descentes régulières au sein de leurs communautés selon un programme convenu et adapté à leur occupation.
- Les Animateurs terrain/responsable des associations locales : effectuent 1 descente de suivi minimum dans chaque village par semaine. Les descentes de suivi seront l'occasion d'échanger avec les membres du comité local de suivi sur l'évolution des travaux de construction des latrines et d'équipement en lave-mains et les difficultés rencontrées tant par les membres de la communauté que par les membres du comité de suivi dans l'exercice de leur fonction. Les animateurs de terrain effectueront à cette occasion une visite des ménages avec un accent pour les ménages qui adhèrent faiblement au projet et ceux qui ont achevé leurs latrines entre deux visites. Au moins une fois toutes les deux semaines, des séances de sensibilisations sur les bonnes pratiques liées à l'eau l'hygiène et l'assainissement et la nutrition seront animées par les animateurs de terrain.
- Chaque superviseur effectuera 3 missions de suivi par semaine dans les zones d'activités des animateurs terrain sous sa responsabilité. Il les appuiera à cet effet dans une visite de suivi au niveau communautaire. Ces descentes seront également l'occasion pour chaque superviseur de collecter les données de suivi des indicateurs auprès des animateurs communautaires.
- Le Coordonnateur du projet effectuera des descentes de suivi une fois par mois dans l'ensemble des zones du projet.

- La Direction de l'ONG effectuera une descente en début, mi-parcours et fin de projet afin d'apprécier le début, la mise en œuvre et les résultats du projet. Chaque descente de suivi sera accompagnée d'une descente de terrain dans une aire de santé/commune. Elle sera également l'occasion d'échanger avec les autorités administratives et communales sur le projet, les difficultés et identifier les actions d'atténuation. Les principaux obstacles, les mesures de mitigations et propositions d'amélioration. Ces descentes de la direction feront l'objet d'un rapport spécifique (5 pages maximum) qui sera partagé avec le MINEE.

i. Réunions de coordination

Une réunion mensuelle de suivi des indicateurs du projet sera tenue entre l'ONG (coordonnateur du projet, superviseurs, animateur), MINEE (Staff WASH, hygiène menstruelle, Nutrition, C4D, Education), les communes, les partenaires gouvernementaux. Cette réunion sera présidée par le communes et co-facilitée par le MINEE. Le rapport de cette séance de travail (maximum 5 pages) sera envoyé par le coordonnateur du projet aux autres participants qui se chargeront d'assurer la transmission dudit rapport à leur équipe du niveau central. Cette réunion sera élargie à quelques membres des CLS et relais communautaires. Le choix sera porté sur les relais les plus engagés.

j. Evaluation continue du statut FDAL

Afin de déterminer le statut des villages, des évaluations périodiques seront conduites sous le leadership du MINEE.

- Evaluation à mi-parcours : Elle aura lieu 3 mois après les déclenchements et formation des CLS. L'évaluation mi-parcours sera conduite par les points focaux régionaux des Délégations Régionales de l'Eau et de la santé et le coordonnateur du projet. Il sera question au cours de cette mission d'évaluer le niveau de mise en œuvre des activités et la réponse des communautés encadrées et de formuler des observations et recommandations pour la suite du projet. La seconde évaluation mi-parcours sera combinée à l'évaluation finale.
- Evaluation finale : Elle aura lieu 6 mois après le déclenchement du projet, elle sera menée par MINEE et MINSANTE, les évaluateurs nationaux, les Point Focaux du MINEE, MINEDUB, MINJEC et MINSANTÉ, et du partenaire de mise en œuvre. Elle permettra d'identifier les villages ayant atteint le statut FDAL. Un rapport d'évaluation sanctionnera cette mission et précisera l'ensemble des villages déclarés FDAL.

k. Réunion de restitution des évaluations

Au terme de l'évaluation à mi-parcours une réunion de restitution des résultats de la mission sera tenue en présence des chefs de villages de l'ensemble de la commune. Cette réunion sera placée sous le guide du Sous-préfet de la localité et avec la présence du maire de la commune. L'ONG de mise en œuvre facilitera la préparation logistique de cet atelier.

Au terme de l'évaluation finale, les résultats seront présentés au Sous-préfet et à l'exécutif communal de la localité. Ces derniers pourront également être présentés au conseil municipal peut également.

l. Célébration

Après l'évaluation finale, une cérémonie sera organisée afin de célébrer le statut FDAL des villages retenus. Seront invités à ces cérémonies le MINEE, les Autorités Administratives, Municipales, traditionnelles, les PF (MINEE, MINEDUB, MINSANTÉ), les communautés bénéficiaires. Ces célébrations seront organisées par la commune avec l'appui de l'ONG de mise en œuvre.

m. Suivi Post FDAL

Il sera effectué par le Chef de mission, les facilitateurs, les animateurs et les agents communaux pendant 6 mois, afin de veiller au maintien de la FDAL dans les villages concernés. Un système de veille et d'alerte sera mis en place pour que le MINEE et le MINSANTE soient automatiquement saisis de tout cas de reprise de la défécation à l'aire libre dans un village. La commune assurera le leadership dans le suivi Post FDAL. L'ONG sera chargée d'accompagner les communes dans la mise en œuvre de son Plan d'action. Ce Plan d'action inclura une réunion trimestrielle de suivi de la situation des bonnes pratiques avec l'ensemble des conseillers municipaux.

2.3 Information des autorités

Lors de la mise en œuvre du projet, nous avons tour à tour rencontré les autorités administratives ainsi que les autorités traditionnelles suivantes pour une prise de contact afin de les informer sur les objectifs, le but, les attentes, les résultats et activités et le personnel intervenant du projet et la présentation globale du projet :

2.3.1 La Région de l'Adamaoua

- Le Gouverneur de la Région de l'Adamaoua ;
- Le Délégué régional du MINEE de l'Adamaoua ;
- Le Préfet du Djérem ;
- Le Préfet du Mayo Banyo ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Banyo ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Mayo Darlé ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim ;
- Le Maire de la commune de Tibati ;
- Le Maire de la commune de Ngaoundal ;
- Le Maire de la commune de Banyo ;
- Le Maire de la commune de Mayo Darlé ;

- Le Maire de la commune de Bankim ;
- Le délégué départemental MINEE du Djerem ;
- Le délégué départemental MINEE du Mayo Banyo ;
- Le chef de district de sante de TIBATI ;
- Les chefs des aires de santé de DJOMBI, NGAOUBELLA, MEIDJAMBA, LIBOUM, MBAKAOU, NGATT, ALLAT MANGACK ET TONGO dans le DS de Tibati ;
- Le chef de district de sante de Ngaoundal ;
- Les chefs des aires de santé de BEKA GOTTO, DANFILI, BAGODO, BETARA, NGAOUNDAL CATHOLIQUE ET DJOUNDE dans le DS de Ngaoundal ;
- Le chef de district de sante de Banyo ;
- Les chefs des aires de sante d'ALLAT, BANYO-FADA, BANYO-TICKET, MBAMTI KATARKO, TARAM YABAM, NDI WAWA, SAMBO LABO, BOUMDO, RIBAO dans le DS de Banyo
- Le chef de district de sante de Bankim ;
- Les chefs des aires de sante de DIEKI, NGATTI, MAPE SONEL, BANDAM, NYAMBOYA, SARKI BAKA SONKOLONG, ATTA, SOMIE/TCHAMBA dans le DS de Bankim
- Les chefs des localités concernées et les chefs des différents quartiers.

2.3.2 La Région de l'Est

- Le Gouverneur de la Région de l'Est ;
- Le Délégué régional du MINEE de l'Est ;
- Le Préfet du Haut Nyong ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement d'Abong Mbang ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Mindourou ;
- Le Maire de de Tibati ;
- Le Maire de la commune d'Abong Mbang ;
- Le Maire de la commune de Mindourou ;
- Le délégué départemental MINEE du Haut Nyong ;
- Le délégué départemental MINEE du Mayo Banyo ;
- Le chef de district de sante d'Abong Mbang ;
- Les chefs des aires de sante de : ABONG MBANG SUD, ABONG MBANG OUEST, ABONG MBANG EST, DJAPOSTEN, NKOUAK;
- Les chefs des localités concernées et les chefs des différents quartiers.

2.3.3 Programme d'activités et calendrier des livrables

N°	Livrables (D…)	MOIS															TOTAL
		2022								2023							
		Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	
D-1	Livrable N°1 : **Rapport de premier établissement et de démarrage**																*1*
	Collecte des données																
	Rédaction du Rapport																
	Rapport préliminaire																
	Finalisations des commentaires																
	Remise du rapport final au client																
D-2	Livrable N°2 : **Rapport sur l'état des lieux**																*2*
	Collecte des données																
	Rédaction du Rapport																
	Rapport préliminaire																
	Finalisations des commentaires																
	Remise du rapport final au client																
D-3	Livrable N°3 : **Rapport des déclenchements**																*3*
	Collecte des données																
	Rédaction du Rapport																

	Rapport préliminaire																
	Finalisations des commentaires																
	Remise du rapport final au client																
D-4	Livrable N°4 : **Rapport de suivi-évaluation des communautés**																***5***
	Collecte des données																
	Rédaction du Rapport																
	Rapport préliminaire																
	Finalisations des commentaires																
	Remise du rapport final au client																
D-5	Livrable N°5 : **Rapport final**																***1***
	Collecte des données																
	Rédaction du Rapport																
	Rapport préliminaire																
	Finalisations des commentaires																
	Remise du rapport final au client																

2.3.4 Planning d'activités

N°	**Activités**	**2022**								**2023**						
		Mai	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**
1	Formation des ONG															

2	Réalisation des enquêtes d'état de lieu et évaluation rapide															
3	Déclenchement institutionnel et validation des villages ATPC															
4	Déclenchement de l'ATPC															
5	Formation des comités locaux de suivi (CLS)															
6	Formation et sensibilisation communautaire															
7	Suivi des comités de gestion des points d'eau de la zone															
8	Distribution de kits WASH															
9	Suivi du projet															
10	Suivi Communal															
11	Suivi Départemental															
12	Réunions de coordination															
13	Evaluation continue du statut FDAL															
14	Evaluation régionale															
15	Evaluation Nationale															
16	Réunion de restitution des évaluations															
17	Célébration															
18	Suivi Post FDAL															
19	ATMS (Assainissement Total en Milieu scolaire)															

2.4 Etats des lieux

2.4.1 Introduction

La mission de l'AAEDC se décline en plusieurs étapes dont la première concerne le pré-déclenchement. Ce pré-déclenchement consistera à faire l'état des lieux en choisissant les communautés/villages éligibles, en établissement un climat de confiance et enfin en collectant les informations requises sur la communauté. C'est à partir de cette phase que les CTD, les Districts de santé, les services déconcentrés du MINEE et les leaders communautaires devront s'approprier la pertinence et les enjeux de la mission pour leur adhésion efficace et efficiente à l'atteinte des résultats escomptés.

C'est dans ce contexte que s'inscrira la mission de l'ONG pour la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté dans 200 villages/communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est.

2.4.2 L'objectif principal

L'objectif visé par la présente activité consiste à faire un état des lieux pour pouvoir avoir une situation de départ des communautés en ce qui concerne l'eau et l'assainissement dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est.

Ce présent rapport fera également l'objet de l'identification des 200 villages/communautés ciblés dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est devant bénéficier de la stratégie d'ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC).

2.4.3 Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, il s'agit de :

- Identifier parmi les communautés/villages ciblées dans la liste ci-jointe, celles qui sont éligibles conformément aux indications du guide méthodologique de l'ATPC ;
- Restituer les listes pour validation par les experts et les parties prenantes.
- Consolider les listes définitives des communautés retenues pour bénéficier des interventions d'ATPC.

Il est attendu de l'ONG d'organiser les séances de restitution de la prospection.

2.4.4 Résultats attendus de l'activité

Les résultats attendus sont les suivants :

- Les 200 villages/communautés éligibles à l'ATPC sont identifiées selon les règles de l'art ;
- 200 localités validées par la commission des recettes.

2.4.5 La méthodologie de travail

La réalisation de l'ATPC suit un phasage et des tâches globalement bien arrêtées. La méthodologie de l'activité dite « états de lieux » va être axée sur :

- La rencontre avec les différentes autorités pour l'obtention des listes des localités concernées par l'activité ;
- La prospection proprement dite ;
- La validation de la liste des 200 localités à déclencher.

✓ **La rencontre avec les différentes autorités**

Lors de la phase de négociation entre l'équipe du projet et l'ONG, la discussion a porté sur l'identification des zones potentielles d'intervention. Il s'agit des départements du Djerem, Mayo Banyo et le Faro et Déo dans la Région de l'Adamaoua ainsi que du Haut Nyong et de la Boumba et Ngoko dans la Région de l'Est.

✓ **Prospection des localités**

Une prospection des localités concernera l'accès des populations à l'eau et l'assainissement mais également quelques indicateurs clefs afin d'avoir une base de données des différentes communes de la zone d'intervention. Une enquête rapide initiale sera réalisée dans les communes concernées avant le démarrage des activités de promotion des bonnes pratiques sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement permettra aussi d'avoir la situation de départ. Cette prospection permettra également d'identifier les communautés remplissant les critères pour le déclenchement de l'ATPC. La consultation des sources secondaires (communes et des projets, programme et organismes) complètera cette collecte d'information pour la connaissance des différents groupes existants.

✓ **Réunion de validation des villages**

Une réunion sera organisée avec l'ensemble des parties prenantes à l'effet de valider les résultats de l'enquête rapide d'état de lieu des 200 localités remplissant les critères minimums pour le déclenchement de l'ATPC.

- Au moins 50 ménages dans le village ou une population de plus de 200 personnes ;
- Plusieurs cas de DAL sont observés et observables dans le village ou la communauté,
- Au moins 40% des ménages ne disposent pas de latrines avant le déclenchement de l'ATPC ;
- Pas de projet sur l'assainissement en cours dans la zone (ATPC, Projet subventionné) ;
- Regroupement des localités qui ne remplisse les critères en termes de populations ;
- Diviser les localités à forte populations en plusieurs communautés.

Ce sera également l'occasion d'identifier les pratiques et connaissances néfastes les plus présentes et à accorder une importance dans le cours du projet.

2.4.6 Activités menées pour la période

2.4.6.1 La rencontre avec les différentes autorités

Lors de la phase de négociation entre l'équipe du projet et l'ONG, la discussion a aussi porté sur les zones d'intervention. Il est ressorti de ces échanges sur la lecture des TDRs que globalement cinq départements ont été peu touchés ou n'ont jamais bénéficiés de l'approche de l'ATPC. Il s'agissait des départements du Djerem, Mayo Banyo et le Faro et Déo dans la Région de l'Adamaoua ainsi que des départements du Haut Nyong et de la Boumba et Ngoko dans la Région de l'Est.

De part ces échanges la première action menée par l'ONG après l'obtention de l'ordre de service de démarrage a été la rencontre des délégués régionaux du MINEE respectivement de l'Adamaoua puis de l'Est.

- ✓ **Rencontre avec le Délégué Régional du MINEE de l'Adamaoua**

Une session de travail a eu lieu entre le Délégué Régional du MINEE et l'ONG dans les services de la DREE de l'Adamaoua. Il a été question de :

- La prise de contact ;
- La présentation des TDRs ;
- Le choix de la zone d'intervention du projet concernant l'ATPC dans la région de l'Adamaoua;
- L'introduction auprès des autorités administratives des zones concernées.

Après un aperçu général par le DREE de la situation de l'assainissement dans la région de l'Adamaoua, il est ressorti que les zones non couvertes ou peu couvertes étaient les départements du Djerem, Mayo Banyo et le Faro et Déo. D'un commun accord le choix a été fait sur la prospection des départements du Djerem et Mayo Banyo dans un premier temps compte tenu des objectifs à atteindre et le souci de la couverture maximale des communes dans ces départements.

Ainsi des lettres d'introduction (lettres en annexe) ont été adressées par le DREE de l'Adamaoua aux différentes autorités (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets, DDEE, Districts de santé, communes) pour un meilleur accompagnement et la diligence des actions à entreprendre par l'ONG.

- ✓ **Rencontre avec le Délégué Régional du MINEE de l'Est**

Une session de travail a eu lieu entre le Délégué Régional du MINEE et l'ONG dans les services de la DREE de l'Est. Il a été question de :

- La prise de contact ;
- La présentation des TDRs ;
- Le choix de la zone d'intervention du projet concernant l'ATPC dans la région de l'Est ;

- L'introduction auprès des autorités administratives des zones concernées.

Après un aperçu général par le DREE de la situation de l'assainissement dans la région de l'EST, il est ressorti que les zones non couvertes ou peu couvertes étaient les Départements du Haut Nyong et de la Boumba et Ngoko. D'un commun accord le choix a été fait sur la prospection dans le département du Haut Nyong dans un premier temps compte tenu des objectifs à atteindre et le souci de la couverture maximale des communes dans ce département.

Ainsi le DREE de l'Est a mis l'ONG en contact avec la DDEE du Haut Nyong afin de faciliter l'introduction auprès des autorités administratives dans ce département (Préfet, Sous-préfets, Districts de santé, communes).

✓ **Rencontre avec les maires des communes.**

Des sessions de travail ont eu lieu avec les Maires des communes suivantes :

- Tibati et Ngaoundal dans le département du Djérem, Région de l'Adamaoua ;
- Banyo, Mayo Darlé et Bankim dans le département du Mayo Banyo, Région de l'Adamaoua ;
- Abong Mbang, Mindourou et Angossas dans le département du Haut Nyong, Région de l'Est.

Il a été question de :

- La prise de contact ;
- La présentation des TDRs ;
- La mise à la disposition de l'ONG de la liste des potentielles localités à prospecter ;
- La mise à la disposition de l'ONG d'une personne ressource.

Des listes (en annexe) ont été mises à la disposition de l'ONG et les différents maires lui ont proposé de se rapprocher des districts de santé pour obtenir les données socio-économiques actualisées des différentes localités.



Photo 1 *: **E**ntretien avec l'Adjoint au Maire de la commune de Ngaoundal*

- ✓ **Les chefs des localités concernées et les chefs des différents quartiers**

Des rencontres ont été organisées avec les différents chefs traditionnelles. Ces rencontres avaient pour but d'informer ces derniers sur les objectifs et buts du projet et avoir leurs accords et rendez-vous avec leurs communautés sur le déroulement de l'activité.

2.4.6.2 La prospection des localités

Afin d'atteindre l'objectif de 200 villages à déclencher, l'une des activités majeures dans le cadre de l'APTC est l'identification des villages répondant aux critères de sélection. Dans le cadre de cette activité, sont prioritaires les localités des zones rurales. Les grandes agglomérations et les zones urbaines ne seront pas touchées lors de cette phase. C'est dans cette optique que AAEDC a tenu d'abord des rencontres préparatoires avec :

- L'équipe du projet ;
- Les Délégués régionaux du MINEE de l'Adamaoua et de l'Est ;
- Les Délégués départementaux du MINEE du DJEREM, MAYO BANYO ET DU HAUT NYONG ;
- Les chefs de district de sante de TIBATI, de NGAOUNDAL, DE BANYO ET D'ABONG MBANG ;
- Les chefs des aires de santé pour avoir une base de données en ce qui concerne la liste des ONGs présentes et villages déjà déclenchés,
- Entretiens et collecte des informations auprès des leaders communautaires (leaders religieux, chefs de villages…), les agents de santé communautaires ainsi que les relais communautaires sur les lieux.
- Observations directes au niveau de village…

Une enquête rapide initiale a été réalisée dans les communes concernées avant le démarrage des activités de promotion des bonnes pratiques sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement et cela nous a permis aussi d'avoir la situation de départ. Lors de l'enquête d'état de lieu rapide initiale, la situation de l'assainissement a été également examinée et a permis d'identifier les communautés remplissant les critères pour le déclenchement de l'ATPC. Les consultations des sources secondaires (communes et des projets, programmes et organismes) complèteront surement cette collecte d'informations pour la connaissance des différents groupes existants.

Cette activité sera également un tremplin qui nous permettra d'identifier les communautés remplissant les critères pour le déclenchement de l'ATPC et le niveau de vulnérabilité de ces populations.

2.4.6.3 Etat des lieux dans le département du DJEREM

Pendant cette période allant du 11 Mai au 30 juin 2022, AAEDC a mené des séances d'entretiens avec les autorités dans les communes de TIBATI et de NGAOUNDAL département du Djerem région de l'Adamaoua, pour mener des activités dans les communautés des deux

communes sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Deux types d'activités ont été menés :

- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des deux communes, puis la présentation du projet dans sa globalité et les objectifs spécifiques.
- La prise de contacts avec les chefs des aires de santé sanitaire et l'état des lieux dans les différents villages que couvre chaque aire de santé.

✓ Principaux résultats attendus au cours de cette période

Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Les chefs traditionnels sont informés par les autorités Administratives, sanitaires et municipales pour la participation massive au projet dans leurs localités ;
- La liste des villages que couvrent les communes de Tibati et de Ngaoundal et les listes détaillées du district de santé par aire de santé ont été mises à la disposition de l'équipe de mise en œuvre du projet (AAEDC).

Une réunion a été organisée avec l'équipe de terrain sur l'avancement des activités.

✓ Activités menées durant la période

Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:

- Le suivi du planning de l'organisation ;
- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des communes Tibati et Ngaoundal a été respectée ;
- La collecte des données par aire de santé dans les villages a été effective selon le planning qui a été établi par la structure de mise en œuvre.


✓ Activités dans la Commune de TIBATI

o Données démographiques

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 09 aires de santé sur les 15 que compte le DS de TIBATI. 53 villages ont été touchés dans cette commune;

Tableau N° 1 : *Récapitulatif du nombre de ménages et population par aire de santé de TIBATI*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre Ménages	Population Total	Enfants de 0 à 5 ans	Hommes	Femmes
1-	TIBATI	DJOMDI	434	6135	1077	2088	2970
2-		NGAOUBELA	1219	8031	1048	3096	3887
3-		MEIDJAMBA	608	4041	752	1420	1869
4-		LIBOUM	463	3760	935	1297	1528
5-		MBAKAOU	192	1342	281	484	577
6-		NGATT	1440	12380	1410	4851	6119
7-		TIBATI	200	1388	262	591	535
8-		ALLAT MENGACK	616	7413	2897	2658	1858
9-		TONGO	376	2643	502	956	1185
	TOTAL TIBATI		**5548**	**47133**	**9164**	**17441**	**20528**

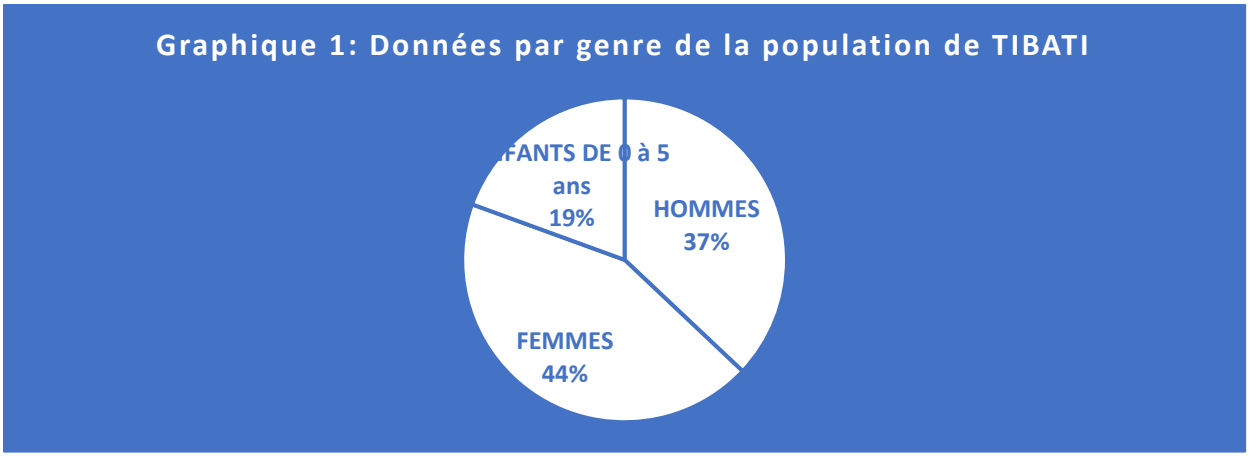

- **Situation de l'assainissement (latrine)**

Concernant la situation des latrines, Six (06) aires de santé sur les neuf (09) visitées ont un pourcentage d'au moins 50% des ménages qui défèquent à l'air libre.

Tableau N° 2 : *Situation des latrines par aire de santé de Tibati.*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrines avec dispositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1-	TIBATI	**DJOMBI**	434	6135	162	110	324	75%	0	0	0	34	115
2-		**NGAOUBELA**	1219	8031	562	514	705	58%	0	10	37	303	392
3-		**MEIDJAMBA**	608	4041	268	177	431	71%	9	0	15	15	83
4-		**LIBOUM**	463	3760	242	237	226	49%	0	0	83	63	137
5-		**MBAKAOU**	192	1342	60	53	139	72%	0	0	0	0	60
6-		**NGATT**	1440	12380	560	560	880	61%	0	0	5	286	422
7-		**TIBATI**	200	1388	120	120	80	40%	0	0	0	37	78
8-		**ALLAT MENGACK**	616	7413	466	422	194	31%	0	0	0	283	299
9-		**TONGO**	376	2643	287	274	102	27%	0	0	0	159	204
	TOTAL TIBATI		**5548**	**47133**	**2727**	**2467**	**3081**	**56%**	**9**	**10**	**140**	**1180**	**1790**





Photo N° 5 et N° 6 *: latrine traditionnelle et espace de défécation d'un ménage sans latrine*

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 05% des alentours sont propres ;
- 47% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 72% possèdent une clôture.


- **Situation des points d'eau**

Il est noté que dans les 53 villages cibles pour une population de 43 646 personnes, nous avons enregistré 74 forages pour un total de 31 fonctionnels (42%) et 43 non fonctionnels (58%) et 75 puits à ciel ouvert et soixante-quatre 64 mares d'eau.

Sur les 53 localités visitées, 17 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (31%), ce qui indique que la majorité des populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 3 : *Situation des points d'eau par aire de santé de Tibati*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de mares	Nombre de forages fonctionnels	Nombre de forages non fonctionnels	Nombre de puits	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1	TIBATI	DJOMBI	434	6135	16	6	3	4	1	3
2		NGAOUBELA	1219	8031	19	3	15	62	1	15
3		MEIDJAMBA	608	4041	34	5	6	13	3	6
4		LIBOUM	463	3760	6	4	5	20	3	9
5		MBAKAOU	192	1342	6	0	2	4	0	2
6		NGATT	1440	12380	15	4	3	24	1	0
7		TIBATI	200	1388	7	0	1	16	0	0
8		ALLAT MENGACK	616	7413	6	4	3	35	3	4
9		TONGO	376	2643	4	1	1	6	0	0
	TOTAL TIBATI		5548	47133	117	31	43	201	15	44

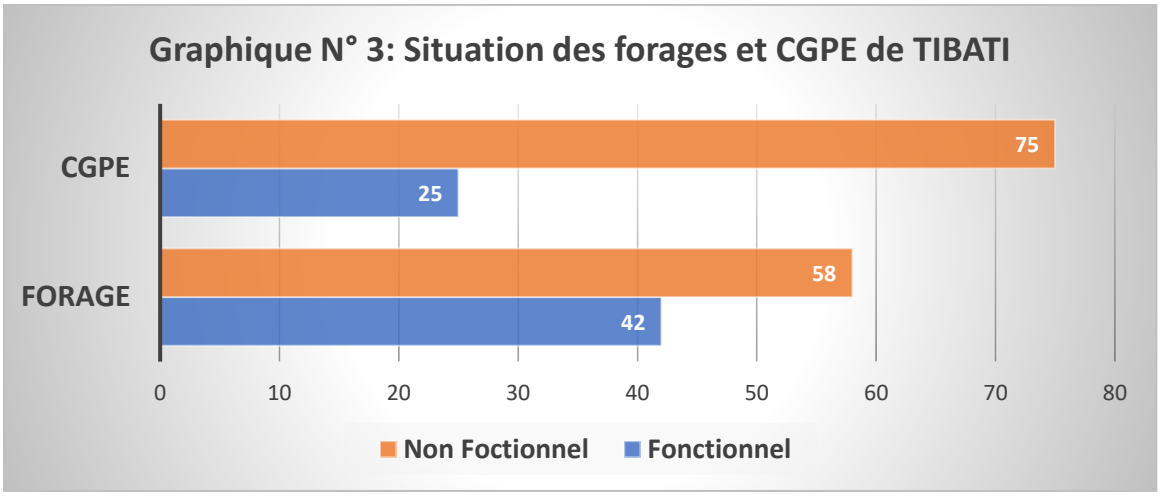

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 59 CGPE dont 15 sont actifs (25%) et 44 inactifs (75%) sans oublier que 15 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (20%).

- **Situation dans les infrastructures collectives**

En ce qui concerne les infrastructures collectives, nous avons entre autres les données suivantes :

- Nous avons enregistré 48 écoles parmi lesquelles 31 disposent des latrines et 17 n'en disposent pas ;
- 14 marchés enregistrés dont 02 ont des latrines publiques et 12 n'en n'ont pas ;
- 62 mosquées enregistrées dont 14 ont des latrines et 48 n'en n'ont pas ;
- 45 églises enregistrées dont 07 ont des latrines publiques et 38 n'en disposent pas ;
- nous avons également enregistré 56 comités de gestion de point d'eau dont seulement 14 Comités de gestion de point d'eau sont fonctionnelles.

Par ailleurs il est noté que toutes ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonne pratique d'hygiène et d'assainissement.


✓ Activités dans la Commune de NGAOUNDAL

- **Données démographiques**

Il sera noté que 06 aires de santé sur un total de 11 que compte le DS ont été couvertes par l'équipe du projet dans la commune de Ngaoundal. 41 villages ont été touchés dont :

Tableau N° 4 : *Récapitulatif du nombre de ménages et population par aire de santé de NGAOUNDAL*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre deMénages	Population Totale	Enfants de 0 à 5 ans	Hommes	Femmes
1-	NGAOUNDAL	BEKA GOTTO	344	2029	159	847	1023
2-		DENFILI	651	4948	544	1869	2535
3-		BAGODO	774	5384	884	2221	2279
4-		BETARA	680	4573	690	1656	2227
5-		NGAOUNDAL CATHOLIQUE	348	2409	509	909	991
6-		DJOUNDE	576	4020	743	1599	1678
TOTAL NGOUNDAL			**3373**	**23363**	**3529**	**9101**	**10733**

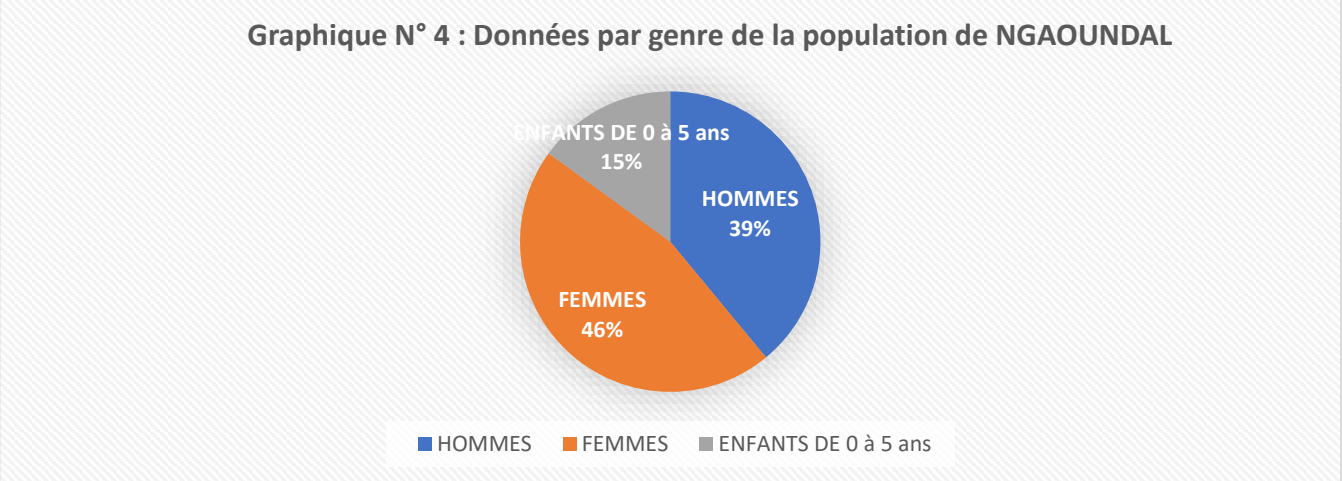

- **Situation de l'assainissement (latrine)**

Dans la commune de Ngaoundal, sur les 06 aires de santé ciblées pour41 villages enquêtés, nous avons les données suivantes : 3373 ménages enregistrés avec une population totale de 23363, 1156 ménages sans latrine soit un taux de 34%.

Tableau N° 5: *Situation des latrines par aire de santé de NGAOUNDAL*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrines avec dispositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1	NGOUNDAL	BEKA GOTTO	344	2029	238	238	106	31%	9	0	0	120	238
2		DENFILI	651	4948	554	423	228	35%	0	0	0	225	400
3		BAGODO	774	5384	523	481	293	38%	0	0	0	271	449
4		BETARA	680	4573	538	538	142	21%	0	0	0	165	508
5		NGAOUNDAL CATHOLIQUE	348	2409	202	202	146	42%	0	0	0	117	157

6		**DJOUNDE**	576	4020	335	335	241	42%	0	0	0	140	251
	TOTAL NGOUNDAL		**3373**	**23363**	**2390**	**2217**	**1156**	**34%**	**0**	**0**	**0**	**1038**	**2003**

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 43% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 83% possèdent une clôture.


Situation des points d'eau

Il est noté que dans les 41 villages visités pour une population de 23363 personnes, nous avons enregistré 139 forages pour un total de 60 fonctionnels (43%) et 79 non fonctionnels (57%), 386 puits à ciel ouvert et 205 mares d'eau.

Sur les 41 localités visitées, 08 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (20%), ce qui indique que la majorité des populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 6 : *Situation des points d'eau par aire de santé de NGAOUNDAL*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre des mares	Nombre de forage fonctionnel	Nombre de forage non fonctionnel	Nombre des puits	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-	NGAOUNDAL	BEKA GOTTO	344	2029	124	34	48	203	18	44
2-		DENFILI	651	4948	14	4	6	16	4	1
3-		BAGODO	774	5384	26	6	8	11	4	0
4-		BETARA	680	4573	13	8	6	16	2	4
5-		NGAOUNDAL CATHOLIQUE	348	2409	10	6	3	37	2	3
6-		DJOUNDE	576	4020	18	2	8	103	0	8
	TOTAL NGAOUNDAL		**3373**	**23363**	**205**	**60**	**79**	**386**	**30**	**60**

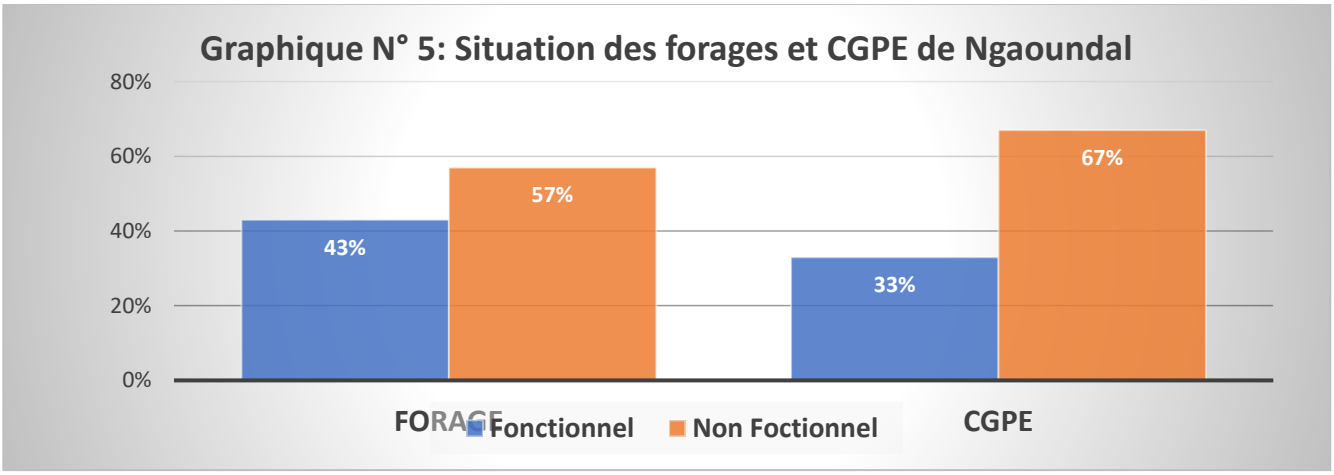

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 90 CGPE dont 30 sont actifs (33%) et 60 inactifs (67%) sans oublier que 49 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (35%).

Il est aussi noté que la population ne maitrise pas les différentes techniques de potabilisation et traitement à domicile.



Photo N° 9 *: qualité d'eau d'un puits à ciel ouvert dans la communauté Commune de Ngaoundal*

- **Situation dans les infrastructures collectives**

Selon les autres structures enquêtées, nous avons 30 écoles avec des latrines, 11 marchés ne disposent pas des latrines publiques ; 88 mares ; 08 mosquées avec des latrines et 54 ne disposent pas de latrine publique ; 15 églises avec des latrines publiques et 17 n'en disposent pas.

- **Liste des villages à déclencher dans les Communes deTibati et de NGAOUNDAL**

Il est noté que dans les villages des communes enquêtées, selon les critères de sélection ATPC, le village est sélectionné selon le nombre de ménages qui est de 50 ménages ou moins des ménages avec la population totale de 200 plus.

A cet effet, nous pouvons recommander 65 villages qui répondent aux critères de l'APTC et qui sont susceptibles d'être déclenchés dans les 14 aires de santé enquêtées dont 35 localités dans la commune de Tibati et 30 localités dans la commune de Ngaoundal.

- **LISTE DES LOCALITES A DECLENCHER DANS LE DEPARTEMENT DU DJEREM**

	COMMUENE	AIRE DE SANTE	VILLAGE	Nombre de Ménages	Population Totale	Enfants de 0 à 5 ans	Homme	femme	Nombre de latine	Ménages avec latrine	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrine avec dismositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture	Nombre d'École avec latrine	Nombre d'écoles sans	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans	Nombre des mares	Nombre de Mosquée avec	Nombre de mosquée sans	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine	Nombre deforage fonctionnelle	Nombre de forage non fonctionnelle	Nombre des puis	Nombre de CGPE Fonctionnelle	Nombre de CGPE Non Fonctionnelle
1	TIBATI	DJOMBI	DJOMBI II	105	1343	380	560	841	30	20	85	81%	0	0	0	10	30	0	0	0	1	2	0	2	0	0	1	1	1	0	1
2			MAFO	86	1250	200	600	702	35	20	66	77%	0	0	0	0	20	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0
3			DJOMBI I	82	1334	305	520	814	42	30	52	63%	0	0	0	12	30	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1
4			HOSSERE KOBA	63	500	70	210	220	25	15	48	76%	0	0	0	7	15	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
5			BANANA	35	200	27	70	130	20	15	20	57%	0	0	0	5	15	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6			MAHOR	30	237	40	95	142	10	10	20	67%	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7		NGAOUBELA	NGAOUBELA	433	2025	367	835	1190	195	195	238	55%	0	10	37	126	195	2	0	0	1	4	0	1	0	1	1	3	12	0	3
8			BANTAI	381	2286	185	996	1105	200	195	186	49%	0	0	0	115	115	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	5	0	4
9			MALABBA II	126	1008	78	435	495	42	23	103	82%	0	0	0	12	12	2	1	0	1	2	0	10	0	4	1	5	25	1	5
10			MENG	120	519	180	120	200	50	32	88	73%	0	0	0	20	20	4	0	0	0	5	1	0	0	2	0	2	15	0	2
11			TICHE I	54	432	35	195	203	15	12	42	78%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12			MAKOUP	30	855	55	315	485	10	7	23	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	1
13			ALLAMISSA	45	297	90	100	107	25	25	20	44%	0	0	0	15	35	1	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	5	0	0
14		MEIDJAMBA	NGONGONTOU	95	730	196	246	288	23	23	72	76%	0	0	5	5	5	1	0	0	1	4	1	0	0	1	1	1	0	1	1
15			DANG HAOUSSA	85	460	60	198	202	30	20	65	76%	0	0	0	0	20	0	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	2	0	0
16			MEIDJAMBA I	80	657	84	253	320	25	20	60	75%	0	0	0	0	10	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0
17			MBITOM	80	605	115	230	260	35	30	50	63%	0	0	6	3	13	0	1	0	1	4	2	0	0	1	2	1	0	0	1
18			NYDJIDA	80	215	25	90	100	22	22	58	73%	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0
19			MEIDJAMBA II	70	534	76	179	279	20	20	50	71%	0	0	0	7	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3	0	2

20			SOLLA	35	280	48	90	142	14	12	23	66%	0	0	0	0	12	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	2	0	1
21		LIBOUM	LIBOUM	135	630	165	205	260	60	60	75	56%	0	0	21	15	35	1	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	2
22			BONINTING	120	965	250	350	365	60	60	60	50%	0	0	20	0	25	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	5	1	2
23			SAXON	55	475	75	185	215	25	25	30	55%	0	0	0	15	15	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	10	0	1
24			SISSIMI	49	413	90	142	181	15	15	34	69%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
25		MBAKAOU	GANGTANG	65	455	96	163	196	20	20	45	69%	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	0
26			DJOURO KOMBO	55	385	75	143	167	25	25	30	55%	0	0	0	0	25	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
27			CARRIERE	42	294	62	110	120	0	0	42	100%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0
28			NDATAL	30	210	48	68	94	15	8	22	73%	0	0	0	0	15	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	1	0	1
29		NGATT	NGATT II	1300	6150	1150	2250	2750	500	500	800	62%	0	0	0	265	380	0	0	0	0	4	0	3	0	1	1	0	10	1	0
30			NGATT I	72	5376	107	2264	3005	20	20	52	72%	0		0	12	15	1	0	0	1	4	0	3	0	1	0	1	10	0	0
31		TIBATI	MAMNI	66	468	110	220	138	25	25	41	62%	0	0	0	10	15	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	8	0	0
32		ALLAT MENGACK	SALASSA	69	485	96	178	211	45	34	35	51%	0	0	0	30	30	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
33		TONGO	DABER	109	767	164	239	364	85	72	37	34%	0	0	0	45	47	0	1	0	1	1	1	3	1	0	1	0	7	1	0
34	NGAOUNDAL	BEKA GOTTO	MBIWORE	90	310	50	113	142	20	20	70	78%	0	0	0	0	20	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35			BANIMYANGA	43	269	39	100	130	23	23	20	47%	0	0	0	10	23	1	0	0	0	2	1	3	0	0	3	0	0	3	0
36		DENFILI	DANFILI BLOC 5	87	692	78	222	390	67	52	35	40%	0	0	0	35	50	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	4	0	0
37			DANFILI BLOC 4	81	647	92	270	285	63	50	31	38%	0	0	0	30	48	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	0	0
38		BAGODO	BAGODO IV	82	571	75	240	256	44	44	38	46%	0	0	0	30	35	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0
39			BAGODO III	68	478	65	203	210	30	30	38	56%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	2	0	0
40			BAGODO II	61	426	80	163	170	26	26	35	57%	0	0	0	16	25	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	2	0	0
41			WENDOOKA	37	253	25	110	118	25	20	17	46%	0	0	0	10	25	1	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0
42			KOFA	35	245	40	94	110	20	18	17	49%	0	0	0	12	18	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	0
43		BETARA	MALARBA BEKA	166	996	115	410	471	100	100	66	40%	0	0	0	30	100	2	0	0	1	2	0	1	0	4	3	0	0	0	0
44			MBANDOUA	70	490	96	134	260	35	35	35	50%	0	0	0	15	35	1	0	0	0	3	1	7	1	0	4	2	2	1	3
45		NGAOUNDAL	GALAGALA	72	487	120	189	178	35	35	37	51%	0	0	0	20	30	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	18	0	0

46			MBARNANG FOULBE	47	324	98	100	126	28	28	19	40%	0	0	0	11	20	1	0	0	0	4	1	0	0	0	2	1	15	1	2
47			MBARNANG GBAYA	43	296	85	100	119	20	20	23	53%	0	0	0	10	16	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
48			NOGBAYA	39	270	75	90	105	18	18	21	54%	0	0	0	11	15	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
49			DJOUNDE	379	2653	380	1130	1143	210	210	169	45%	0	0	0	90	126	1	0	0	3	10	0	5	2	0	1	6	100	0	7
50			GADA VINA	112	779	215	279	285	70	70	42	38%	0	0	0	30	70	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	3	0	1
				8921	66950	12693	26542	31261	5117	4684	4236	47%	9	10	140	2218	3793	62	19	3	23	205	22	106	23	56	60	79	386	30	60

2.4.6.4 Etat des lieux dans le département du MAYO BANYO

Pendant cette période allant du 11 Mai au 30 juin 2022, AAEDC a mené des séances d'entretien avec les autorités dans les communes de BANYO, BANKIM ET MAYO DARLE département de Mayo Banyo, Région de l'Adamaoua, pour mener des activités dans les communautés de deux communes sur les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement. Deux types d'activités ont été menées dont :

- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des communes, et la présentation du projet dans sa globalité et ses objectifs spécifiques.
- La prise de contacts avec les chefs des aires de santé, et l'état des lieux dans les différents villages que couvre chaque aire de santé.

✓ **Principaux résultats attendus au cours de la période**

Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Les chefs traditionnels sont informés par les autorités Administratives, sanitaires et municipales pour la participation massive au projet dans leurs localités ;
- La liste des villages que couvrent les communes de Banyo, Bankim et Mayo darlé et les listes détaillées du district de santé par aire de santé ont été mises à la disposition de l'équipe de mise en œuvre du projet (AAEDC).

✓ **Activités menées durant la période**

Pendant la période du mois de mai à juin 2022, les activités ci-dessous ont été menées à savoir :

- Le suivi du planning d'organisation ;
- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des communes de Banyo, Bankim et Mayo Darlé ;
- La collecte des données par aire de santé dans les villages a été effective selon le planning qui a été établi par la structure de mise en œuvre.

✓ **Activités dans la Commune de BANYO**

➢ **Données démographiques**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 07 aires de santé sur les11 que compte la commune de Banyo. Ainsi cinquante-quatre (54) localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 7 : *Récapitulatif du nombre de ménages et population par aire de santé de BANYO.*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
BANYO	ALLAT	8144	834	3452	3594	1098

	BANYO-FADA	**3718**	**433**	**1573**	**1696**	**449**
	BANYO-TICKET	**3404**	**363**	**1454**	**1528**	**422**
	MBAMTI KATARKO	**1262**	122	546	560	156
	TARAM YABAM	**1596**	**125**	**811**	**623**	**162**
	NDI WAWA	**6350**	**823**	**2686**	**2897**	**767**
	SAMBO LABO	**2371**	**293**	**984**	**1053**	**334**
TOTAL BANYO		**26845**	**2993**	**11506**	**11951**	**3388**






Photo N° 12 : Echange avec les bénéficiaires dans la localité de Labaré Baya (Banyo)


- **Situation de l'assainissement (latrines)**

Concernant la situation des latrines, Six (06) aires de santé sur les sept (07) visitées ont un pourcentage de plus de 40% des ménages qui défèquent à l'air libre.

Tableau N° 8: *Situation des latines par aire de santé de BANYO*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre des latines	Ménages avec latrine	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrine avec dispositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture

1-	BANYO	ALLAT	8144	834	435	426	408	49%	27	29	39	27	47
2-		BANYO-FADA	3718	433	239	237	196	45%	2	0	64	58	44
3-		BANYO-TICKET	3404	363	199	193	170	47%	2	0	2	1	1
4-		MBAMTI KATARKO	1262	122	64	64	58	48%	0	2	19	4	12
5-		TARAM YABAM	1596	125	62	60	65	1,5	0	0	26	0	15
6-		NDI WAWA	6350	823	488	474	349	42%	79	79	76	63	69
7-		SAMBO LABO	2371	293	171	168	125	43%	30	19	15	13	13
	TOTAL BANYO		26845	2993	1658	1622	1371	46%	140	129	241	166	201

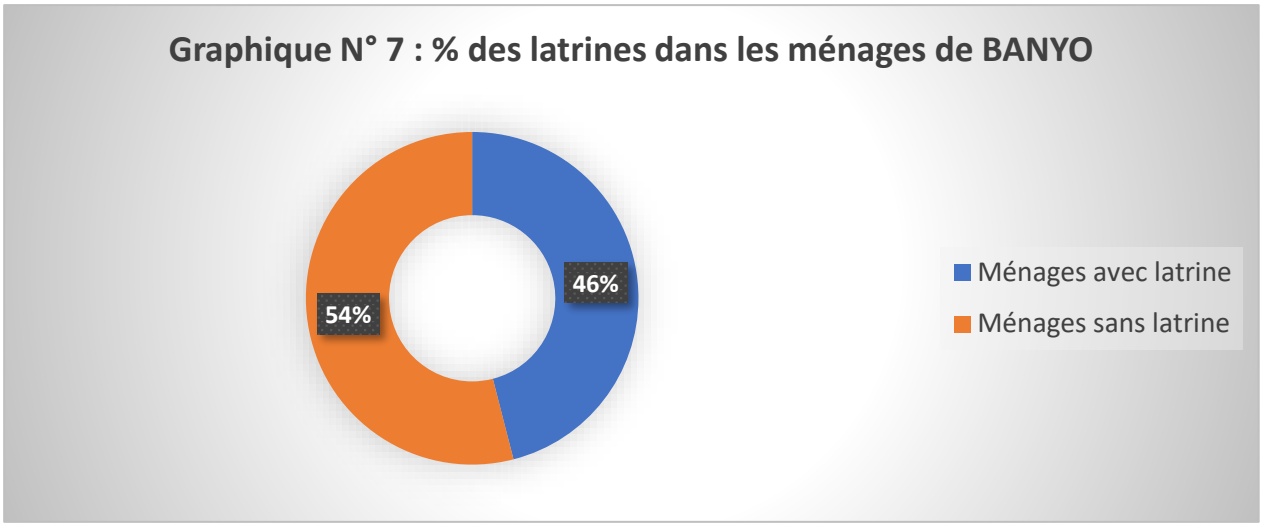

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 08% possèdent un dispositif de lave main ;
- 07% ont du savon ;
- 14% ont des alentours propres ;
- 10% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 12% possèdent une clôture.




Photo N° 13 et 14 : Visite d'une latrine dans un ménage dans la localité de Mayo Bantay (Banyo)


- **Situation des points d'eau**

Il est noté que dans les 54 villages visités, nous avons enregistré 36 forages pour un total de 21 fonctionnels (58%) et 15 non fonctionnels (42%), 75 puits à ciel ouvert et 64 mares d'eau.

Sur les 54 localités visitées, 29 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (54%), ce qui indique que la majorité des populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 9 : *Situation des points d'eau par aire de santé de BANYO*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Nombre des mares	Nombre de forage fonctionnel	Nombre de forage non fonctionnel	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
BANYO	ALLAT	8144	834	12	4	4	10	1	1
	BANYO-FADA	3718	433	12	4	0	16	0	0
	BANYO-TICKET	3404	363	7	2	2	11	0	1
	MBAMTI KATARKO	1262	122	4	2	0	8	1	0
	TARAM YABAM	1596	125	1	2	2	3	0	0
	NDI WAWA	6350	823	20	4	6	24	3	2
	SAMBO LABO	2371	293	8	3	1	3	2	1
TOTAL BANYO		26845	2993	64	21	15	75	7	5

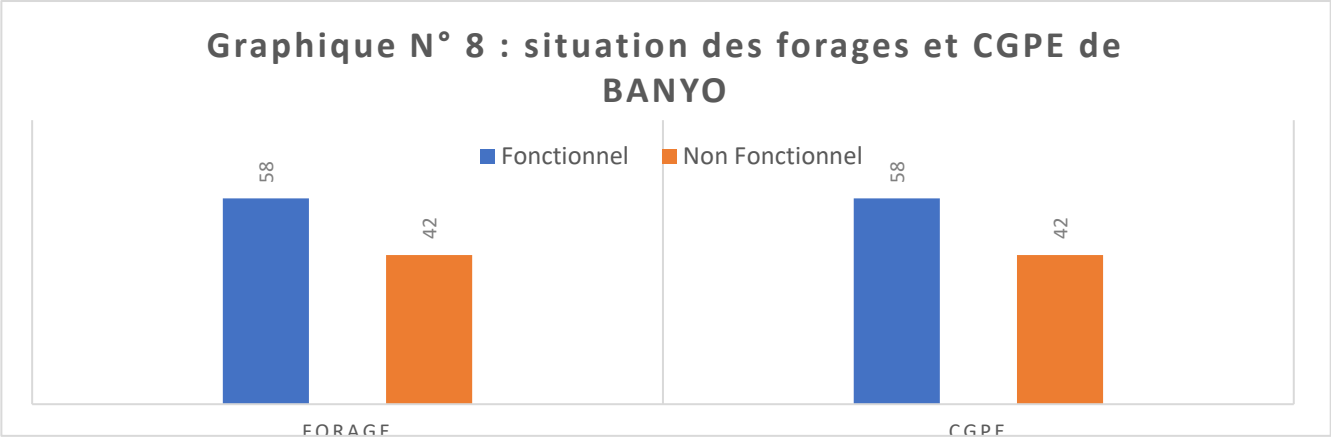

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 12 COGES dont 07 sont actifs (58%) et 05 inactifs (42%) sans oublier que 24 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un COGES (66%).

➢ Situation dans les infrastructures collectives

En ce qui concerne les infrastructures collectives, nous avons les données suivantes :

- Nous avons enregistré 35 écoles parmi lesquelles 18 disposent des latrines (52%) et 17 n'en disposent pas (48%);
- 15 marché enregistrés dont 04 ont de latrine publique (26%) et 11 n'en n'ont pas (74%);
- 117 mosquée enregistrées dont 43 ont des latrines (37%) et 74 n'en n'ont pas (63%);
- 17 églises enregistrées dont 09 ont des latrines publiques (53%) et 08 n'en disposent pas (47%);

Par ailleurs il est noté que toutes ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonne pratique d'hygiène et d'assainissement.

Tableau N° 10: *Situation des infrastructures par aire de santé de BANYO*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Nombre d'École avec latrine	Nombre d'école sans latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de sans marches latrine publique	Nombre de avec Mosquée latrine publique	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine
1-	BANYO	ALLAT	8144	834	5	6	1	5	9	19	2	4
2-		BANYO-FADA	3718	433	3	0	1	1	16	8	2	0
3-		BANYO-TICKET	3404	363	2	4	0	0	4	13	1	2
4-		MBAMTI KATARKO	1262	122	1	1	0	1	3	1	0	0
5-		TARAM YABAM	1596	125	0	2	0	0	0	5	0	0
6-		NDI WAWA	6350	823	6	3	2	2	8	22	4	0
7-		SAMBO LABO	2371	293	1	1	0	2	3	6	0	2
	TOTAL BANYO		26845	2993	18	17	4	11	43	74	9	8


✓ Activités dans la Commune de BANKIM

➢ Données démographiques

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 09 aires de santé sur les14 que compte la commune de BANKIM. Ainsi quarante-quatre (44) localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 11 : *Récapitulatif du nombre de ménages et populations par aire de santé de BANKIM*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
BANKIM	DIEKI	13616	1865	5762	6077	1777
	NGATTI	4937	654	2077	2178	682
	MAPE SONEL	7719	1060	3165	3444	1110
	BANDAM	8484	1166	3498	3782	1204
	NYAMBOYA	17912	910	7346	7941	2625
	SARKI BAKA	5109	698	2088	2270	751
	SONKOLONG	7234	995	2952	3225	1057
	ATTA	2749	374	1135	1210	404
	SOMIE/TCHAMBA	29626	3776	12671	12784	4171
TOTAL BANKIM		97386	11498	40694	42911	13781

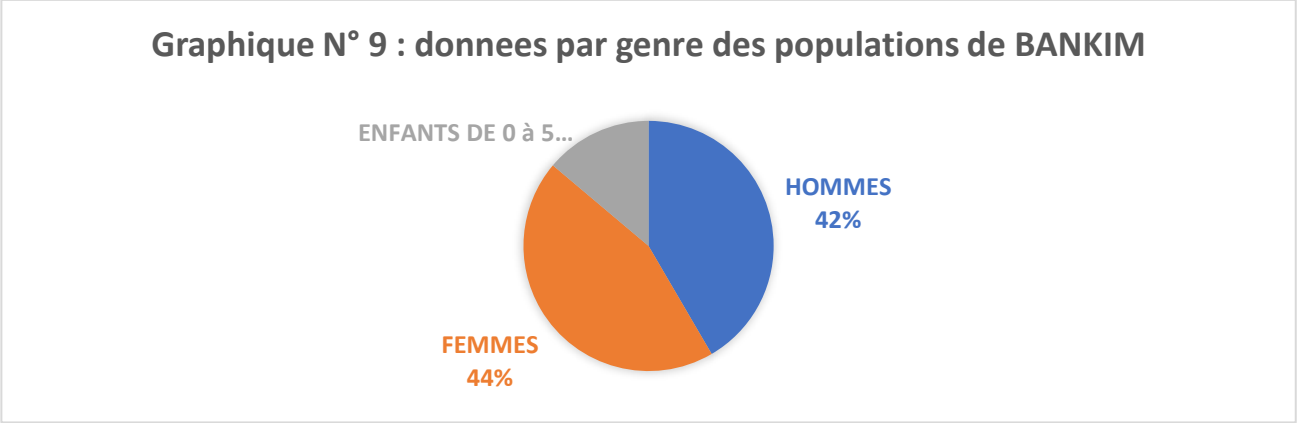


➢ Situation de l'assainissement (latrine)

Concernant la situation des latrines, 07 aires de santé sur les 09 visitées ont un pourcentage de plus de 45% des ménages qui défèquent à l'air libre. 6233 ménages sur les 11498 des localités visitées ne disposent pas de latrines soit un taux de 54%.

Tableau N° 12: *Situation des latrines par aire de santé de BANKIM*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre de latrines avec dispositif de	Nombre de latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1		DIEKI	13616	1865	993	970	895	48%	186	173	177	155	163
2		NGATTI	4937	654	342	333	321	49%	35	22	29	28	28

3	BANKIM	MAPE SONEL	7719	1060	567	550	510	48%	210	51	41	41	41
4		BANDAM	8484	1166	761	629	537	46%	205	32	35	34	33
5		NYAMBOYA	17912	910	486	464	446	49%	98	16	66	66	46
6		SARKI BAKA	5109	698	311	304	394	56%	23	11	25	25	20
7		SONKOLONG	7234	995	718	162	833	84%	6	8	8	8	7
8		ATTA	2749	374	153	143	231	62%	0	0	8	13	13
9		SOMIE/TCHAMBA	29626	3776	2035	1710	2066	55%	397	347	215	196	137
	TOTAL BANKIM		97386	11498	6366	5265	6233	54%	1160	660	604	566	488

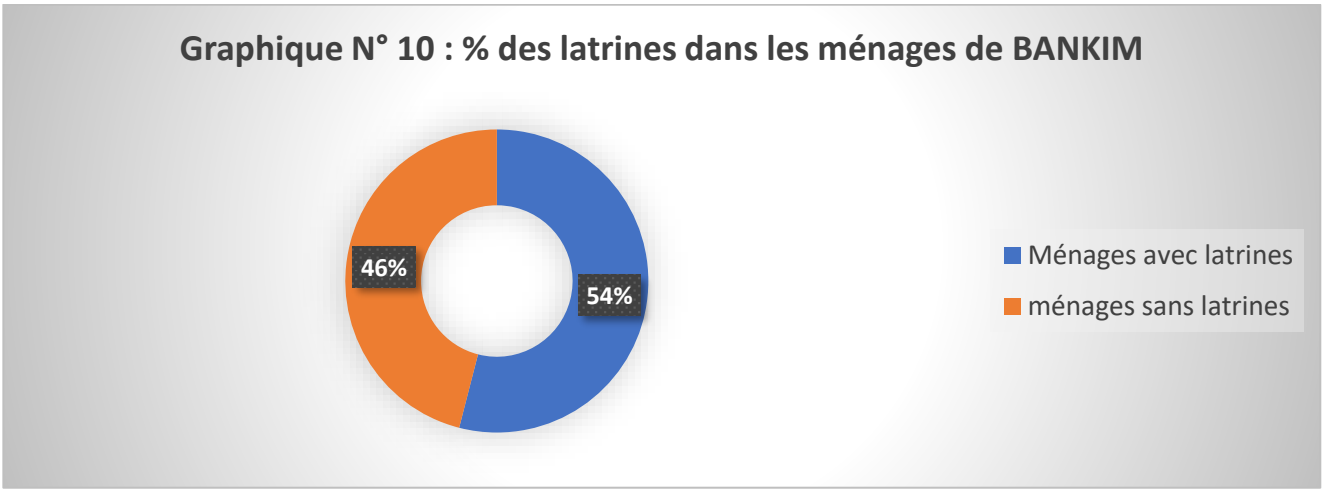

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 18% possèdent un dispositif de lave main ;
- 10% ont du savon ;
- 09% ont des alentours propres ;
- 08% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 07% possèdent une clôture.

➢ Situation des points d'eau


Il est noté que dans les 44 villages visités pour une population de 11 498 personnes, nous avons enregistré 83 forages pour un total de 38 fonctionnels (46%) et 45 non fonctionnels (54%) , 521 puits à ciel ouvert et 134 mares d'eau.

Sur les 44 localités visitées, 24 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (54%), ce qui indique que la majorité des populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 13 : *Situation des points d'eau par aire de santé de BANKIM*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de mares	Nombre de forages fonctionnels	Nombre de forages non fonctionnels	Nombre de puits	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-		DIEKI	13616	1865	36	8	11	62	3	3

2-	BANKIM	NGATTI	4937	654	18	6	5	11	6	2
3-		MAPE SONEL	7719	1060	14	3	3	15	1	6
4-		BANDAM	8484	1166	10	6	9	49	3	2
5-		NYAMBOYA	17912	910	10	9	5	103	7	3
6-		SARKI BAKA	5109	698	10	0	4	58	1	2
7-		SONKOLONG	7234	995	4	2	3	157	0	1
8-		ATTA	2749	374	11	2	2	3	1	0
9-		SOMIE/TCHAMBA	29626	3776	21	2	3	63	2	3
	TOTAL BANKIM		97386	11498	134	38	45	521	24	22

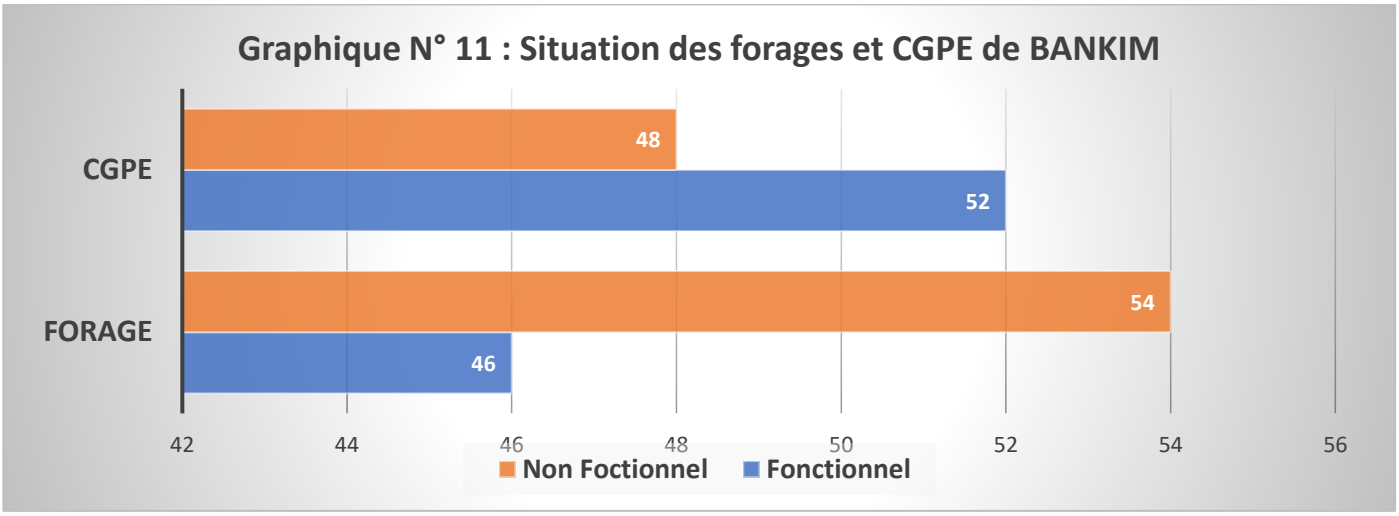

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 46 CGPE dont 24 sont actifs (52%) et 22 inactifs (48%) sans oublier que 37 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (45%).

Il est aussi noté que la population ne maitrise pas les différentes techniques de potabilisation et traitement à domicile.

- **Situation dans les infrastructures collectives**

Selon les autres structures enquêtées, nous avons 53 écoles avec des latrines, 17 marchés ne disposent pas des latrines publiques ;; 25 mosquées avec des latrines et 45 ne disposent pas de latrine publique ; 38 églises avec des latrines publiques et 50 n'en disposent pas.

Tableau N° 14: *Situation des infrastructures par aire de santé de BANKIM*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre d'Écoles avec latrines	Nombre d'écoles sans latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans latrine publique	Nombre de Mosquée avec latrine publique	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine
1-	DIEKI	13616	1865	13	6	3	4	2	22	9	8
2-	NGATTI	4937	654	7	0	1	1	3	4	2	6
3-	MAPE SONEL	7719	1060	4	0	0	1	3	1	6	1
4-	BANDAM	8484	1166	4	6	0	2	4	1	2	8
5-	NYAMBOYA	17912	910	8	2	2	1	8	8	6	4
6-	SARKI BAKA	5109	698	4	0	0	2	2	1	3	1
7-	SONKOLONG	7234	995	7	0	0	1	3	1	8	3

8-	ATTA	2749	374	2	1	0	0	0	0	1	4
9-	SOMIE/TCHAMBA	29626	3776	4	6	0	5	0	7	1	15
TOTAL BANKIM		97386	11498	53	21	6	17	25	45	38	50

✓ Activités dans la Commune de MAYO DARLE

➢ Données démographiques


L'activité dans la commune a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 05 que compte la commune de Mayo Darlé. Ainsi dix (10) localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 15 : *Récapitulatif du nombre de ménages et de population par aire de santé de MAYO DARLE*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
MAYO DARLE	BOUMDO	1309	137	567	591	151
	RIBAO	6660	887	2856	2979	825
TOTAL MAYO DARLE		7969	1024	3423	3570	976

.

Graphique N° 12 : données par genre de la population DE MAYO DARLE




➢ Situation de l'assainissement (latrines)

Concernant la situation des latrines, deux (02) aires de santé ont été visitées pour un pourcentage de 40% des ménages qui défèquent à l'air libre.

Tableau N° 16 : *Situation des latrines par aire de santé de MAYO DARLE*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre de latrines avec dispositif de lave main	Nombre de latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1-	BOUMDO	137	1309	71	69	68	50%	0	0	24	13	21
2-	RIBAO	887	6660	564	550	337	38%	127	106	105	94	94
TOTAL MAYO DARLE		1024	7969	635	619	405	40%	127	106	129	107	115

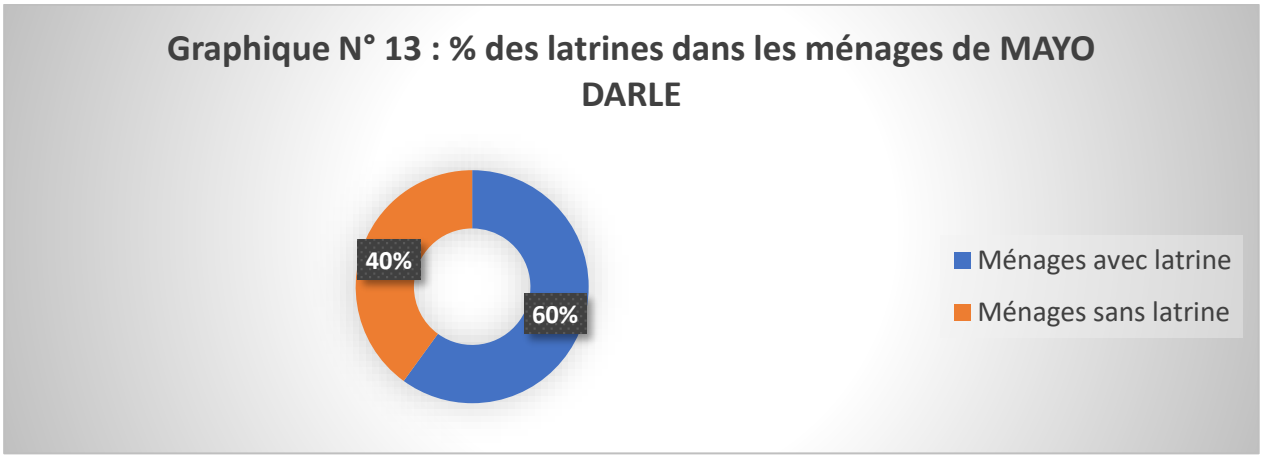

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 20% possèdent un dispositif de lave main ;
- 16% ont du savon ;
- 20% ont des alentours propres ;
- 16% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 18% possèdent une clôture.


➢ **Situation des points d'eau**

Il est noté que dans les 10 villages visités, nous avons enregistré 10 forages pour un total de 04 fonctionnels (40%) et 06 non fonctionnels (60%), 14 puits à ciel ouvert et 18 mares d'eau.

Sur les 10 localités visitées, 05 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (50%), ce qui indique que la majorité des populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 17 : *Situation des points d'eau par aire de santé de MAYO DARLE*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de mare	Nombre de forages fonctionnels	Nombre de forages non fonctionnels	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-	MAYO DARLE	BOUMDO	137	1309	6	2	1	9	0	0
2-		RIBAO	887	6660	12	2	5	5	1	2
	TOTAL MAYO DARLE		1024	7969	18	4	6	14	1	2

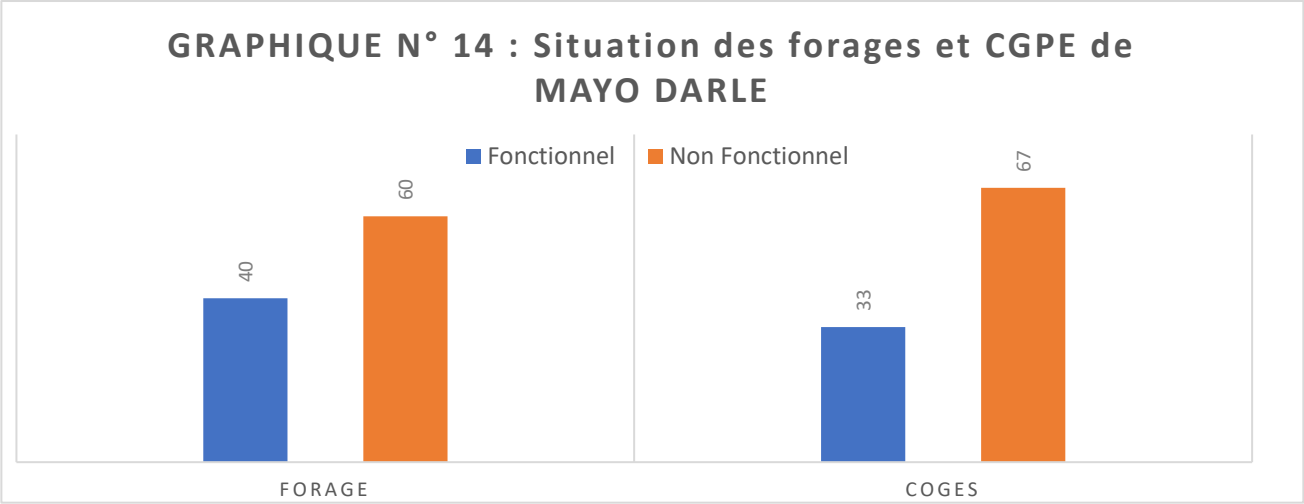

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 03 CGPE dont 01 est actif (33%) et 02 inactifs (67%) sans oublier que 07 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (70%).

➢ **Situation dans les infrastructures collectives**

En ce qui concerne les autres aspects, nous avons entre autres les données suivantes :

- Nous avons enregistré 11 écoles parmi lesquelles 06 disposent des latrines (54%) et 05 n'en disposent pas (46%);
- 05 marchés enregistrés dont 03 ont des latrines publiques (60%) et 02 n'en n'ont pas (40%);
- 18 mosquées enregistrées dont 02 ont des latrines (12%) et 16 n'en n'ont pas (88%);
- 09 églises enregistrées dont 06 ont des latrines publiques (66%) et 03 n'en disposent pas (34%);

Par ailleurs il est noté que toutes ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonne pratique d'hygiène et d'assainissement.

Tableau N° 18: *Situation des infrastructures par aire de santé de MAYO DARLE*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre d'Écoles avec latrines	Nombre d'écoles sans latrines	Nombre de marchés avec des latrines	Nombre de marchés sans latrine publique	Nombre de Mosquées avec latrines publiques	Nombre de mosquées sans latrine	Nombre d'églises avec latrines	Nombres d'églises sans latrine
1-	MAYO DARLE	BOUMDO	137	1309	1	2	1	0	0	10	0	2
2-		RIBAO	887	6660	5	3	2	2	2	6	6	1
	TOTAL MAYO DARLE		1024	7969	6	5	3	2	2	16	6	3

- **LISTE DES LOCALITES A DECLENCHER DANS LE DEPARTEMENT DU MAYO BANYO**

N°	COMMUENE	AIRE DE SANTE	VILLAGE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans	Nombre de latrine	Ménages avec latrine	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrine avec dispositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture	Nombre d'École avec latrine	Nombre d'école sans latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans latrine nublioue	Nombre des mares	Nombre de Mosquée avec latrine nublioue	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine	Nombre de Points d'eau fonctionnelle	Nombre de Points d'eau non fonctionnelle	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnelle	Nombre de CGPE Fonctionnelle
1	BANYO	ALLAT	MAYO DJANTANG	220	26	92	100	28	9	9	17	65%	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2			SANGUERE DJAORO ABBA	305	27	132	134	39	13	13	14	52%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3			BANDA LINGAM	333	34	144	146	43	10	9	25	74%	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4			NYAWA KATARKO	1088	136	459	477	152	67	64	72	53%	0	9	16	16	16	0	1	0	1	1	0	5	0	1	1	1	1	1	0
5			BON MARCHE	187	17	67	69	51	9	9	8	47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			MAYO BOTALI K	407	39	174	180	53	12	12	27	69%	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0
7			MBENGUEDJI W	1491	189	628	670	195	99	99	90	48%	10	9	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
8			NGOUM GASSIRI/F	132	15	59	56	17	7	7	8	53%	0	0	0	0	2	0	0		1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9			NGOUM KATARKO	687	46	293	304	90	22	22	24	52%	0	0	4	0	8	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
10			TOUKOUROUA	467	38	198	208	61	17	17	21	55%	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0
11		BANYO-FADA	SANGOL SO'O	537	61	229	247	61	31	30	31	51%	0	0	20	14	14	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0
12			MAYO-NGORDI	567	63	242	262	63	33	33	30	48%	0	0	20	20	12	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0
13			MAYO FOOROU DO	158	19	66	70	22	9	9	10	53%	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
14			MAYO FOOROU LAISSE	758	96	313	339	106	49	49	47	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0
15			MAYO BANYO BARIKI I	662	87	276	311	75	49	49	38	44%	0	0	14	14	10	1	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	7	0	0
16		BANYO-TICKET	TARAM KATARKO	1035	115	443	458	134	61	60	55	48%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	6	0	1
17			TARAM-SIRI	935	85	394	410	131	46	43	42	49%	2	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	3	0	0
18			MBOUNDJI	220	28	97	104	19	16	16	12	43%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0
19			NYATI-RANCH	249	26	106	114	29	17	16	10	38%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
20			ILLANGA	299	27	131	134	34	11	11	16	59%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
21			MBOUBOU	290	35	127	132	31	19	18	17	49%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22		MBAMTI KATARKO	LABARE BAYA	501	51	214	222	65	26	26	25	49%	0	0	8	0	9	1	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	3	0	0
23			MINGUEM	486	44	213	218	55	20	20	24	55%	0	0	11	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0
24		TARAM	TARAM YABAM	626	56	271	273	82	26	24	32	57%	0	0	14	0	11	0	1	0	0	1	0	3	0	0	1	1	0	0	0

25			BANTAY	470	42	414	215	41	20	20	22	52%	0	0	9	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
26			TARAM BADJAM	300	27	126	135	39	16	16	11	41%	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0
27			MBASSEWA	1092	141	453	489	150	66	64	77	55%	12	45	45	21	21	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
28			WOUMYARI II	1101	136	466	492	143	74	72	64	47%	23	23	23	23	23	1	0	0	1	3	0	8	0	0	2	1	0	1	0
29			WOUMYARI I	250	33	107	115	28	14	14	19	58%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1
30			NBENKE	813	113	340	362	111	71	69	44	39%	10	6	4	9	9	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	5	0	0
31			TAPAWA DO	144	18	62	63	19	10	9	9	50%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32			BOUDJOUNKOURA	770	100	317	344	10	63	61	39	39%	12	5	0	8	8	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	5	1	1
33			MBAMTI DJOUMBARE I	535	70	234	226	75	42	40	30	43%	11	7	8	6	6	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	0
34			MBAMTI DJOUMBARE II	746	97	305	337	104	49	49	48	49%	11	4	3	3	3	0	1	0	1	2	0	4	0	0	1	0	1	1	0
35			MBAH	836	95	336	378	122	61	60	35	37%	8	8	4	4	4	1	0	0	1	2	2	1	0	1	1	0	1	0	1
36			MAYO-BADJI FOULBE	599	55	254	275	70	29	29	26	47%	0	0	9	0	10	0	2	0	0	1	0	4	0	1	0	0	5	0	0
37			YOLI	366	39	162	164	40	20	20	19	49%	0	0	8	6	4	1	0	0	0	4	0	4	0	1	1	1	1	0	0
38			MODIAL	344	43	151	152	41	22	20	23	53%	0	0	7	7	7	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	3	0	0
39			NGOUWA MAMBILA	527	70	223	241	63	38	38	32	46%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40			NGOUWA YAMBA	472	59	198	213	61	27	24	35	59%	0	0	21	12	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1
41			HOURO YOBI	672	82	289	298	85	49	47	35	43%	5	3	4	2	2	2	0	0	1	3	1	0	1	0	1	2	0	0	1
42			MAYO GNIDONGA	400	50	170	177	53	26	26	24	48%	1	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
43			QUARTIER BAMOUN	1072	230	459	472	141	100	100	130	57%	15	32	15	15	15	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	8	0	0
44			MBAMBOUAH	714	94	294	318	102	44	44	50	53%	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	13	1	0
45			DIEKI	1003	132	413	448	142	71	70	62	47%	21	12	12	12	12	3	0	0	1	10	0	3	1	2	3	1	20	1	0
46			MOINKOING	2775	375	1138	1232	405	136	130	245	65%	23	23	21	21	21	1	1	0	1	3	0	2	0	1	1	2	6	0	1
47			MIBELONG	796	102	335	353	108	61	60	42	41%	2	3	11	10	10	1	0	0	0	4	0	1	0	1	2	1	0	1	0
48			NGLORY	182	23	78	80	24	14	12	11	48%	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0
49			NGATTI	623	82	261	276	87	48	48	34	41%	11	8	8	8	8	1	0	0	1	2	1	0	0	2	1	2	1	1	1
50			MBOUGAM	1573	207	658	711	206	99	96	111	54%	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	1	1	1	1	1	0	1
51			MBOUGAM CHEFFERIE	1498	208	636	641	221	101	98	110	53%	22	11	10	10	10	1	0	0	0	5	1	1	1	0	1	0	8	3	0
52			NYAKONG MAPE	237	30	98	106	33	14	14	16	53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0
53			MBADJI	1480	200	619	660	201	88	84	116	58%	10	9	9	9	9	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2	3	0	1
54			CITE MAPE	5040	700	2048	2246	746	377	370	330	47%	187	29	19	19	19	2	0	0	1	5	1	1	3	0	1	1	2	0	5
55			TCHIM	2232	310	922	1002	308	288	167	143	46%	162	12	12	12	11	0	1	0	0	3	1	0	1	2	1	0	27	0	1
56			KONGUI DJOM	646	84	266	288	92	46	46	38	45%	0	0	2	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	0	0

MAYO DARLE
BANKIM
NDI WAWA
SAMBO LABO
BOUMDO
RIBAO
DIEKI
NGATTI
MAPE SONEL
BANDA M

57			BANDAM	2923	406	1207	1290	426	201	198	208	51%	22	10	9	9	9	3	0	0	1	4	1	0	1	2	3	5	6	3	0
58			NYAKONG	2372	325	974	1062	336	198	190	135	42%	21	10	9	9	9	1	3	0	1	1	1	0	0	3	2	3	5	0	1
59			YIMBERE	2250	300	927	1015	308	167	161	139	46%	0	0	19	19	9	1	1	0	0	2	1	0	1	0	1	2	8	1	1
60			NDOUMDJANDI	1341	172	548	595	198	99	93	79	46%	0	0	14	14	14	1	0	0	0	2	1	2	0	3	1	1	15	1	0
61			BARRAGE LUNDI	849	118	350	373	126	41	41	77	65%	0	0	17	17	7	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	4	0	0
62			ZINA	152	20	62	68	22	9	9	11	55%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
63			NYAMBOYA	13320	300	5459	5890	1971	170	160	140	47%	98	16	16	16	16	5	0	1	1	4	4	4	5	0	7	2	75	5	2
64			MAGNAM	61	8	25	27	9	4	4	4	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0
65			KOUROUM	1260	175	512	568	180	61	60	115	66%	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	1	0	1	0	0	2	25	0	1
66			NASSARAO	828	115	339	368	121	48	48	67	58%	0	0	14	14	9	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4	0	1
67			SARKI BAKA	2960	400	1212	1307	441	198	192	208	52%	23	11	11	11	11	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	28	0	0
68			LOUMDE	1480	200	607	657	216	81	80	120	60%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0
69			FINGANG II	390	50	159	173	58	22	22	28	56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0
70			LINGAM	5364	745	2186	2395	783	615	60	685	92%	6	8	8	8	7	6	0	0	1	3	3	0	6	0	2	3	150	0	1
71			PETIT ATTA	1821	253	752	800	269	101	93	160	63%	0	0	0	9	9	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	2	3	0	0
72			FIYOURI	280	36	118	121	41	17	17	19	53%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0
73			KILA	456	60	185	205	66	24	23	37	62%	0	0	4	4	2	1	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
74			MELEM	192	25	80	84	28	11	10	15	60%	0	0	2	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0
75			NDJOUM DJUM	1168	160	478	523	167	67	67	93	58%	1	2	12	12	9	1	0	0	1	2	0	1	0	2	0	1	0	0	1
76			NDEM NDEM	429	58	176	192	61	21	20	38	66%	0	0	2	3	2	0	1	0	1	3	0	1	0	2	1	0	5	1	0
77			TCHAMBA	18750	2500	7616	8416	2718	1500	1200	1300	52%	198	198	123	111	76	0	2	0	1	3	0	1	0	4	1	0	15	1	0
78			NKWI	729	96	302	321	106	40	36	60	63%	12	12	8	7	7	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	22	0	0
79			KONGUI DOUOH	2425	315	1000	1069	356	120	110	205	65%	28	16	16	11	11	2	0	0	1	4	0	1	1	3	0	1	6	0	1
80			NEW GROUP	600	77	247	265	88	33	30	47	61%	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	7	0	0
81			MBONDJANGA	2765	350	2133	1221	411	151	150	200	57%	111	98	43	43	23	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	5	0	1
82			YOKOSSALA	1760	220	719	777	264	103	97	123	56%	34	21	11	9	9	0	1	0	0	5	0	1	0	1	0	0	3	0	0
TOTAL				123125	14491	52200	54862	17169	8024	6887	7604	52%	1300	789	845	732	689	71	38	10	28	198	68	119	47	58	59	60	596	31	27

2.4.6.5 Etat des lieux dans le département du HAUT-NYONG

Pendant la période allant du11 Mai au 30 Juin 2022, AAEDC a mené des séances d'entretien avec les autorités dans les communes d'ABONG MBANG, MINDOUROU et ANGOSSAS ; Département de Haut Nyong, Région de l'Est, pour mener des activités dans les communautés desdites communes sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Deux types d'activités ont été menés :

- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des communes et la présentation du projet dans sa globalité et ses objectifs spécifiques.
- La prise de contacts avec les chefs des aires de santé et l'état des lieux dans les différents villages que couvre chaque aire de santé.

✓ **Principaux résultats attendus au cours du cette période**

Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Les chefs traditionnels sont informés par les autorités Administratives, sanitaires et municipales pour la participation massive au projet dans leurs localités ;
- La liste des villages que couvrent les communes d'ABONG MBANG, MINDOUROU et ANGOSSAS et les listes détaillées du district de santé par aire de santé ont été mises à la disposition de l'équipe de mise en œuvre du projet (AAEDC).

✓ **Activités menées durant la période**

Pendant la période du mois de Mai à juin 2022, les activités ci-dessous ont été menées à savoir :

- Le suivi du planning de l'organisation ;
- La prise de contacts avec les autorités administratives, municipales, sanitaires et traditionnelles des communes d'Abong Mbang, Mindourou et Angossas a été effectuée ;
- La collecte des données par aire de santé dans les villages a été effective selon le planning qui a été établi par la structure de mise en œuvre.



Photo N° 19 : Entretien avec le chef de la localité d'Anzié dans la commune d'Abong Mbang


✓ **Activités dans la Commune d'ABONG MBANG**

➢ **Données démographiques**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 03 aires de santé sur les 04 que compte la commune d'Abong Mbang. Ainsi 23 localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 19 : *Récapitulatif du nombre de ménages et populations par aire de santé d'Abong Mbang*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
ABONG MBANG	ABONG MBANG SUD	3356	629	499	1412	1445
	ABONG MBANG OUEST	7203	1094	869	2528	3806
	ABONG MBANG EST	5954	414	293	3168	2493
TOTAL ABONG MBANG		16513	2137	1661	7108	7744

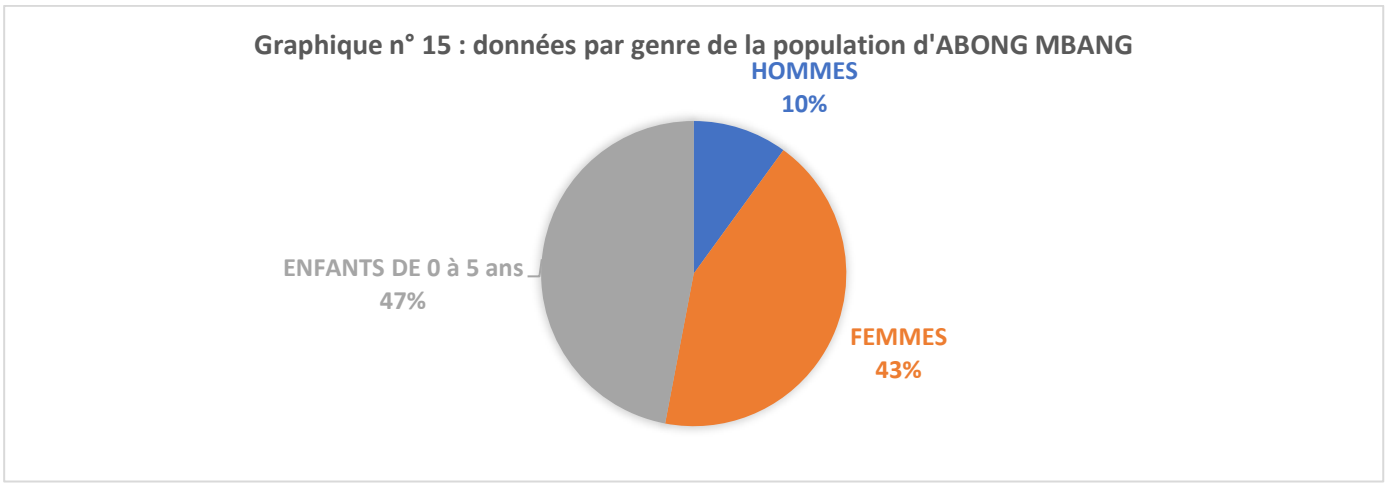


➢ Situation de l'assainissement (latrines)

Concernant la situation des latrines, 03 aires de santé visitées ont un pourcentage de plus de 45% des ménages qui défèquent à l'air libre

Tableau N° 20: *Situation des latrines par aire de santé d'ABONG MBANG*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nbre de latrines avec dispositif de lave main	Nombre de latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1-	ABONG MBANG SUD	629	3356	248	248	381	61%	5	5	55	17	2
2-	ABONG MBANG OUEST	1094	7203	714	712	382	35%	3	1	39	26	10
3-	ABONG MBANG EST	414	5954	201	201	213	51%	0	0	80	70	0
TOTAL ABONG MBANG		2137	16513	1163	1161	976	46%	8	6	174	113	12

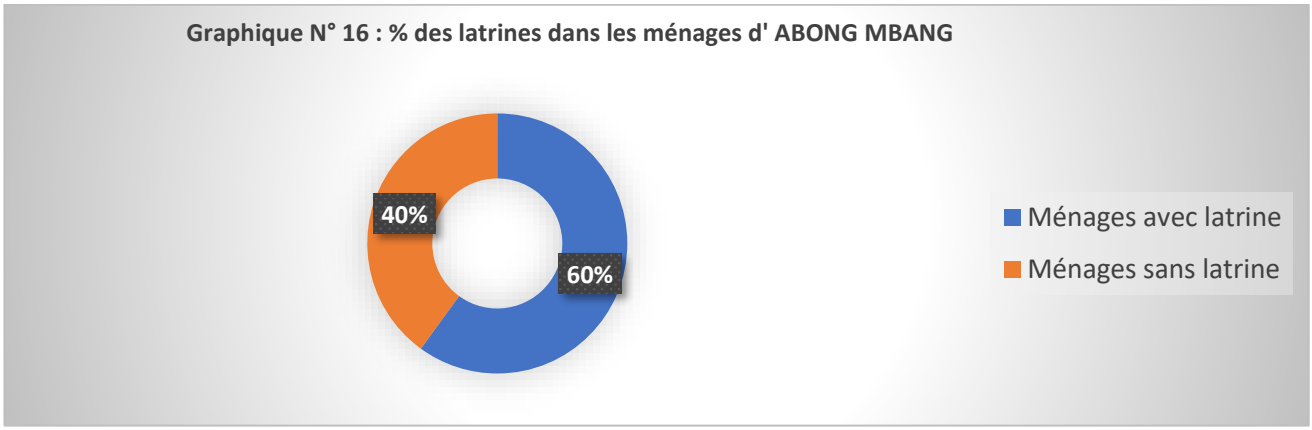

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 0,70% possèdent un dispositif de lave main ;
- 0,50% ont du savon ;
- 15% ont des alentours propres ;
- 10% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 01% possèdent une clôture.




Photo N° 20 et 21 : Latrines dans les localités d'Oboul et Mpenzock dans la commune d'Abong Mbang

- **Situation des points d'eau**

Il est noté que dans les 23 localités visitées, nous avons enregistré 35 forages pour un total de 20 fonctionnels (57%) et 15 non fonctionnels (43%), 59 puits à ciel ouvert et 37 mares d'eau.

Sur les 23 localités visitées, 03 localités n'ont jamais bénéficié d'un forage (13%), ce qui indique que ces populations consomment soit de l'eau des puits à ciel ouvert soit de l'eau des mares.

Tableau N° 21 : *Situation des points d'eau par aire de santé d'ABONG MBANG*

N°	COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Nombre de mares	Nombre de forages fonctionnels	Nombre de forages non fonctionnels	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-	ABONG MBANG	ABONG MBANG SUD	3356	629	23	7	5	19	3	4
2-		ABONG MBANG OUEST	7203	1094	0	8	6	30	5	4
3-		ABONG MBANG EST	5954	414	14	5	4	10	4	3
	TOTAL ABONG MBANG		16513	2137	37	20	15	59	12	11

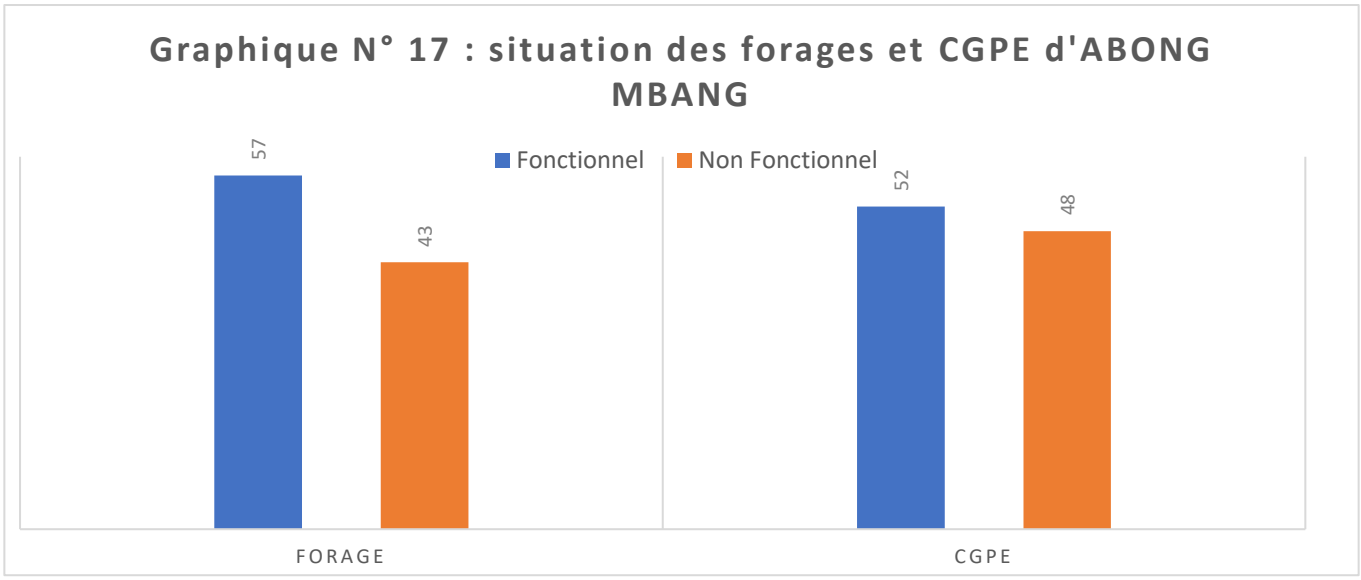






Photo N° 22 et 23 : Forage fonctionnel à Nkoual et puits à ciel ouvert à Anzié dans la commune d'Abong Mbang

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 23 CGPE dont 12 sont actifs (52%) et 11 inactifs (48%) sans oublier que 12 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (34%).

➢ Situation dans les infrastructures collectives

En ce qui concerne les infrastructures collectives, nous avons les données suivantes :

- Nous avons enregistré 29 écoles parmi lesquelles 13disposent des latrines (45%) et 16 n'en disposent pas (55%);
- 01 marché enregistré qui n'a pas de latrine (100%);
- 04 mosquées enregistrées dont 02 ont des latrines (50%) et 02 n'en n'ont pas (50%);
- 51 églises enregistrées dont 14 ont des latrines publiques (27%) et 37 n'en disposent pas (73%);

Par ailleurs il est noté que la majorité de ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

Tableau N° 22: *Situation des infrastructures par aire de santé d'ABONG MBANG*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre d'Écoles avec latrine	Nombre sans d'école latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans latrine publique	Nombre de Mosquée avec latrine publique	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine
1-	ABONG MBANG SUD	629	3356	5	2	0	0	0	0	2	21
2-	ABONG MBANG OUEST	1094	7203	3	12	0	0	1	2	5	12
3-	ABONG MBANG EST	414	5954	5	2	0	1	1	0	7	4
TOTAL ABONG MBANG		2137	16513	13	16	0	1	2	2	14	37


✓ Activités dans la Commune de MINDOUROU

➢ Données démographiques

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 04 que compte la commune de Mindourou. Ainsi 16 localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 23 : *Récapitulatif du nombre de personnes par sexe, âge et ménages par aire de santé de Mindourou*

COMMUNE	AIRE DE SANTE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
MINDOUROU	DJAPOSTEN	3101	494	317	1229	1555
	NKOUAK	12460	1100	2258	4766	5436
TOTAL MINDOUROU		15561	1594	2575	5995	6991

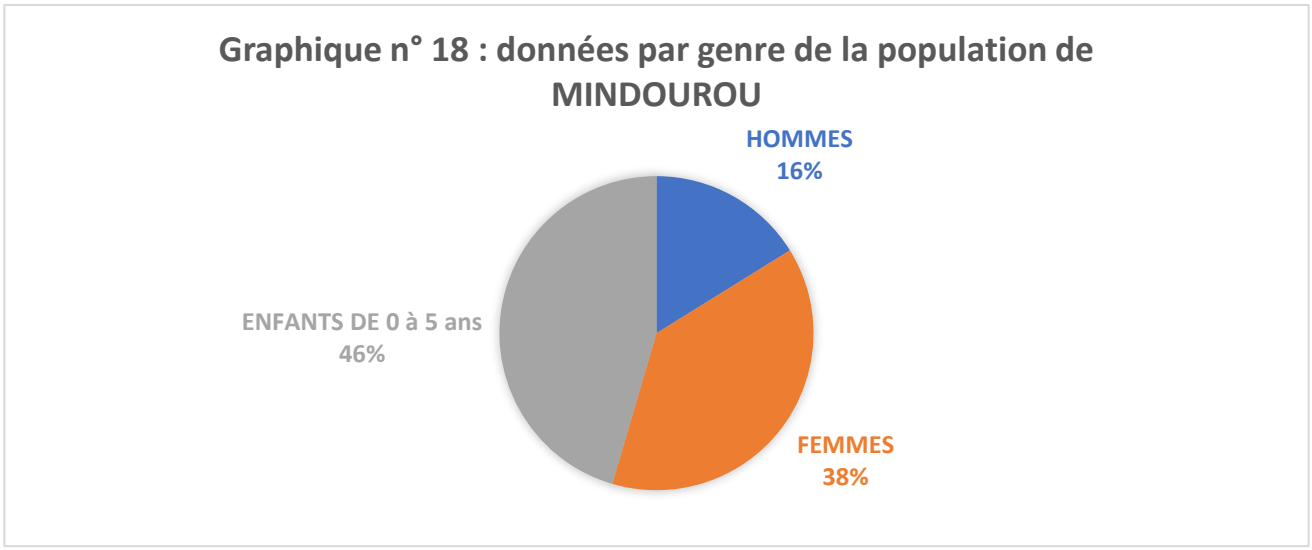


➢ **Situation de l'assainissement (latrines)**

Concernant la situation des latrines, dans les 02 aires de santé visitées nous avons eu un pourcentage de plus de 80% des ménages qui défèquent à l'air libre.

Tableau N° 24: *Récapitulatif des nombres des ménages et nombres des latines par aire de santé de MINDOUROU*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre de latrines avec dispositif de .	Nombre de latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1-	DJAPOSTEN	494	3101	92	88	406	82%	2	4	29	21	1
2-	NKOUAK	1100	12460	236	222	878	80%	4	8	98	57	1
TOTAL MINDOUROU		1594	15561	328	310	1284	81%	6	12	127	78	2

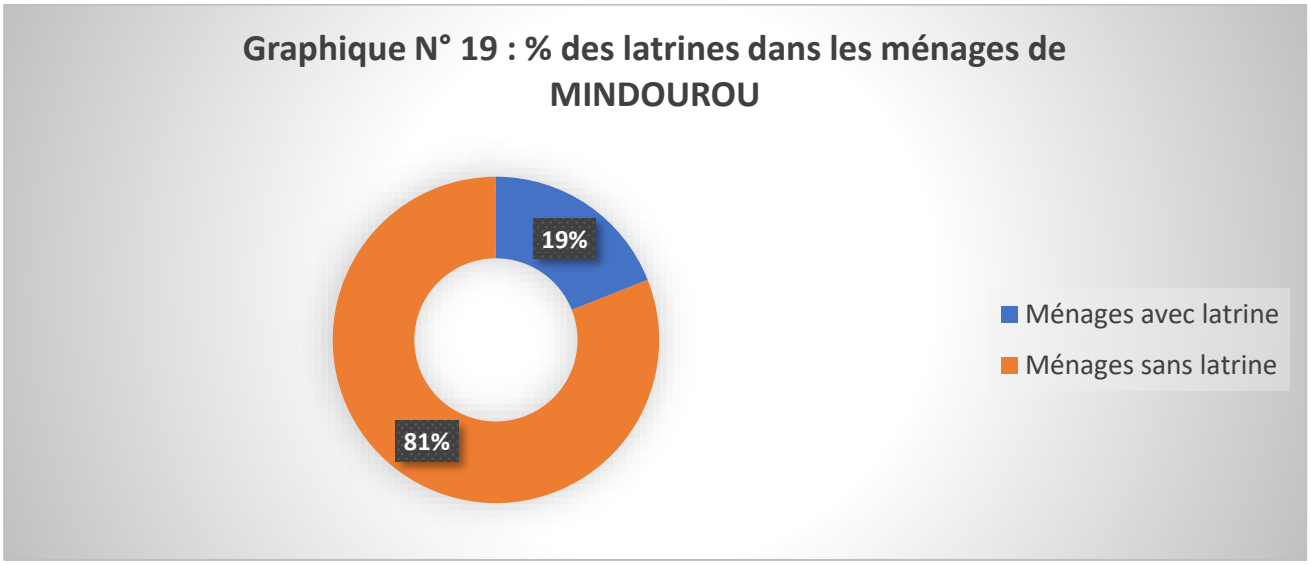

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :

- 02% possèdent un dispositif de lave main ;
- 04% ont du savon ;
- 38% ont des alentours propres ;
- 23% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 0,6% possèdent une clôture.


➢ Situation des points d'eau

Il est noté que dans les 16 localités visitées, nous avons enregistré 53 forages pour un total de 29 fonctionnels (55%) et 24 non fonctionnels (45%), 29 puits à ciel ouvert et 47 sources d'eau.

Tableau N° 25 : *Situation des points d'eau par aire de santé de MINDOUROU*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de mares	Nombre de forages fonctionnels	Nombre de forages non fonctionnels	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-	DJAPOSTEN	494	3101	13	4	12	1	5	5
2-	NKOUAK	1100	12460	34	25	12	28	9	9
TOTAL MINDOUROU		1594	15561	47	29	24	29	14	14

Sur les 16 localités visitées, 01 localité n'a jamais bénéficié d'un forage (06%).

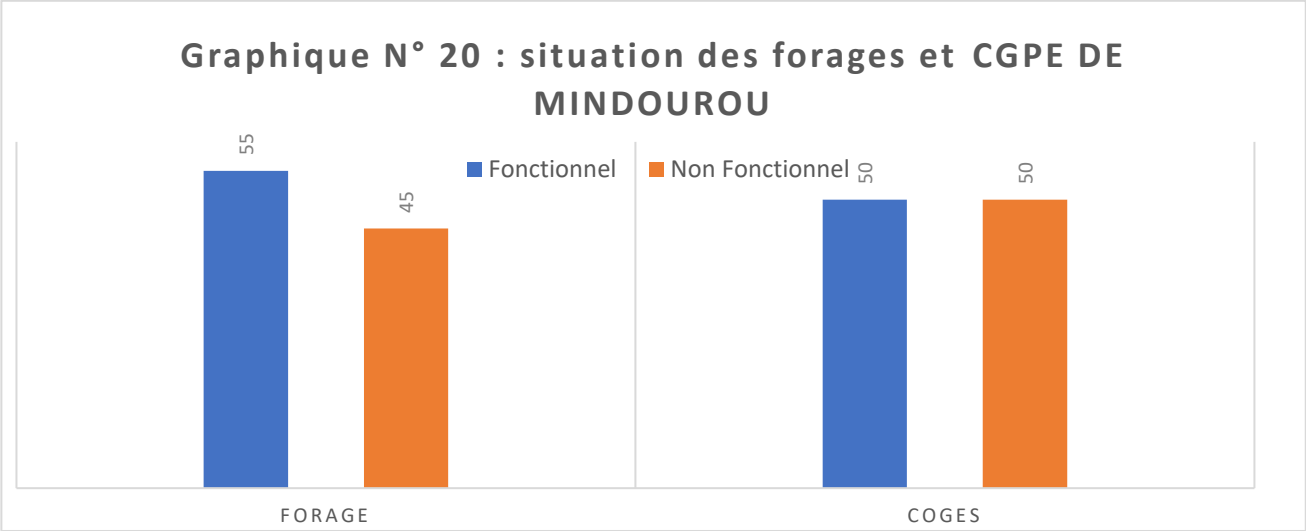

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 28 CGPE dont 14 sont actifs (50%) et 14 inactifs (50%) sans oublier que 25 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (47%).

➢ Situation dans les infrastructures collectives

En ce qui concerne les infrastructures collectives, nous avons les données suivantes :

- Nous avons enregistré 27 écoles parmi lesquelles 18 disposent des latrines (66%) et 09 n'en disposent pas (34%);
- 03 marchés enregistrés dont 03 ne disposent pas de latrines publiques (100%);
- 27 églises enregistrées dont 01 a des latrines publiques (04%) et 26 n'en disposent pas (96%);

Par ailleurs il est noté que toutes ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

Tableau N° 26: *Situation des infrastructures par aire de santé de MINDOUROU*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre Ménages	Population Total	Nombre d'École avec latrine	Nombre d'école sans latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans latrine publique	Nombre de Mosquée avec latrine publique	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine
1-	DJAPOSTEN	494	3101	3	4	0	0	0	0	1	7
2-	NKOUAK	1100	12460	15	5	0	3	0	0	0	19
TOTAL		1594	15561	18	9	0	3	0	0	1	26


✓ Activités dans la Commune d'ANGOSSAS

➢ Données démographiques

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 01 aire de santé sur les 05 que compte la commune. Ainsi 15 localités ont été visitées. Les données démographiques sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau N° 27 : *Récapitulatif du nombre de personnes par sexe, âge et ménages par aire de santé d'ANGOSSAS*

COMMUNE	Population Totale	Nombre de Ménages	Hommes	Femmes	Enfants de 0 à 5 ans
ANGOSSAS	9843	1710	2233	3049	4561
TOTAL	9843	1710	2233	3049	4561

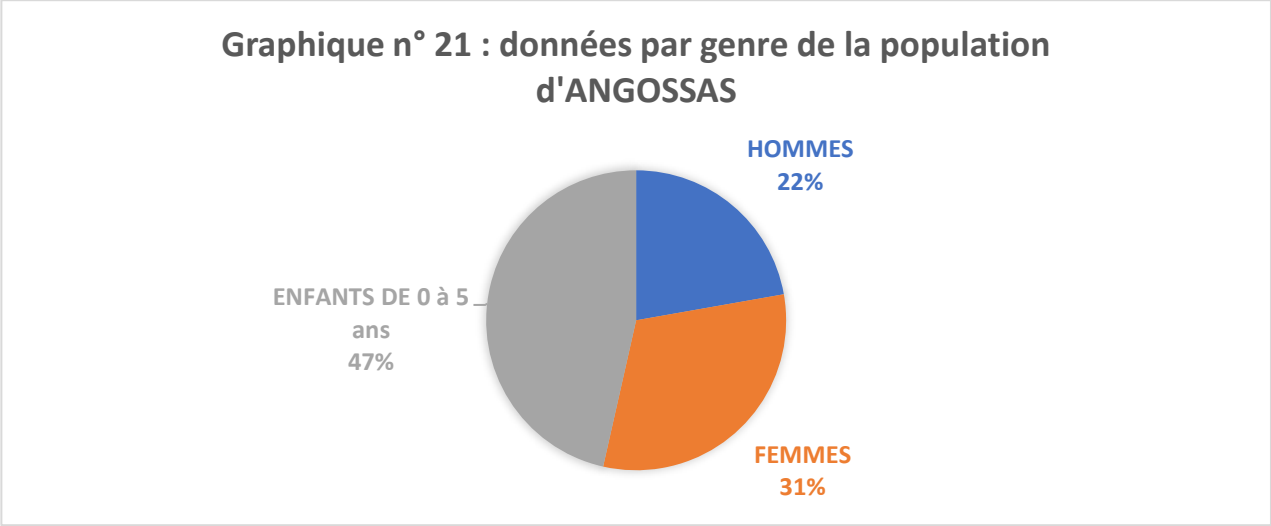


➢ Situation de l'assainissement (latrines)

Concernant la situation des latrines dans l'aire de santé visitée nous avons eu un pourcentage de 50% des ménages qui défèquent à l'air libre dans plus de 10 localités.

Tableau N° 28: *Situation des latrines par aire de santé d'ANGOSSAS*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de latrines	Ménages avec latrines	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre de latrines avec dispositif de lave main	Nombre de latrines avec du savon	Propreté de l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture
1-	ANGOSSAS	1710	9843	1446	1248	462	27%	16	16	470	246	359
TOTAL ANGOSSAS		1710	9843	1446	1248	462	27%	16	16	470	246	359

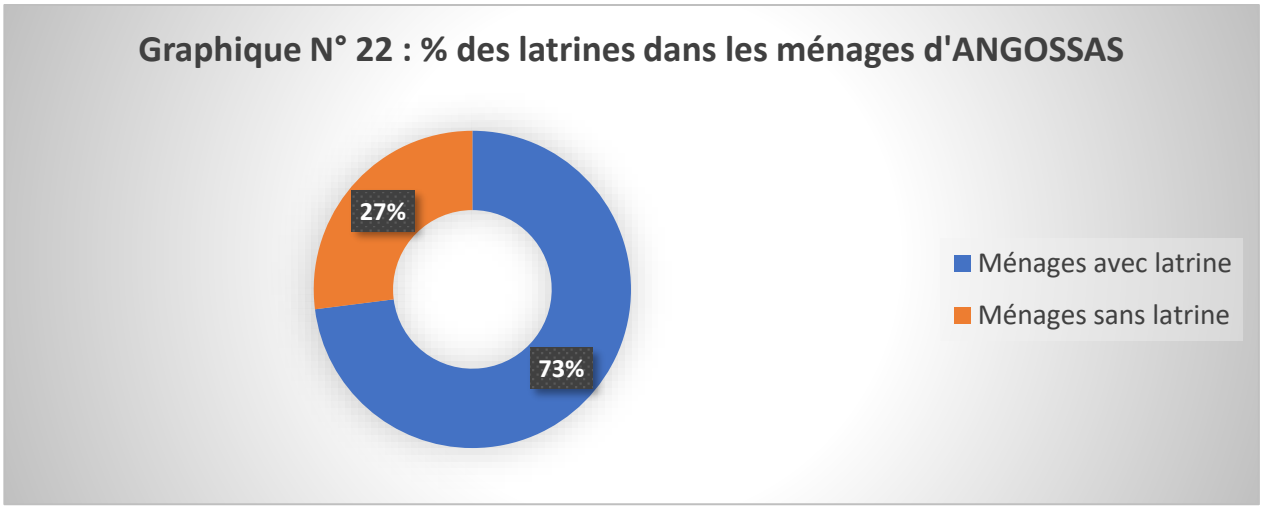

Il faudra aussi signaler que parmi les ménages disposant d'une latrine :


- 0,9% possèdent un dispositif de lave main ;
- 0,9% ont du savon ;
- 27% ont des alentours propres ;
- 14% des latrines possèdent un rideau ou une porte ;
- 20% possèdent une clôture.

➢ Situation des points d'eau

Il est noté que dans les 15 localités visitées, nous avons enregistré 50 forages pour un total de 23 fonctionnels (46%) et 27 non fonctionnels (54%), 26 puits à ciel ouvert et 85 sources d'eau.

Tableau N° 29 : *Situation des points d'eau par aire de santé d'ANGOSSAS*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre de mares	Nombre de forages fonctionnel	Nombre de forages non fonctionnel	Nombre de puits fonctionnels	Nombre de CGPE Fonctionnel	Nombre de CGPE non Fonctionnel
1-	ANGOSSAS	1710	9843	85	23	27	26	12	8
TOTAL ANGOSSAS		1710	9843	85	23	27	26	12	8

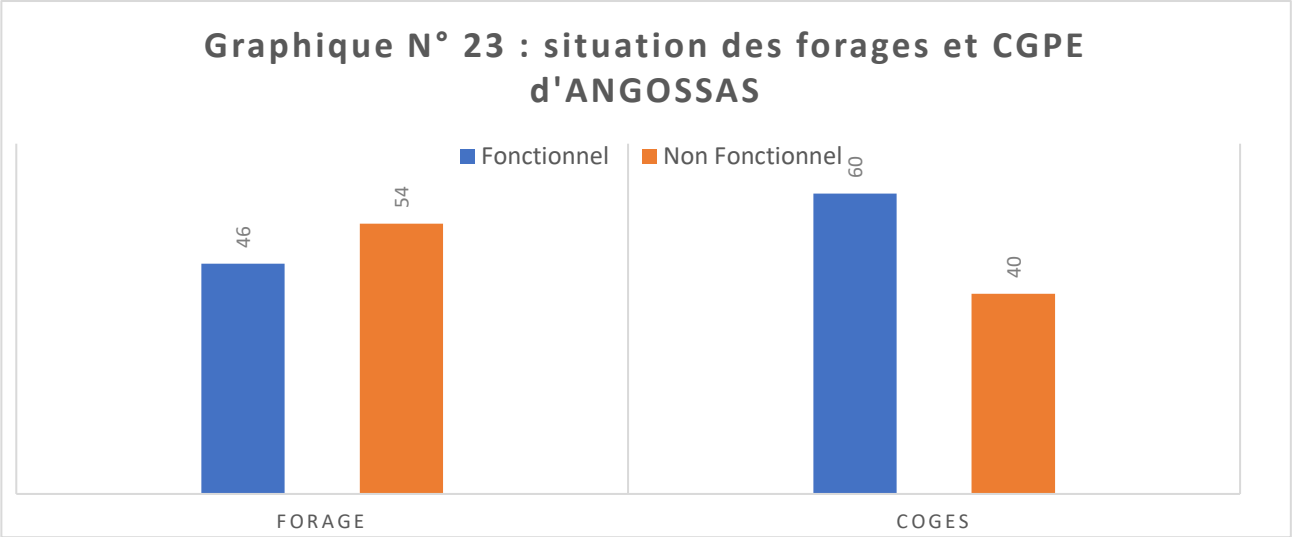

Par ailleurs, nous avons enregistré l'existence de 20 CGPE dont 12 sont actifs (60%) et 08 inactifs (40%) sans oublier que 30 points d'eau n'ont jamais eu à créer ou mettre en place un CGPE (60%).

➢ Situation dans les infrastructures collectives

En ce qui concerne les infrastructures collectives, nous avons les données suivantes :

- Nous avons enregistré 25 écoles parmi lesquelles 15 disposent des latrines (60%) et 10 n'en disposent pas (40%);
- 04 marchés enregistrés dont 02 ne disposent pas de latrines publiques (50%);
- 39 églises enregistrées dont 04 disposent des latrines publiques (10%) et 35 n'en disposent pas (90%);

Par ailleurs il est noté que toutes ces structures qui disposent des latrines ne respectent pas les règles de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

Tableau N° 30: *Situation des infrastructures par aire de santé d'ANGOSSAS*

N°	AIRE DE SANTE	Nombre de Ménages	Population Totale	Nombre d'Écoles avec latrines	Nombre d'écoles sans latrine	Nombre de marchés avec des latrines	Nombre de marchés sans latrine publique	Nombre de Mosquées avec latrines publiques	Nombre de mosquées sans latrine	Nombre d'églises avec latrines	Nombres d'églises sans latrine
1-	ANGOSSAS	1710	9843	15	10	2	2	0	0	4	35
TOTAL ANGOSSAS		1710	9843	15	10	2	2	0	0	4	35

- **LISTE DES LOCALITES A DECLENCHER DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT NYONG**

N°	COMMUENE	AIRE DE SANTE	VILLAGE	Nombre Ménages	Population Total	Enfants de 0 à 5 ans	Homme	femme	Nombre de latrine	Ménages avec latrine	Ménages sans latrine	% Ménages sans latrine	Nombre des latrine avec dispositif lave main	Nombre des latrines avec du savon	Propreté l'alentour	Porte rideau	Présence de clôture	Nombre d'École avec latrine	Nombre d'école sans latrine	Nombre des marches avec des latrines	Nombre de marches sans latrine publique	Nombre de mares	Nombre de Mosquée avec latrine publique	Nombre de mosquée sans latrine	Nombre d'église avec latrine	Nombres d'église sans latrine	Nombre de forage fonctionnelle	Nombre deforage non fonctionnelle	Nombre des puis	Nombre de CGPE Fonctionnelle	Nombre de CGPE Non Fonctionnelle
1	ABONG MBANG	ABONG MBANG SUD	NTANKUIMB	84	296	41	117	138	27	27	57	79%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	1	1
2			DJENASSOUME	106	806	120	317	459	72	72	34	67%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	3	1	0	6	1	1
3			ZOGUEMBOU	52	378	37	159	182	21	21	31	60%	0	0	8	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4			ANKOUAMB	51	216	43	78	95	38	38	13	25%	0	0	13	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	4	1	1
5			NKOUOLE	62	375	58	121	196	36	36	26	42%	0	0	3	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	2	0	1	4	0	0
6			OBOUL I	191	573	113	371	89	23	23	168	88%	5	5	7	9	0	1	0	0	0	5	0	0	0	6	1	3	2	2	2
7			NTIMBE I	83	622	87	249	286	31	31	52	63%	0	0	24	2	0	1	0	0	0	3	0	0	1	2	1	1	3	1	1
8		ABONG MBANG OUEST	ADOUMA	273	1382	167	405	810	29	29	244	89%	0	0	22	13	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	1	1
9			BAGOFIT	92	714	64	268	382	89	87	5	5%	1	1	12	13	4	2	1	0	0	0	1	0	2	0	5	0	4	2	2
10			BAMAKO	98	620	99	239	282	82	82	16	16%	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	7	1	1
11			MAZABE	98	710	74	363	273	81	81	17	17%	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	6	3	3
12			BIDANANG	103	687	90	199	398	97	97	6	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ANKOUNG	69	605	115	205	285	69	69	0	0%	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
14			NKOUAL	99	768	36	244	488	87	87	12	12%	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	1
15			DJONDJOCK	97	636	95	212	329	83	83	14	14%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
16			NDJIBE	72	520	45	206	269	8	8	64	89%	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	6	1	1
17		ABONG MBANG EST	SOKAMALAM	110	3000	93	1958	949	67	67	43	39%	0	0	0	11	0	2	0	0	0	2	0	0	3	1	0	0	2	1	1
18			MPEMZOCK I	101	1500	90	600	810	25	25	76	75%	0	0	40	50	0	1	1	0	0	2	0	0	3	0	2	0	3	1	1
19			MPEMZOCK II	46	412	26	199	187	20	20	26	57%	0	0	5	0	0	1	1	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0	1	1

20			NTIMBE II	122	860	45	358	463	73	73	49	40%	0	0	35	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	5	1	1
21	MINDOUROU	DJAPOSTEN	MEDJOH	297	1686	126	733	827	48	47	250	84%	0	2	19	4	0	1	3	0	0	5	0	0	0	4	2	5	0	1	1
22			TONKLA	59	258	39	88	131	16	16	43	73%	0	0	7	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	1	3	1	1	1
23			NKOUL	39	319	49	117	153	9	9	30	77%	2	2	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
24			DIOULA	76	635	71	212	352	19	16	60	79%	0	0	3	7	1	2	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	3	3
25			EDEN	23	203	32	79	92	0	0	23	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		NKOUAK	NKOUAK	302	5111	1075	2009	2027	22	22	280	93%	0	1	8	7	0	0	3	0	0	5	0	0	0	2	8	0	2	0	0
27			NONGBWALA	58	426	118	181	187	13	12	46	79%	0	0	4	3	0	2	0	0	1	4	0	0	0	3	2	0	4	2	2
28			DJOUYAYA	154	1378	171	566	641	42	40	114	74%	0	0	16	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	2	1	1	1
29			ETSIEK	78	362	57	116	189	16	15	63	81%	0	0	10	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	3	0	0
30			KAGNOL	38	108	53	42	33	9	7	31	82%	0	0	4	6	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	3	0	0
31			DJOLEMPOUM	71	518	102	164	252	28	26	45	63%	0	0	11	4	0	2	0	0	0	5	0	0	0	2	1	1	3	0	0
32			MALENE	79	814	74	318	422	26	24	55	70%	0	0	13	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0
33			BEDOUMO	92	1487	105	693	794	28	26	66	72%	0	0	13	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	1	1
34			MAYENE	86	446	109	152	185	16	15	71	83%	2	4	6	6	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	1	4	1	1
35			AMPEL	114	1412	348	446	618	31	30	84	74%	2	3	13	9	0	1	1	0	0	5	0	0	0	4	1	3	3	1	1
36			NEMEYONG	28	213	46	79	88	5	5	23	82%	0	0	0	6	0	1	1	0	0	7	0	0	0	0	3	0	1	3	3
37	ANGOSSAS	ANGOSSAS	DJOKOUNDE	76	610	195	230	185	40	40	36	47%	0	0	20	0	2	1	1	0	0	5	0	0	0	3	1	1	6	1	1
38			KEK	46	656	128	328	200	203	20	26	57%	0	0	5	3	3	1	1	0	0	4	0	0	0	3	1	1	1	0	0
39			BAKBEZE II	189	475	138	145	192	102	100	89	47%	0	0	23	19	21	1	1	0	0	8	0	0	1	2	0	4	3	0	1
40			BAGOLOUL	118	809	156	289	364	57	56	62	53%	0	0	29	11	11	1	1	0	0	12	0	0	0	2	1	0	3	1	0
41			BONIS	110	550	150	220	180	65	65	45	41%	0	0	41	17	50	0	1	0	0	3	0	0	0	2	1	0	1	1	0
TOTAL GENERAL				5441	41636	6469	16152	19296	2937	2719	2722	50%	30	34	771	437	373	46	35	2	6	169	2	2	19	98	72	66	114	46	42

2.5 Le déclenchement des communautés

2.5.1 Introduction

La mission de l'AAEDC se décline en plusieurs étapes dont le déclenchement. Le déclenchement représente le moment le plus important du processus. Il se déroule en plusieurs étapes adaptables selon le contexte.

C'est dans ce contexte que s'inscrira la mission de l'ONG pour la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté dans 200 villages/communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est.

2.5.2 L'objectif principal

L'objectif visé par la présente activité consiste à analyser de manière participative le profil sanitaire de la communauté. Il sera fondé sur la stimulation d'un sentiment collectif de dégoût et de honte chez les membres de la communauté en les confrontant à la réalité crue de la Défécation à l'Air Libre (DAL) et ses conséquences sur la santé de la communauté. On partira ainsi de l'hypothèse selon laquelle, aucun être humain ne peut rester indifférent au fait qu'il ingère les excrétas des autres.

Ce présent rapport fera l'objet du déclenchement des 200 villages/communautés ciblés dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est bénéficiaires de la stratégie d'ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC).

2.5.3 Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, il s'agit de :

- Déclencher l'ATPC dans 200 Communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est;
- Mettre en place les membres des comités locaux de suivi.

Il est attendu de l'ONG de :

- Organiser les séances de déclenchement dans les différentes communautés ;
- Mettre en place des CLS dans chaque communauté déclenchée.

2.5.4 Résultats attendus de l'activité

Les résultats attendus sont les suivants :

- 200 villages/communautés déclenchés à l'ATPC selon les règles de l'art ;
- 200 comités locaux de suivi mis sur pied.

2.5.5 La méthodologie de travail

Le déclenchement de l'ATPC suit un phasage et des tâches globalement bien arrêtées. La méthodologie de l'activité dite « déclenchement » va être axée sur :

- Le Recyclage du personnel du terrain sur l'approche ATPC ;
- La rencontre avec les différentes autorités pour la validation des listes des communautés à déclencher ;
- Le déclenchement proprement dit ;
- La mise en place des comités locaux de suivi (CLS).

✓ **Recyclage du personnel du terrain sur l'approche ATPC et IEC/C4D**

Des ateliers de recyclage du personnel sur l'approche de l'ATPC ont été organisés. Ces ateliers se sont basés sur le guide de mise en œuvre de l'ATPC au Cameroun. Un rappel des outils de l'IEC/C4D a été également présenté. L'accent a été mis au cours de ces ateliers de formation sur les outils de suivi et modules de formation des communautés. Ces ateliers participatifs avec le concours des délégations régionales du MINEE, ont été facilités par les points focaux régionaux.

✓ **La rencontre avec les différentes autorités**

Des listes ont été validées lors de la phase de l'état des lieux par la commission. Il s'agira lors de ces différentes rencontres de diviser certaines localités à forte populations en communautés et de valider à la fin la liste des communautés à déclencher par les communes.

✓ **Déclenchement de l'ATPC**

Des réunions de causeries éducatives sont organisées dans les différentes communautés en utilisant des techniques de sensibilisation et de communication basées sur le dégout et la honte, les communautés sont amenées à prendre la décision de mettre fin à la défécation à l'air libre en construisant elles-mêmes des latrines. Cette décision de la communauté de mettre fin à la défécation à l'air libre est absolument essentielle pour garantir l'utilisation des latrines et leur maintenance par les populations. Une fois que les communautés arrivent à cette prise de conscience, il devient plus facile d'adopter, de façon collective ou individuelle, de nouveaux comportements comme le lavage des mains à l'eau et au savon. Dans cette optique, la promotion du lavage des mains est associée à l'ATPC.

Cette activité consiste à dérouler plusieurs étapes afin de stimuler la prise de conscience pour le changement de comportement des communautés. Les étapes proprement dites sont :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance : cette étape du processus est premièrement d'expliquer la raison de la visite afin d'établir le contact avec la communauté lorsque nous arrivons dans la localité ;
- Facilitation de l'analyse sanitaire : cette étape permet de faciliter une analyse compréhensive par la communauté de la situation sanitaire dans leur propre localité ; une fois que la confiance a été établie ou du moins si l'on a l'attention d'au moins une bonne partie de la communauté ;
- Cartographie des aires de défécation. Cela consiste, avec l'ensemble de la communauté, à réaliser une carte du village avec des cailloux, des bâtons, du sable et à identifier les habitations, les rues principales, les écoles, les points d'eau et surtout les points de

défécation à l'air libre. Les villageois sont souvent gênés au moment d'identifier géographiquement ces lieux, car ce sont des « choses qu'on fait mais qu'on ne dit pas » ;

- Marche transversale dans les zones de défécation : Une promenade dans le village implique de marcher avec les bénéficiaires d'une extrémité à l'autre de la localité, d'observer, de poser des questions et d'écouter. cette marche permet de localiser les endroits de défécation à l'air libre et de visiter les différents types de latrine sur le chemin. Il est important de s'arrêter dans les endroits où il y a eu défécation à l'air libre et de passer beaucoup de temps là à poser des questions et faire des calculs (décrits plus bas) tout en respirant l'odeur désagréable et en regardant les endroits où il y a beaucoup de défécation à l'air libre. Si les gens vous incitent à continuer la marche et quitter ces endroits, insistez pour rester là malgré leur embarras. Sentir cette odeur d'une nouvelle façon et avoir cette vision dégoutante à travers le regard d'un visiteur peut être un facteur clé pour déclencher la mobilisation communautaire ;
- Le Calcul des matières fécales consiste à faire calculer la quantité de caca produite par la communauté par jour, par semaine, et par an. Calculer la quantité d'excréments produits peut aider à illustrer l'ampleur du problème d'hygiène. Combien d'excréments humains sont produits par chaque personne dans un ménage, par jour ? Les ménages peuvent utiliser leurs propres méthodes de mesure pour calculer combien ils ajoutent au problème. La somme des ménages peut ensuite être calculée pour trouver un chiffre pour la communauté en entier. Une valeur quotidienne peut être mesurée pour déterminer combien de caca est produit dans une semaine, un mois ou même une année. Ces quantités peuvent s'additionner jusqu'à ce qu'on atteigne même des tonnes, ce qui va surprendre la communauté.
- Le calcul des dépenses médicales, consiste à demander aux gens combien ils dépensent en traitement de santé suite aux maladies liées au péril fécal (diarrhée, fièvre typhoïde, dysenterie...) ;
- L'exercice du verre d'eau ;
- Voies de contamination fécale ;
- Engagement communautaire.

Ainsi à la fin, soit le déclenchement prend tout de suite et on assiste à un mouvement généralisé qui suit son cours les mois suivants, soit cela ne prend pas et rien n'est fait.

- ✓ **La mise en place des comités locaux de suivi**

Lors des séances de déclenchement qui font office d'assemblée générale, il est demande à chaque communauté de choisir des comités locaux de suivi qui est maillon important dans le suivi des plans d'action communautaire.

2.5.6 Activités menées pour la période

2.5.6.1 Le recyclage du personnel du terrain sur l'approche ATPC et l'IEC/C4D

Le recyclage des intervenants sur le terrain est primordial quant à la maitrise des différentes étapes du processus des déclenchements et aussi important sur toute l'approche de l'ATPC.

Ainsi 02 ateliers se sont tenus dont l'un à Tibati et l'autre à Bertoua. Ont été conviés à ces ateliers les animateurs, superviseurs et les points focaux des communes.

La méthodologie était la suivante : Le 1^{ier} jour est réservé aux cours théoriques sur les méthodes ATPC et l'IEC/C4D et le 2^{ieme} jour est réservé à la démonstration pratique sur le terrain.



Photo 27 et 27 *: Renforcement des capacités des animateurs de l'Adamaoua sur l'approche ATPC*

2.5.6.2 La rencontre avec les différentes autorités

Lors de la réunion de validation du rapport d'état des lieux par la commission de recette, il a été recommandé à l'ONG par le Projet, de tenir des rencontres avec les autorités locales (Maire, délégation départementale de l'eau de l'énergie, le district de santé, etc. …) afin d'arrêter la liste des communautés à déclencher.

Des assises ont été tenues dans les différentes communes. Ces différentes assises avaient aussi pour but de diviser les localités à forte populations en plusieurs communautés comme indiqué dans l'ordre de service adressé à l'ONG par le projet pour la circonstance. Ces différentes rencontres ont été entérinées par des procès-verbaux.



Photo 28: *Validation de la liste des localités à déclencher de Tibati*

2.5.7 Le déclenchement de l'ATPC

Suite à la réunion de validation des villages, une liste des villages a été arrêtée. Cette liste a permis à l'ONG de planifier un programme de déclenchement des villages par aire de santé.

Le but du déclenchement est purement d'aider les membres de la communauté à voir par eux-mêmes que la défécation à l'air libre a des conséquences dégoutantes et créé un environnement où il ne fait pas bon vivre. À partir de ce point, il revient aux membres de la communauté de décider de comment gérer ce problème et passer à l'action. C'est dans cette optique que l'AAEDC a tenu d'abord à renforcer les capacités du personnel de terrain sur l'approche de l'ATPC et du PHAST.

C'est ainsi que deux (02) ateliers ont été tenu ; l'un à TIBATI facilité par la délégation régionale de l'eau et de l'énergie de l'Adamaoua et l'autre à Bertoua facilité par la délégation régionale de l'eau et de l'énergie de l'Est.

La méthodologie a été basée sur la méthode théorique (déroulement des étapes de l'ATPC) et la pratique avec les descentes sur le terrain pour un déclenchement en équipe.

C'est alors qu'avec les démonstrations pratiques, les campagnes de déclenchement furent lancées dans les deux (02) régions.

2.5.7.1 Les déclenchements dans le département du DJEREM

Compte tenu du contexte de la zone du projet (distance entre les localités et insécurité), l'ONG a d'abord opté pour un travail d'équipe concernant le déclenchement. Chaque équipe était composée de 02 facilitateurs accompagnés soit du superviseur, de l'agent communal d'hygiène et parfois des chefs de aires de santé.

- ✓ **Principaux résultats attendus au cours de cette période**

Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Toutes les localités de la liste sont déclenchées à l'ATPC;
- Un comité local de suivi est créé dans chaque communauté.

✓ **Activités menées durant la période**

Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:

- La prise de rendez-vous avec les autorités traditionnelles des localités/communautés pour les dates et les heures de déclenchement ;
- Le déclenchement de l'ATPC dans les localités/communautés.

Les activités de déclenchement se sont tenues simultanément dans chaque commune. Les équipes couvraient une moyenne de 6 villages déclenchés par jour.


L'implication des populations dans toutes les étapes du déclenchement telles que :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance ;
- Cartographie des aires de défécation ;
- Marche transversale dans les zones de défécation ;
- Le Calcul des matières fécales ;
- L'exercice du verre d'eau ;
- Voies de contamination fécale ;
- Engagement communautaire.

✓ **Activités dans la Commune de TIBATI**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 09 aires de santé sur les 15 que compte le DS de TIBATI. 48 communautés ont été déclenchées dans cette commune;

Le total des déclenchements a permis de réaliser, 9 aires de santé ont été touchées, 47 communautés déclenchées pour un total de 3860 personnes présentes, dont 2334 hommes, 960 femmes et 566 enfants.

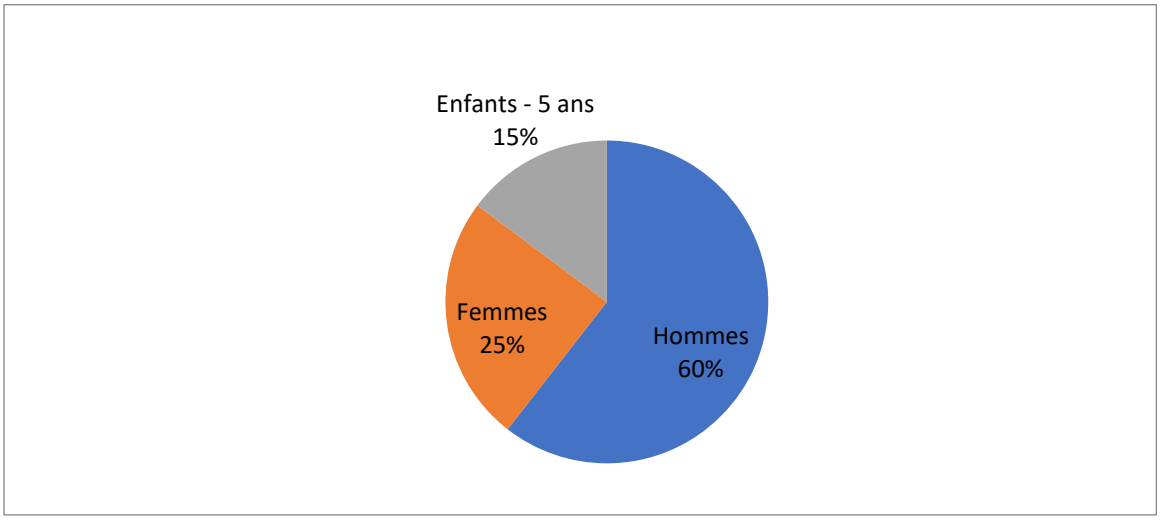

Graphique 24 ***:*** *Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de TIBATI*



Photo 29 ***:*** *Cartographie lors du déclenchement dans la localité de Maidjamba 1 (Commune de Tibati)*



Photo 30 ***:*** *Mobilisation lors du déclenchement dans la localité de Dan Haoussa (Commune de Tibati)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE TIBATI**

Tableau 31 ***:*** *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de TIBATI*

District de santé : TIBATI **Commune** : TIBATI										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclenchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction (oui/non)**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	MEIDJAMBA	DAN HAOUSSA	64	24	24	16	60	OUI	15/09/2022	20/11/2022
2		MEIDJAMBA I	100	37	35	28	84	OUI	15/09/2022	30/10/2022
3		GONGONTOUA	108	47	35	26	95	OUI	19/09/2022	20/11/2022
4		NYADJIDA	77	54	18	05	55	OUI	19/09/2022	30/10/2022
5		SOLA	82	37	26	19	32	OUI	22/09/2022	15/11/2022
6		MBITOM C	167	87	45	35	80	OUI	22/09/2022	01/11/2022
7		MANGLE	77	22	12	43	52	OUI	11/10/2023	01/12/2022
8		MEIDJAMBA 1	59	37	18	04	59	OUI	05/11/2022	01/01/2023
9	MBAKAOU	GANTANG	125	72	43	10	52	OUI	21/09/2022	--/01/2023
10		DJAORO KOMBO	63	42	14	07	55	OUI	26/09/2022	01/01/2023
11		NDATAL	62	35	23	04	52	OUI	26/09/2022	01/12/2022
12		MADJOSSI	62	35	23	04	51	OUI	26/09/2022	01/12/2022
13		CARRIERE	41	26	12	03	42	OUI	26/09/2022	01/01/2023
14	LIBOUM	LIBOUM	104	62	24	18	104	OUI	20/09/2022	10/12/2022
15		SAXON	85	47	26	12	55	OUI	20/09/2022	01/10/2022
16		SISSIMI	96	51	32	13	49	OUI	21/09/2022	20/12/2022
17		BONINTING	148	83	36	29	120	OUI	21/09/2022	01/01/2023
18	NGAOUBELA	GAOUBELA I	124	63	57	04	124	OUI	27/09/2022	01/01/2023
19		GAOUBELA II	132	83	37	12	132	OUI	27/09/2022	01/01/2023


20		MENG	80	53	18	09	80	OUI	27/09/2022	01/01/2023
21		MALARBA II A	69	42	23	04	42	OUI	29/09/2022	01/01/2023
22		MALARBA II B	106	58	37	11	46	OUI	28/09/2022	01/01/2023
23		MALARABA II C	76	46	17	13	40	OUI	28/09/2022	01/01/2023
24		MACOUP	117	87	13	17	51	OUI	05/10/2022	01/12/2022
25		MAHOR	75	47	21	07	31	OUI	05/10/2022	01/12/2022
26		TICHE I (DJALINGO)	68	61	04	03	54	OUI	05/10/2022	01/12/2022
27		BANTAI I	55	45	09	01	55	OUI	24/10/2022	18/11/2022
28		BANTAI II	41	35	06	00	41	OUI	24/10/2022	18/11/2022
29		ALHAMISSA	52	33	17	02	52	OUI	24/10/2022	19/11/2022
30	NGATT	KANDJE	64	35	17	12	35	OUI	04/10/2022	01/12/2022
31		NGATT I	94	70	10	14	72	OUI	04/10/2022	01/12/2022
32		NGATT II	66	53	09	04	66	OUI	04/10/2022	01/12/2022
33		DJAORO GARGA	31	23	01	07	31	OUI	03/10/2022	01/12/2022
34		WANDJOCK	74	36	13	25	74	OUI	03/10/2022	01/12/2022
35		ARDO PALANGUEL	96	36	48	12	35	OUI	03/10/2022	12/12/2022
36	TONGO	DABER I	74	35	22	17	74	OUI	12/10/2022	01/01/2023
37		DABER II	102	42	36	24	98	OUI	12/10/2022	01/01/2023
38	ALLAT MEGAT	SALASSA	96	53	36	07	69	OUI	13/10/2022	01/12/2022
39	DJOMBI	HOSSERE KOBA	67	66	01	00	63	OUI	18/10/2022	18/11/2022
40		BANANA	47	40	00	07	47	OUI	18/10/2022	18/11/2022
41		DJOMBI II A	89	67	15	07	62	OUI	19/10/2022	19/11/2022
42		DJOMBI II B	109	70	25	14	81	OUI	19/11/2922	19/11/2022
43		DJOMBI I B	69	63	00	06	62	OUI	20/10/2022	20/11/2022
44		DJOMBI I A	61	51	03	07	61	OUI	20/10/2022	20/11/2022
45		MAFO II	55	47	06	02	52	OUI	26/10/2022	01/12/2022
46		MAFO I	64	53	04	07	51	OUI	26/10/2022	26/11/2022
47	TIBATI	MAKANDAO I	44	17	05	22	45	OUI	27/10/2022	01/12/2022
48		MAKANDAO II	43	26	04	13	44	OUI	27/10/2022	01/12/2022

	09	**47**	**3860**	**2334**	**960**	**566**	**2967**			

Nous notons qu'il y a une moyenne de plus de 80 personnes présentes lors des déclenchements tout en soulignant une forte présence des hommes.

✓ **Activités dans la Commune de NGAOUNDAL**

Il sera noté que 06 aires de santé sur un total de 11 que compte le DS ont été couvertes par l'équipe du projet dans la commune de Ngaoundal, au total 30 communautés déclenchées pour un total de 2062 personnes présentes, dont 1363 hommes, 367 femmes et 332 enfants.

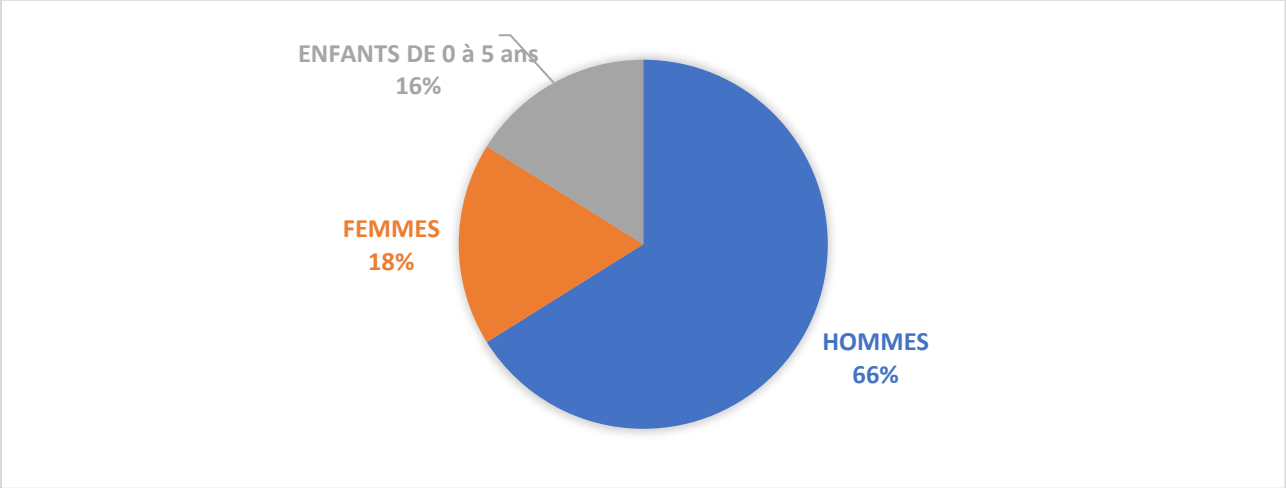

Graphique 25 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de NGAOUNDAL*



Photo 32 et 33 *: Engagement et cartographie lors du déclenchement dans la localité de Djoundé (Commune de Ngaoundal)*



Photo 34 ***:*** *Séance de déclenchement dans la localité de Mazouin (Commune de Ngaoundal)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE NGOUNDAL**

Tableau 32 *: Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de NGAOUNDAL*

District de santé : NGAOUNDAL **Commune** : NGAOUNDAL										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclenchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	**NGAOUNDAL CATHOLIQUE**	NOGBAYA	52	13	18	21	38	OUI	03/11/2022	01/01/2023
2		MBARNANG BAYA	43	26	7	10	33	OUI	03/11/2022	30/11/2022
3		GALA	51	26	13	12	39	OUI	03/11/2022	03/12/2022
4		MBARNANG FOULBE	39	30	5	4	34	OUI	25/11/2022	16/12/2022
5	**DJOUNDE**	DJOUNDE TIGO	54	25	17	12	45	OUI	04/11/2022	01/01/2023
6		DJOUNDE CCENTRE I	104	83	0	21	88	OUI	04/11/2022	01/01/2023
7		DJOUNDE CENTRE II	115	92	0	23	89	OUI	04/11/2022	01/01/2023
8		DJOUNDE NDOKO	99	75	0	24	77	OUI	01/11/2022	01/01/2023
9		KASSA MBERE	73	19	18	36	52	OUI	05/11/2022	01/12/2022
10	**DANFILI**	DANFILI BLOC5 I	76	70	3	3	53	OUI	08/11/2022	08/12/2022
11		DANFILI BLOC4 II	84	66	14	4	62	OUI	08/11/2022	08/12/2022
12		DANFILI BLOC5 I	76	53	17	6	51	OUI	08/11/2022	08/12/2022
13		DANFILI BLOC5 II	65	41	19	5	45	OUI	08/11/2022	08/12/2022
14		GONMANA	55	27	13	15	41	OUI	08/11/2022	08/12/2022
15	**BETARA CONGO**	BELLA FOKOU	68	40	19	9	49	OUI	09/11/2022	09/12/2022
16		BETARA CONGO	94	58	21	15	87	OUI	09/11/2022	09/12/2022
17		FEBADI I	59	40	9	10	47	OUI	11/11/2022	11/12/2022
18		FEBADI II	47	37	8	2	39	OUI	11/11/2022	11/12/2022

19		MBANDOUA	64	50	9	5	57	OUI	12/11/2022	12/12/2022
20		MAZOUIN	37	30	5	2	29	OUI	16/11/2022	16/12/2022
21		KASSA I	115	75	30	10	88	OUI	17/11/2022	10/12/2022
22		KASSA II	93	60	20	13	79	OUI	17/11/2022	17/12/2022
23		KASSA III	70	48	16	6	58	OUI	17/11/2022	10/12/2022
24	**CMA NGAOUNDAL**	NGALBIZE I	55	45	7	3	47	OUI	15/11/2022	15/12/2022
25		NGALBIZE II	45	36	8	1	39	OUI	15/11/2022	15/12/2022
26		MASSIF PLATEAU	39	29	4	6	33	OUI	15/11/2022	01/12/2022
27		BOULAMA PANGAR I	60	40	10	10	57	OUI	16/11/2022	16/12/2022
28	BEKA GOTTO	MBIWOROU	68	30	25	13	46	OUI	21/11/2022	15/12/2022
29		MBAMIYANGA I	86	45	18	23	80	OUI	23/11/2022	15/12/2022
30		MBAMIYANGA II	76	54	14	8	70	OUI	23/11/2022	01/12/2022
	06	**30**	**2062**	**1363**	**367**	**332**	**1652**			

2.5.7.2 Les déclenchement dans le département du MAYO BANYO

Pendant cette période et compte tenu du contexte de la zone du projet (distance entre les localités et insécurité), l'ONG a opté pour un travail d'équipe concernant le déclenchement. Chaque équipe était composée de 02 facilitateurs accompagnés soit du superviseur, de l'agent communal d'hygiène et parfois des chefs de aires de santé.

- ✓ **Principaux résultats attendus au cours de cette période**

Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Toutes les localités de la liste sont déclencher à l'ATPC;
- Un comité local de suivi est créé dans chaque communauté.

- ✓ **Activités menées durant la période**

Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:

- La prise de rendez-vous avec les autorités traditionnelles des localités/communautés pour les dates et les heures de déclenchement ;
- Le déclenchement de l'ATPC dans les localités/communautés.


Les activités de déclenchement se sont tenues simultanément dans chaque commune. Les équipes couvraient une moyenne de 6 villages déclenchés par jour.

L'implication des populations dans toutes les étapes du déclenchement telles que :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance ;
- Cartographie des aires de défécation ;
- Marche transversale dans les zones de défécation ;
- Le Calcul des matières fécales ;
- L'exercice du verre d'eau ;
- Voies de contamination fécale ;
- Engagement communautaire

- ✓ **Activités dans la Commune de BANYO**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 07 aires de santé sur les 11 que compte la commune de Banyo. Ainsi 38 communautés ont été déclenchées pour un total de 2 877 personnes présentes, dont 1057 hommes, 913 femmes et 907 enfants.

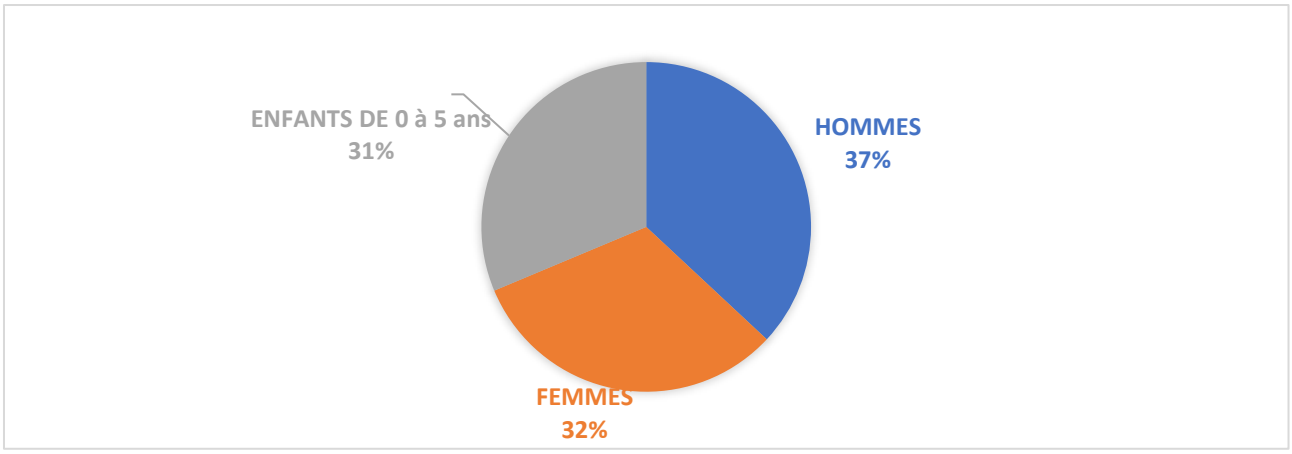

Graphique 26 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de BANYO*



Photo 37 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité d'Alarba (Commune de Banyo)*



Photo 39 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Taram Siri (Commune de Banyo)*



Photo 40 ***:*** *Marche transversale lors du déclenchement dans la localité de Bantay (Commune de Banyo)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE BANYO**


Tableau 33 ***:*** *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de BANYO*

District de santé : BANYO **Commune** : BANYO										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclanchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction (oui/non)**	**Date de déclanchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	ALLAT	NYAWA KATARKO I	63	18	26	19	59	OUI	24/09/2022	24/10/2022
2		NYAWA KATARKO II	60	20	23	17	56	OUI	24/09/2022	24/10/2022
3		NGUM KATARKO	73	8	25	40	46	OUI	24/09/2022	15/10/2022
4		TOUKOURWA	77	18	21	38	38	OUI	23/09/2022	10/10/2022
5		MAYO-DJANTANG	52	10	21	21	26	OUI	01/10/2022	01/12/2022
6		BENGUEDJI WAWA I	117	52	29	36	100	OUI	04/10/2022	05/11/2022
7		BENGUEDJI WAWA II	88	38	22	28	79	OUI	04/10/2022	05/11/2022
8		ALARBA BANDA	72	26	19	27	40	OUI	04/10/2022	31/10/2022
9		SANGUERE DJAORO ABBO	41	16	14	11	27	OUI	05/10/2022	01/11/2022
10		MAYO BOUTALI	81	9	35	37	47	OUI	05/10/2022	01/12/2022
11		BON MARCHE	52	10	21	21	26	OUI	05/10/2022	01/12/2022
12		NGUM GASSIRI	94	38	40	16	48	OUI	25/11/2022	22/12/2022
13		MAYO BADJI	71	42	12	17	47	OUI	24/11/2022	27/12/2022
14	SAMBO LABO	MBAMTI-DJOUMBARE I	92	45	20	27	70	OUI	14/10/2022	14/12/2022
15		MBAMTI-DJOUMBERE II	79	30	26	23	49	OUI	14/10/2022	01/01/2023
16		MBAH	87	45	17	25	65	OUI	17/10/2022	17/11/2022

17	BANYO-FADA	MAYO-FOROU LAISSE	67	29	26	12	46	OUI	12/10/2022	12/11/2022
18		OURO-GORDI	95	40	30	25	63	OUI	12/10/2022	05/11/2022
19		MAYO FOROU DO	59	29	18	12	39	OUI	20/10/2022	10/11/2022
20		MAYO-BANYO BARIKI A	152	70	32	50	51	OUI	17/10/2022	17/11/2022
21		MAYO-BANYO BARIKI B	70	30	20	20	39	OUI	17/10/2022	17/11/2022
22	NDI WAWA	YOUKSA TAPAWA	68	22	22	24	46	OUI	18/10/2022	18/12/2022
23		MBASSEWA	52	25	16	11	43	OUI	24/11/2022	17/11/2022
24		OUMYARI A	97	26	36	35	87	OUI	24/10/2022	18/12/2022
25		OUMYARI B	61	29	20	12	51	OUI	24/10/2022	18/11/2022
26		BOUDJOUNKOURA A	115	70	15	30	50	OUI	26/10/2022	01/12/2022
27		BOUDJOUNKOURA B	65	30	20	15	50	OUI	26/10/2022	22/11/2022
28	BANYO-TICKET	ILLANGA	67	17	30	20	44	OUI	18/10/2022	18/11/2022
29		BENKE	52	10	25	17	50	OUI	18/10/2022	01/12/2022
30		TARAM KATARKO	63	23	14	26	45	OUI	21/09/2022	21/10/2022
31		MBOUBOU	104	32	37	35	35	OUI	26/09/2022	01/11/2022
32		TARAM SIRI	117	35	27	55	85	OUI	26/09/2022	01/12/2022
33		NYATI RANCH	43	20	16	7	36	OUI	25/11/2022	22/12/2022
34	MBAMTI KATARKO	LABARE BAYA	54	21	18	15	51	OUI	27/10/2022	17/11/2022
35		LABARE SEINI	62	17	25	20	47	OUI	27/10/2022	17/11/2022
36	TARAM-YABAM	TARAM-YABAM	62	22	31	9	56	OUI	01/10/2022	01/12/2022
37		BANTAY	72	26	29	17	42	OUI	02/10/2022	01/12/2022
38		TARAM-BADJAM	81	9	35	37	27	OUI	01/10/2022	01/11/2022
	07	**38**	**2877**	**1057**	**913**	**907**	**1906**			

✓ Activités dans la Commune de BANKIM

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 10 aires de santé sur les 14 que compte la commune de BANKIM. Ainsi quarante-huit (48) communautés ont été déclenchées pour un total de 4214 personnes présentes, dont 1803 hommes, 1570 femmes et 841 enfants.

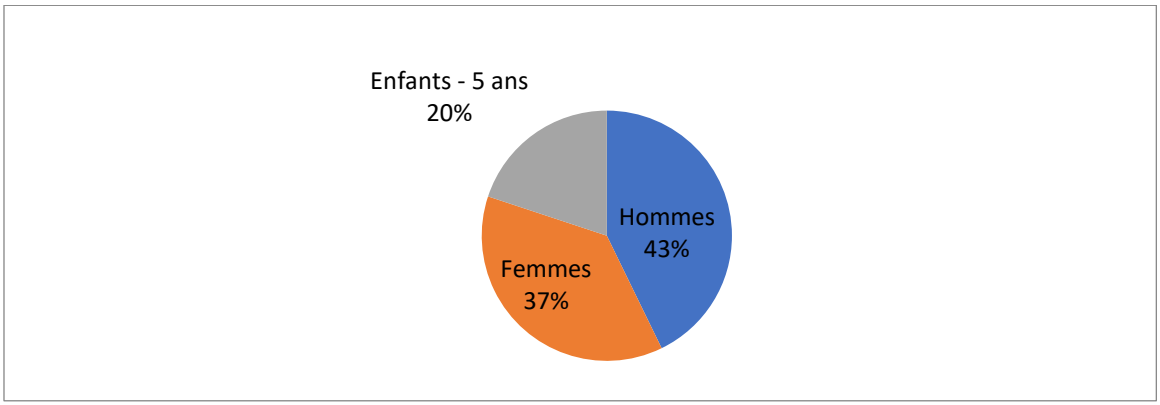

Graphique 27 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de BANKIM*



Photo 41 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Mbetock (Commune de Bankim)*





Photo 42 et 43 *:* *Exercice du verre d'eau et Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Yimberé (Commune de Bankim)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE BANKIM**


Tableau 34 *: Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de BANKIM*

District de santé : BANKIM **Commune** : BANKIM										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale le pendant déclenchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction (oui/non)**	**Date de déclanchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	NGATTI	NYAKONG MAPE	84	31	32	21	30	OUI	04/11/2022	17/11/2022
2		MBADJI I	67	35	5	27	43	OUI	05/11/2022	18/11/2022
3		MBADJI II	73	37	7	29	55	OUI	05/11/2022	18/11/2022
4		MBOUGAM CHEFFERIE	66	27	26	13	46	OUI	05/11/2022	17/11/2022
5		MBAMBOUAH	55	35	15	5	39	OUI	05/11/2022	17/11/2022
6		GLORY	54	21	26	7	46	OUI	13/11/2022	15/12/2022
7		MBETOCK	40	20	15	5	32	OUI	10/11/2022	15/12/2022
8		NGATTI	83	34	32	17	53	OUI	13/11/2022	15/12/2022
9		MIBELONG	134	59	47	28	97	OUI	10/11/2022	15/12/2022
10	BANKIM RURAL	CITE MAPE I	84	31	32	21	68	OUI	07/11/2022	17/11/2022
11		CITE MAPE II	72	43	15	14	58	OUI	07/11/2022	18/11/2022
12		MBOUGAM CARREFOUR	97	58	27	12	79	OUI	07/11/2022	18/11/2022
13	DIEKI	QUARTIER BAMOUN I	66	27	26	13	57	OUI	08/11/2022	17/11/2022
14		QUARTIER BAMOUN II	74	45	25	4	56	OUI	08/11/2022	17/11/2022
15	BANDAM	KONGUI DJOM	107	46	52	9	84	OUI	14/11/2022	17/11/2022
16		TCHIM I	153	53	75	25	121	OUI	14/11/2022	18/11/2022
17		TCHIM II	100	33	50	17	75	OUI	14/11/2022	18/11/2022
18		NYAKONG I	91	41	33	17	67	OUI	15/11/2022	25/11/2022
19		NYAKONG II	92	43	28	21	73	OUI	15/11/2022	25/11/2022
20		BANDAM I	67	29	31	7	49	OUI	17/11/2022	31/11/2022

21		BANDAM II	79	33	34	12	62	OUI	17/11/2022	31/11/2022
22		MVOUH	89	32	40	17	41	OUI	16/11/2022	20/11/2022
23	NYAMBOYA	YIMBERE	88	42	35	11	70	OUI	16/11/2022	30/11/2022
24		BARRAGE LUNDI	79	35	2	42	54	OUI	19/11/2022	27/11/2022
25		NDOUMDJANDI I	90	33	32	25	64	OUI	19/11/2022	27/11/2022
26		NDOUMDJANDJI II	107	35	42	30	92	OUI	19/11/2022	27/11/2022
27	TCHAMBA	NDEM	32	18	9	5	29	OUI	24/11/2022	24/12/2022
28		NDUM DJUM	60	35	18	7	56	OUI	24/11/2022	24/12/2022
29		TCHAMBA I	121	32	71	18	65	OUI	24/11/2022	24/12/2022
30		TCHAMBA II	91	41	33	17	59	OUI	24/11/2022	24/12/2022
31		TCHAMBA II	92	43	28	21	70	OUI	24/11/2022	24/12/2022
32		TCHAMBA IV	99	39	31	29	71	OUI	24/11/2022	24/12/2022
33		TCHAMBA V	89	32	40	17	55	OUI	24/11/2022	24/12/2022
34	ATTA	KILA et MELEM	88	42	35	11	75	OUI	22/11/2022	30/12/2022
35		PETIT ATTA	79	35	2	42	67	OUI	22/11/2022	23/12/2022
36		FIVOURI	90	33	32	25	36	OUI	22/11/2022	23/12/2022
37	SOMIE	NEW GROUP	115	49	61	5	78	OUI	22/11/2022	15/12/2022
38		MBONDJANGA	142	61	48	33	89	OUI	25/11/2022	25/12/2022
39		NKUI	151	49	69	33	96	OUI	25/11/2022	25/12/2022
40		KONGUI DOUOH I	68	30	25	13	46	OUI	26/11/2022	18/12/2022
41		KONGUI DOUOH II	86	45	18	23	80	OUI	26/11/2022	18/12/2022
42		KONGUI DOUOH III	76	54	14	8	70	OUI	26/11/2022	18/12/2022
43		SARKI BAKA I	121	32	71	18	102	OUI	27/11/2022	15/12/2022
44		SARKI BAKA II	91	41	33	17	67	OUI	27/11/2022	15/12/2022
45		KOUROUM I	72	38	28	6	63	OUI	28/11/2022	31/12/2022
46		KOUROUM II	69	33	24	12	41	OUI	28/11/2022	31/12/2022
47	SONKOLONG	LOUMDE (KOLOK)	39	7	24	8	33	OUI	28/11/2022	30/12/2022
48		FINGONG II	152	56	72	24	50	OUI	29/11/2022	25/12/2022
	08	**46**	**4214**	**1803**	**1570**	**841**	**3009**			

✓ Activités dans la Commune de MAYO DARLE

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 05 que compte la commune de Mayo Darlé. Ainsi dix 10 communautés ont été déclenchées pour un total de 833 personnes présentes, dont 401 hommes, 279 femmes et 153 enfants.

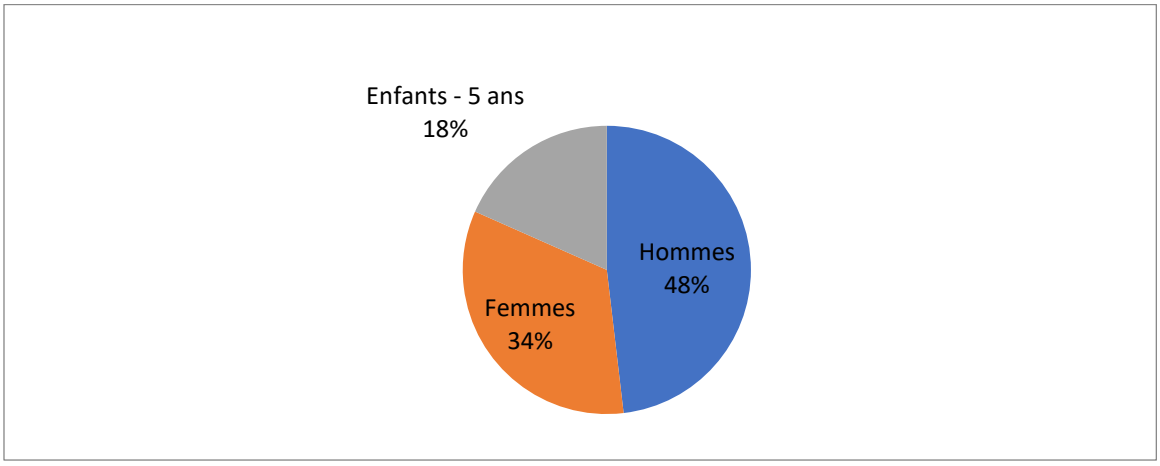

Graphique 28 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de MAYO DARLE*



Photo 44 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Gwaya Mambila (Commune de Mayo Darlé)*



Photo 45 ***:*** *Marche transversale lors du déclenchement dans la localité de Yoli (Commune de Mayo Darlé)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE MAYO DARLE**

Tableau 35 *: Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de MAYO DARLE*

District de santé : BANYO **Commune** : MAYO-DARLE										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale le pendant déclanchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction (oui/non)**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	RIBAO	GWAYA MAMBILA	59	30	17	12	43	OUI	17/11/2022	17/12/2022
2		OURO YOBI I	88	38	27	23	67	OUI	17/11/2022	15/12/2022
3		OUURO YOBI II	97	58	27	12	74	OUI	17/11/2022	15/12/2022
4		GWAYA YAMBA	81	40	25	16	59	OUI	18/11/2022	18/12/2022
5		MAYO-BOUNWA	38	19	11	8	32	OUI	18/11/2022	17/12/2022
6		MAYO NGUIDOUNGA	40	25	10	5	36	OUI	22/11/2022	15/12/2022
7	BOUMDO	YOLI	130	50	60	20	76	OUI	14/10/2022	12/12/2022
8		YOLI II	65	25	30	10	46	OUI	24/11/2022	12/12/2022
9		MONDIAL I	94	38	40	16	48	OUI	24/11/2022	22/12/2022
10		MONDIAL II	70	30	20	20	51	OUI	24/11/2022	22/12/2022
11		MAYO BADJI	71	48	12	11	54	OUI	24/11/2022	12/12/2022
	02	**11**	**833**	**401**	**279**	**153**	**586**			

✓ COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA REGION DE L'ADAMAOUA

Région de l'ADAMAOUA Cameroun										
Communes : TIBATI - NAGOUNDAL - BANYO - BANKIM - MAYO DARLE										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclenchement**	**Nbre des Hommes**	**Nbre des femmes**	**Nbre des jeunes enfants**	**Nbre de ménages**	**Engagement en termes de construction (oui/non)**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	MEIDJAMBA	DAN HAOUSSA	64	24	24	16	60	OUI	15/09/2022	20/11/2022
2		MEIDJAMBA I	100	37	35	28	84	OUI	15/09/2022	30/10/2022
3		GONGONTOUA	108	47	35	26	95	OUI	19/09/2022	20/11/2022
4		NYADJIDA	77	54	18	5	55	OUI	19/09/2022	30/10/2022
5		SOLA	82	37	26	19	32	OUI	22/09/2022	15/11/2022
6		MBITOM C	167	87	45	35	80	OUI	22/09/2022	01/11/2022
7		MANGLE	77	22	12	43	52	OUI	11/10/2023	01/12/2022
8		MEIDJAMBA 1	59	37	18	4	59	OUI	05/11/2022	01/01/2023
9	MBAKAOU	GANTANG	125	72	43	10	52	OUI	21/09/2022	--/01/2023
10		DJAORO KOMBO	63	42	14	7	55	OUI	26/09/2022	01/01/2023
11		NDATAL	62	35	23	4	52	OUI	26/09/2022	01/12/2022
12		MADJOSSI	62	35	23	4	51	OUI	26/09/2022	01/12/2022
13		CARRIERE	41	26	12	3	42	OUI	26/09/2022	01/01/2023
14	LIBOUM	LIBOUM	104	62	24	18	104	OUI	20/09/2022	10/12/2022
15		SAXON	85	47	26	12	55	OUI	20/09/2022	01/10/2022
16		SISSIMI	96	51	32	13	49	OUI	21/09/2022	20/12/2022
17		BONINTING	148	83	36	29	120	OUI	21/09/2022	01/01/2023
18	NGAOUBELA	GAOUBELA I	124	63	57	4	124	OUI	27/09/2022	01/01/2023
19		GAOUBELA II	132	83	37	12	132	OUI	27/09/2022	01/01/2023
20		MENG	80	53	18	9	80	OUI	27/09/2022	01/01/2023

21		MALARBA II A	69	42	23	4	42	OUI	29/09/2022	01/01/2023
22		MALARBA II B	106	58	37	11	46	OUI	28/09/2022	01/01/2023
23		MALARABA II C	76	46	17	13	40	OUI	28/09/2022	01/01/2023
24		MACOUP	117	87	13	17	51	OUI	05/10/2022	01/12/2022
25		MAHOR	75	47	21	7	31	OUI	05/10/2022	01/12/2022
26		TICHE I (DJALINGO)	68	61	4	3	54	OUI	05/10/2022	01/12/2022
27		BANTAI I	55	45	9	1	55	OUI	24/10/2022	18/11/2022
28		BANTAI II	41	35	6	0	41	OUI	24/10/2022	18/11/2022
29		ALHAMISSA	52	33	17	2	52	OUI	24/10/2022	19/11/2022
30	NGATT	KANDJE	64	35	17	12	35	OUI	04/10/2022	01/12/2022
31		NGATT I	94	70	10	14	72	OUI	04/10/2022	01/12/2022
32		NGATT II	66	53	9	4	66	OUI	04/10/2022	01/12/2022
33		DJAORO GARGA	31	23	1	7	31	OUI	03/10/2022	01/12/2022
34		WANDJOCK	74	36	13	25	74	OUI	03/10/2022	01/12/2022
35		ARDO PALANGUEL	96	36	48	12	35	OUI	03/10/2022	12/12/2022
36	TONGO	DABER I	74	35	22	17	74	OUI	12/10/2022	01/01/2023
37		DABER II	102	42	36	24	98	OUI	12/10/2022	01/01/2023
38	ALLAT MEGAT	SALASSA	96	53	36	7	69	OUI	13/10/2022	01/12/2022
39	DJOMBI	HOSSERE KOBA	67	66	1	0	63	OUI	18/10/2022	18/11/2022
40		BANANA	47	40	0	7	47	OUI	18/10/2022	18/11/2022
41		DJOMBI II A	89	67	15	7	62	OUI	19/10/2022	19/11/2022
42		DJOMBI II B	109	70	25	14	81	OUI	19/11/2922	19/11/2022
43		DJOMBI I B	69	63	0	6	62	OUI	20/10/2022	20/11/2022
44		DJOMBI I A	61	51	3	7	61	OUI	20/10/2022	20/11/2022
45		MAFO II	55	47	6	2	52	OUI	26/10/2022	01/12/2022
46		MAFO I	64	53	4	7	51	OUI	26/10/2022	26/11/2022
47	TIBATI	MAKANDAO I	44	17	5	22	45	OUI	27/10/2022	01/12/2022

48		MAKANDAO II	43	26	4	13	44	OUI	27/10/2022	01/12/2022
49	**NGAOUNDAL CATHOLIQUE**	NOGBAYA	52	13	18	21	38	OUI	03/11/2022	01/01/2023
50		MBARNANG BAYA	43	26	7	10	33	OUI	03/11/2022	30/11/2022
51		GALA	51	26	13	12	39	OUI	03/11/2022	03/12/2022
52		MBARNANG FOULBE	39	30	5	4	34	OUI	25/11/2022	16/12/2022
53	**DJOUNDE**	DJOUNDE TIGO	54	25	17	12	45	OUI	04/11/2022	01/01/2023
54		DJOUNDE CCENTRE I	104	83	0	21	88	OUI	04/11/2022	01/01/2023
55		DJOUNDE CENTRE II	115	92	0	23	89	OUI	04/11/2022	01/01/2023
56		DJOUNDE NDOKO	99	75	0	24	77	OUI	01/11/2022	01/01/2023
57		KASSA MBERE	73	19	18	36	52	OUI	05/11/2022	01/12/2022
58	**DANFILI**	DANFILI BLOC5 I	76	70	3	3	53	OUI	08/11/2022	08/12/2022
59		DANFILI BLOC4 II	84	66	14	4	62	OUI	08/11/2022	08/12/2022
60		DANFILI BLOC5 I	76	53	17	6	51	OUI	08/11/2022	08/12/2022
61		DANFILI BLOC5 II	65	41	19	5	45	OUI	08/11/2022	08/12/2022
62		GONMANA	55	27	13	15	41	OUI	08/11/2022	08/12/2022
63	**BETARA CONGO**	BELLA FOKOU	68	40	19	9	49	OUI	09/11/2022	09/12/2022
64		BETARA CONGO	94	58	21	15	87	OUI	09/11/2022	09/12/2022
65		FEBADI I	59	40	9	10	47	OUI	11/11/2022	11/12/2022
66		FEBADI II	47	37	8	2	39	OUI	11/11/2022	11/12/2022
67		MBANDOUA	64	50	9	5	57	OUI	12/11/2022	12/12/2022
68		MAZOUIN	37	30	5	2	29	OUI	16/11/2022	16/12/2022
69		KASSA I	115	75	30	10	88	OUI	17/11/2022	10/12/2022
70		KASSA II	93	60	20	13	79	OUI	17/11/2022	17/12/2022
71		KASSA III	70	48	16	6	58	OUI	17/11/2022	10/12/2022
72	**CMA NGAOUNDAL**	NGALBIZE I	55	45	7	3	47	OUI	15/11/2022	15/12/2022
73		NGALBIZE II	45	36	8	1	39	OUI	15/11/2022	15/12/2022
74		MASSIF PLATEAU	39	29	4	6	33	OUI	15/11/2022	01/12/2022
75		BOULAMA PANGAR I	60	40	10	10	57	OUI	16/11/2022	16/12/2022

76	**BEKA GOTTO**	MBIWOROU	68	30	25	13	46	OUI	21/11/2022	15/12/2022
77		MBAMIYANGA I	86	45	18	23	80	OUI	23/11/2022	15/12/2022
78		MBAMIYANGA II	76	54	14	8	70	OUI	23/11/2022	01/12/2022
79	ALLAT	NYAWA KATARKO I	63	18	26	19	59	OUI	24/09/2022	24/10/2022
80		NYAWA KATARKO II	60	20	23	17	56	OUI	24/09/2022	24/10/2022
81		NGUM KATARKO	73	8	25	40	46	OUI	24/09/2022	15/10/2022
82		TOUKOURWA	77	18	21	38	38	OUI	23/09/2022	10/10/2022
83		MAYO-DJANTANG	52	10	21	21	26	OUI	01/10/2022	01/12/2022
84		BENGUEDJI WAWA I	117	52	29	36	100	OUI	04/10/2022	05/11/2022
85		BENGUEDJI WAWA II	88	38	22	28	79	OUI	04/10/2022	05/11/2022
86		ALARBA BANDA	72	26	19	27	40	OUI	04/10/2022	31/10/2022
87		SANGUERE DJAORO ABBO	41	16	14	11	27	OUI	05/10/2022	01/11/2022
88		MAYO BOUTALI	81	9	35	37	47	OUI	05/10/2022	01/12/2022
89		BON MARCHE	52	10	21	21	26	OUI	05/10/2022	01/12/2022
90		NGUM GASSIRI	94	38	40	16	48	OUI	25/11/2022	22/12/2022
91		MAYO BADJI	71	42	12	17	47	OUI	24/11/2022	27/12/2022
92	SAMBO LABO	MBAMTI-DJOUMBARE I	92	45	20	27	70	OUI	14/10/2022	14/12/2022
93		MBAMTI-DJOUMBERE II	79	30	26	23	49	OUI	14/10/2022	01/01/2023
94		MBAH	87	45	17	25	65	OUI	17/10/2022	17/11/2022
95	BANYO-FADA	MAYO-FOROU LAISSE	67	29	26	12	46	OUI	12/10/2022	12/11/2022
96		OURO-GORDI	95	40	30	25	63	OUI	12/10/2022	05/11/2022
97		MAYO FOROU DO	59	29	18	12	39	OUI	20/10/2022	10/11/2022
98		MAYO-BANYO BARIKI A	152	70	32	50	51	OUI	17/10/2022	17/11/2022
99		MAYO-BANYO BARIKI B	70	30	20	20	39	OUI	17/10/2022	17/11/2022
100	NDI WAWA	YOUKSA TAPAWA	68	22	22	24	46	OUI	18/10/2022	18/12/2022
101		MBASSEWA	52	25	16	11	43	OUI	24/11/2022	17/11/2022
102		OUMYARI A	97	26	36	35	87	OUI	24/10/2022	18/12/2022

103		OUMYARI B	61	29	20	12	51	OUI	24/10/2022	18/11/2022
104		BOUDJOUNKOURA A	115	70	15	30	50	OUI	26/10/2022	01/12/2022
105		BOUDJOUNKOURA B	65	30	20	15	50	OUI	26/10/2022	22/11/2022
106	BANYO-TICKET	ILLANGA	67	17	30	20	44	OUI	18/10/2022	18/11/2022
107		BENKE	52	10	25	17	50	OUI	18/10/2022	01/12/2022
108		TARAM KATARKO	63	23	14	26	45	OUI	21/09/2022	21/10/2022
109		MBOUBOU	104	32	37	35	35	OUI	26/09/2022	01/11/2022
110		TARAM SIRI	117	35	27	55	85	OUI	26/09/2022	01/12/2022
111		NYATI RANCH	43	20	16	7	36	OUI	25/11/2022	22/12/2022
112	MBAMTI KATARKO	LABARE BAYA	54	21	18	15	51	OUI	27/10/2022	17/11/2022
113		LABARE SEINI	62	17	25	20	47	OUI	27/10/2022	17/11/2022
114	TARAM-YABAM	TARAM-YABAM	62	22	31	9	56	OUI	01/10/2022	01/12/2022
115		BANTAY	72	26	29	17	42	OUI	02/10/2022	01/12/2022
116		TARAM-BADJAM	81	9	35	37	27	OUI	01/10/2022	01/11/2022
117	NGATTI	NYAKONG MAPE	84	31	32	21	30	OUI	04/11/2022	17/11/2022
118		MBADJI I	67	35	5	27	43	OUI	05/11/2022	18/11/2022
119		MBADJI II	73	37	7	29	55	OUI	05/11/2022	18/11/2022
120		MBOUGAM CHEFFERIE	66	27	26	13	46	OUI	05/11/2022	17/11/2022
121		MBAMBOUAH	55	35	15	5	39	OUI	05/11/2022	17/11/2022
122		GLORY	54	21	26	7	46	OUI	13/11/2022	15/12/2022
123		MBETOCK	40	20	15	5	32	OUI	10/11/2022	15/12/2022
124		NGATTI	83	34	32	17	53	OUI	13/11/2022	15/12/2022
125		MIBELONG	134	59	47	28	97	OUI	10/11/2022	15/12/2022
126	BANKIM RURAL	CITE MAPE I	84	31	32	21	68	OUI	07/11/2022	17/11/2022
127		CITE MAPE II	72	43	15	14	58	OUI	07/11/2022	18/11/2022
128		MBOUGAM CARREFOUR	97	58	27	12	79	OUI	07/11/2022	18/11/2022
129	DIEKI	QUARTIER BAMOUN I	66	27	26	13	57	OUI	08/11/2022	17/11/2022

130		QUARTIER BAMOUN II	74	45	25	4	56	OUI	08/11/2022	17/11/2022
131	BANDAM	KONGUI DJOM	107	46	52	9	84	OUI	14/11/2022	17/11/2022
132		TCHIM I	153	53	75	25	121	OUI	14/11/2022	18/11/2022
133		TCHIM II	100	33	50	17	75	OUI	14/11/2022	18/11/2022
134		NYAKONG I	91	41	33	17	67	OUI	15/11/2022	25/11/2022
135		NYAKONG II	92	43	28	21	73	OUI	15/11/2022	25/11/2022
136		BANDAM I	67	29	31	7	49	OUI	17/11/2022	31/11/2022
137		BANDAM II	79	33	34	12	62	OUI	17/11/2022	31/11/2022
138		MVOUH	89	32	40	17	41	OUI	16/11/2022	20/11/2022
139	NYAMBOYA	YIMBERE	88	42	35	11	70	OUI	16/11/2022	30/11/2022
140		BARRAGE LUNDI	79	35	2	42	54	OUI	19/11/2022	27/11/2022
141		NDOUMDJANDI I	90	33	32	25	64	OUI	19/11/2022	27/11/2022
142		NDOUMDJANDJI II	107	35	42	30	92	OUI	19/11/2022	27/11/2022
143	TCHAMBA	NDEM	32	18	9	5	29	OUI	24/11/2022	24/12/2022
144		NDUM DJUM	60	35	18	7	56	OUI	24/11/2022	24/12/2022
145		TCHAMBA I	121	32	71	18	65	OUI	24/11/2022	24/12/2022
146		TCHAMBA II	91	41	33	17	59	OUI	24/11/2022	24/12/2022
147		TCHAMBA II	92	43	28	21	70	OUI	24/11/2022	24/12/2022
148		TCHAMBA IV	99	39	31	29	71	OUI	24/11/2022	24/12/2022
149		TCHAMBA V	89	32	40	17	55	OUI	24/11/2022	24/12/2022
150	ATTA	KILA et MELEM	88	42	35	11	75	OUI	22/11/2022	30/12/2022
151		PETIT ATTA	79	35	2	42	67	OUI	22/11/2022	23/12/2022
152		FIVOURI	90	33	32	25	36	OUI	22/11/2022	23/12/2022
153	SOMIE	NEW GROUP	115	49	61	5	78	OUI	22/11/2022	15/12/2022
154		MBONDJANGA	142	61	48	33	89	OUI	25/11/2022	25/12/2022
155		NKUI	151	49	69	33	96	OUI	25/11/2022	25/12/2022
156		KONGUI DOUOH I	68	30	25	13	46	OUI	26/11/2022	18/12/2022

157		KONGUI DOUOH II	86	45	18	23	80	OUI	26/11/2022	18/12/2022
158		KONGUI DOUOH III	76	54	14	8	70	OUI	26/11/2022	18/12/2022
159		SARKI BAKA I	121	32	71	18	102	OUI	27/11/2022	15/12/2022
160		SARKI BAKA II	91	41	33	17	67	OUI	27/11/2022	15/12/2022
161		KOUROUM I	72	38	28	6	63	OUI	28/11/2022	31/12/2022
162		KOUROUM II	69	33	24	12	41	OUI	28/11/2022	31/12/2022
163	SONKOLONG	LOUMDE (KOLOK)	39	7	24	8	33	OUI	28/11/2022	30/12/2022
164		FINGONG II	152	56	72	24	50	OUI	29/11/2022	25/12/2022
165	RIBAO	GWAYA MAMBILA	59	30	17	12	43	OUI	17/11/2022	17/12/2022
166		OURO YOBI I	88	38	27	23	67	OUI	17/11/2022	15/12/2022
167		OUURO YOBI II	97	58	27	12	74	OUI	17/11/2022	15/12/2022
168		GWAYA YAMBA	81	40	25	16	59	OUI	18/11/2022	18/12/2022
169		MAYO-BOUNWA	38	19	11	8	32	OUI	18/11/2022	17/12/2022
170		MAYO NGUIDOUNGA	40	25	10	5	36	OUI	22/11/2022	15/12/2022
171	BOUMDO	YOLI	130	50	60	20	76	OUI	14/10/2022	12/12/2022
172		YOLI II	65	25	30	10	46	OUI	24/11/2022	12/12/2022
173		MONDIAL I	94	38	40	16	48	OUI	24/11/2022	22/12/2022
174		MONDIAL II	70	30	20	20	51	OUI	24/11/2022	22/12/2022
175		MAYO BADJI	71	48	12	11	54	OUI	24/11/2022	12/12/2022
	33	**175**	**13846**	**6958**	**4089**	**2799**	**10120**			

2.5.7.3 Les déclenchements dans le département du HAUT-NYONG

Pendant la période, l'ONG a mené des séances de déclenchement dans les communes d'ABONG MBANG, MINDOUROU et ANGOSSAS ; Département de Haut Nyong, Région de l'Est.

- ✓ **Principaux résultats attendus au cours de cette période**
  Les principaux résultats attendus au cours de cette période sont :

- Toutes les localités de la liste sont déclencher à l'ATPC;
- Un comité local de suivi est créé dans chaque communauté.

- ✓ **Activités menées durant la période**
  Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:


- La prise de rendez-vous avec les autorités traditionnelles des localités/communautés pour les dates et les heures de déclenchement ;
- Le déclenchement de l'ATPC dans les localités/communautés.

Les activités de déclenchement se sont tenues simultanément dans chaque commune. L'implication des populations dans toutes les étapes du déclenchement telles que :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance ;
- Cartographie des aires de défécation ;
- Marche transversale dans les zones de défécation ;
- Le Calcul des matières fécales ;
- L'exercice du verre d'eau ;
- Voies de contamination fécale ;
- Engagement communautaire

- ✓ **Activités dans la Commune d'ABONG MBANG**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 04 aires de santé, 19 communautés ont été déclenchées pour un total de 764 personnes présentes, dont 500 hommes, 251 femmes et 13 enfants.

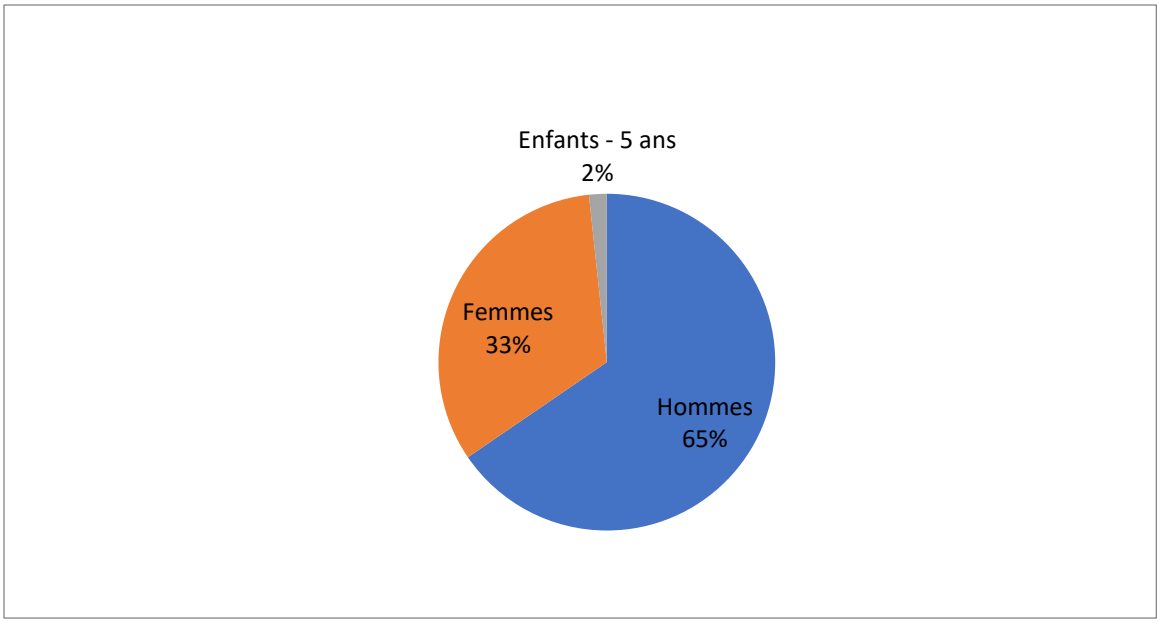

Graphique 29 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune d'ABONG MBANG*



Photo 48 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Mpenzock (Commune d'Abong Mbang)*



Photo 49 *: Plan de localisation de la localité de NKoual (Commune d'Abong Mbang)*



Photo 50 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité d'Adouma(Commune d'Abong Mbang)*


- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE D'ABONG MBANG**

Tableau 36 : *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune d'ABONG MBANG*

District de santé : ABONG-MBANG **Commune** : ABONG-MBANG										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale le pendant déclenchement**	**Nombre d'hommes**	**de Nombre femmes**	**Nombre de jeunes/ enfants**	**de Nombre ménages**	**Engagement en termes de construction Oui/Non**	**Date de déclenche ment**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	**ABONG MBANG SUD**	DJENASSOUME	45	22	23	0	12	OUI	17/11/2022	15/02/2023
2		ANZIE	33	17	12	4	7	OUI	17/11/2022	15/02/2023
3		ANKOAMBOM	33	24	9	0	9	OUI	24/11/2022	30/02/2023
4		ZOGUEMBOU	75	52	23	0	18	OUI	17/11/2022	15/02/2023
5		NKOUOLOU	60	39	21	0	24	OUI	18/11/2022	30/02/2023
6		OBOUL I	17	13	4	0	8	OUI	23/11/2022	05/03/2023
7		NTIMBE I	28	17	9	2	9	OUI	19/11/2022	30/02/2023
8	**ABONG MBANG OUEST**	ADOUMA	30	24	6	0	12	OUI	19/11/2022	30/02/2023
9		BAGOFIT	28	26	2	0	11	OUI	20/11/2022	30/02/2023
10		ANKOUNG	65	46	19	0	24	OUI	21/11/2022	30/02/2023
11		NKOUAL	33	26	7	0	16	OUI	21/11/2022	05/03/2023
12		NDJODJOCK	23	21	2	0	8	OUI	21/11/2022	05/03/2023
13		DJIBE	30	26	4	0	13	OUI	22/11/2022	05/03/2023
14		MAZABE	55	42	13	0	14	OUI	20/11/2022	30/03/2023
15	**ABONG MBANG EST**	OBOUL II	26	16	10	0	9	OUI	23/11/2022	05/03/2023
16		MPEMZOCK I	73	24	46	3	14	OUI	22/11/2022	05/03/2023
17		MPEMZOCK II	39	21	16	2	12	OUI	23/11/2022	05/03/2023
18		BAMAKO	35	18	15	2	7	OUI	19/11/2022	05/03/2023
19	**NKOUACK**	SOKAMALAM	36	26	10	0	11	OUI	22/11/2022	05/03/2023
TOTAL			**764**	**500**	**251**	**13**	**238**			

✓ **Activités dans la Commune de MINDOUROU**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 04 que compte la commune de Mindourou. Ainsi 15 communautés ont été déclenchées pour un total de 887 personnes présentes, dont 624 hommes, 240 femmes et 23 enfants.

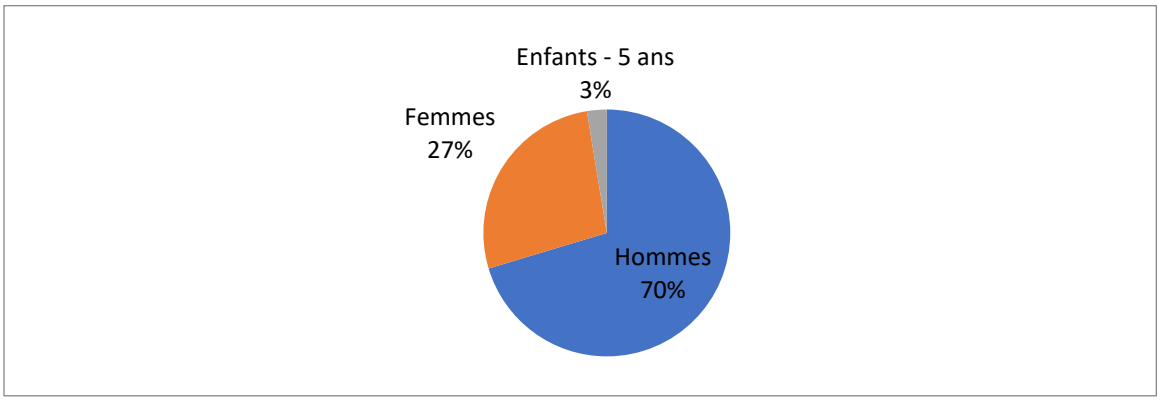

Graphique 30 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune de MINDOUROU*



Photo 53 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Medjoh (Commune de Mindourou)*


- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE DE MINDOUROU**

Tableau 37 ***:*** *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de MINDOUROU*

District de santé : MINDOUROU **Commune** : MINDOUROU										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale le pendant déclenchement**	**Nombre d'hommes**	**Nombre de femmes**	**Nombre de jeunes/ enfants**	**Nombre de ménages**	**Engagement en termes de construction Oui/Non**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	NKOUAK	NKOUAK	70	62	8	0	13	OUI	30/11/2022	30/02/2023
2		NONGBWALA	36	28	8	0	9	OUI	05/12/2022	30/02/2023
3		DJOUYAYA	57	47	10	0	11	OUI	05/12/2022	30/02/2023
4		ETSIEK	83	52	21	10	14	OUI	01/12/2022	30/02/2023
5		KAGNOL	42	27	15	0	11	OUI	01/12/2022	15/03/2023
6		DJOLEMPOUM	74	41	31	2	16	OUI	01/12/2022	20/03/2023
7		MALENE	50	37	13	0	13	OUI	02/12/2022	05/03/2023
8		BEDOUMO	77	62	15	0	18	OUI	03/12/2022	15/03/2023
9		MAYANG	39	30	9	0	12	OUI	02/12/2022	30/03/2023
11		AMPEL	37	19	14	4	9	OUI	08/12/2022	30/03/2023
12		MEDJOH	73	31	40	2	16	OUI	03/12/2022	30/03/2023
13		EDEN	86	54	30	2	14	OUI	04/12/2022	30/03/2023
14	DJAPOSTEN	TONKLA	12	9	3	0	4	OUI	04/12/2022	30/03/2023
15		DIOULA	83	71	9	3	8	OUI	04/12/2022	30/03/2023
16		NKOUL	68	54	14	0	13	OUI	04/12/2022	30/03/2023
TOTAL			**887**	**624**	**240**	**23**	**181**			

✓ **Activités dans la Commune d'ANGOSSAS**

L'activité dans la commune a été menée globalement dans 01 aire de santé sur les 05 que compte la commune. Ainsi 05 communautés ont été déclenchées pour un total de 433 personnes présentes, dont 211 hommes, 190 femmes et 32 enfants.

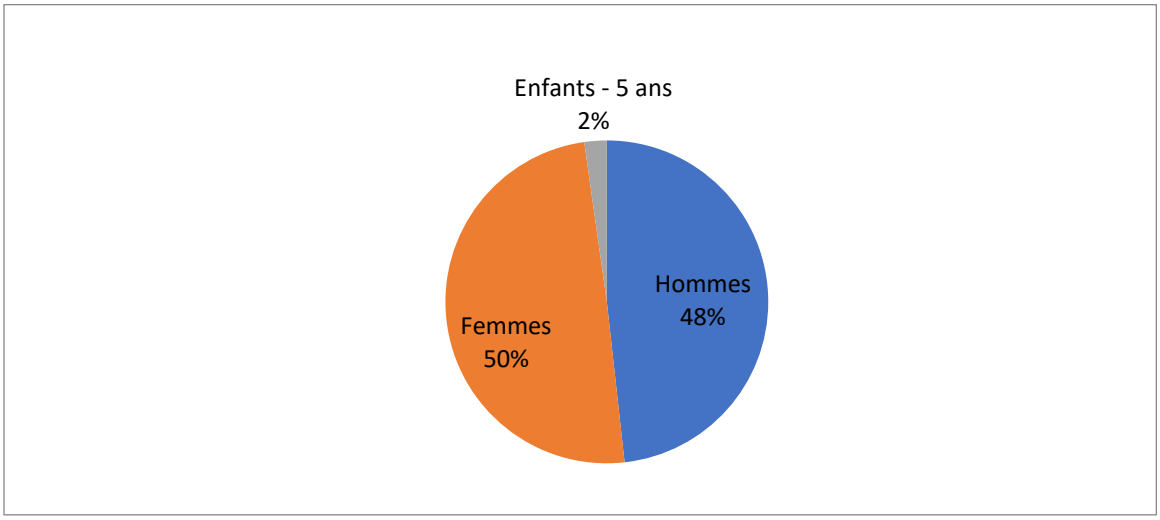

Graphique 31 *: Participation par genre lors des déclenchements dans la Commune d'ANGOSSAS*



Photo 54 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité de Nkek (Commune d'Angossas)*

- **COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA COMMUNE D'ANGOSSAS**

Tableau 38 : *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune d'ANGOSSAS*

District de santé : ANGOSSAS **Commune** : ANGOSSAS										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclenchement**	**Nombre d'hommes**	**Nombre de femmes**	**Nombre de jeunes/ enfants**	**Nombre de ménages**	**Engagement en termes de construction Oui/Non**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	ANGOSSAS	BAGOLOUL	96	52	42	02	25	OUI	01/11/2022	15/12/2022
2		DJIKOUNDJI	89	38	48	03	18	OUI	02/11/2022	09/12/2022
3		ABONIS	63	29	34	00	13	OUI	03/11/2022	19/12/2022
4		BAGBEZE 2	65	32	31	2	19	OUI	04/11/2022	14/12/2022
5		NKEK	120	60	35	25	53	OUI	01/10/2022	15/12/2022
TOTAL			**433**	**211**	**190**	**32**	**128**			

✓ COMMUNAUTES DECLENCHEES DANS LA REGION DE L'EST

Région de l'EST Cameroun										
Communes : ABONG-MBANG - MINDOUROU – ANGOSSAS										
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Population totale pendant le déclenchement**	**Nombre d'hommes**	**Nombre de femmes**	**Nombre de jeunes/ enfants**	**Nombre de ménages**	**Engagement en termes de construction Oui/Non**	**Date de déclenchement**	**Date prévisionnelle de la FDAL**
1	**ABONG MBANG SUD**	DJENASSOUME	45	22	23	0	12	OUI	17/11/2022	15/02/2023
2		ANZIE	33	17	12	4	7	OUI	17/11/2022	15/02/2023
3		ANKOAMBOM	33	24	9	0	9	OUI	24/11/2022	30/02/2023
4		ZOGUEMBOU	75	52	23	0	18	OUI	17/11/2022	15/02/2023
5		NKOUOLOU	60	39	21	0	24	OUI	18/11/2022	30/02/2023
6		OBOUL I	17	13	4	0	8	OUI	23/11/2022	05/03/2023
7		NTIMBE I	28	17	9	2	9	OUI	19/11/2022	30/02/2023
8	**ABONG MBANG OUEST**	ADOUMA	30	24	6	0	12	OUI	19/11/2022	30/02/2023
9		BAGOFIT	28	26	2	0	11	OUI	20/11/2022	30/02/2023
10		ANKOUNG	65	46	19	0	24	OUI	21/11/2022	30/02/2023
11		NKOUAL	33	26	7	0	16	OUI	21/11/2022	05/03/2023
12		NDJODJOCK	23	21	2	0	8	OUI	21/11/2022	05/03/2023
13		DJIBE	30	26	4	0	13	OUI	22/11/2022	05/03/2023
14		MAZABE	55	42	13	0	14	OUI	20/11/2022	30/03/2023
15	**ABONG MBANG EST**	OBOUL II	26	16	10	0	9	OUI	23/11/2022	05/03/2023
16		MPEMZOCK I	73	24	46	3	14	OUI	22/11/2022	05/03/2023

17		MPEMZOCK II	39	21	16	2	12	OUI	23/11/2022	05/03/2023
18		BAMAKO	35	18	15	2	7	OUI	19/11/2022	05/03/2023
19	**NKOUAK**	SOKAMALAM	36	26	10	0	11	OUI	22/11/2022	05/03/2023
20	**NKOUAK**	NKOUAK	70	62	8	0	13	OUI	30/11/2022	30/02/2023
21		NONGBWALA	36	28	8	0	9	OUI	05/12/2022	30/02/2023
22		DJOUYAYA	57	47	10	0	11	OUI	05/12/2022	30/02/2023
23		ETSIEK	83	52	21	10	14	OUI	01/12/2022	30/02/2023
24		KAGNOL	42	27	15	0	11	OUI	01/12/2022	15/03/2023
25		DJOLEMPOUM	74	41	31	2	16	OUI	01/12/2022	20/03/2023
26		MALENE	50	37	13	0	13	OUI	02/12/2022	05/03/2023
27		BEDOUMO	77	62	15	0	18	OUI	03/12/2022	15/03/2023
28		MAYANG	39	30	9	0	12	OUI	02/12/2022	30/03/2023
29		AMPEL	37	19	14	4	9	OUI	08/12/2022	30/03/2023
30		MEDJOH	73	31	40	2	16	OUI	03/12/2022	30/03/2023
31		EDEN	86	54	30	2	14	OUI	04/12/2022	30/03/2023
32	**DJAPOSTEN**	TONKLA	12	9	3	0	4	OUI	04/12/2022	30/03/2023
33		DIOULA	83	71	9	3	8	OUI	04/12/2022	30/03/2023
34		NKOUL	68	54	14	0	13	OUI	04/12/2022	30/03/2023
35	**ANGOSSAS**	BAGOLOUL	96	52	42	2	25	OUI	01/11/2022	15/12/2022
36		DJIKOUNDJI	89	38	48	3	18	OUI	02/11/2022	09/12/2022
37		ABONIS	63	29	34	0	13	OUI	03/11/2022	19/12/2022
38		BAGBEZÉ 2	65	32	31	2	19	OUI	04/11/2022	14/12/2022
39		NKEK	120	60	35	25	53	OUI	01/10/2022	15/12/2022
			2084	**1335**	**681**	**68**	**547**			

2.5.8 La mise en place des CLS et des plans d'action communautaire

Pour la réussite de ces activités, AAEDC a d'abord dans la mise en œuvre de l'ATPC, suscité chez les populations bénéficiaires la méthode participative et le bénévolat. Ceci amena chaque personne à se présenter comme candidat au poste de CLS ou à la communauté de le désigner sans difficulté. Ainsi les CLS assureront suivi des plans d'action communautaires.

La plupart de ces comités sont formés de trois (03) personnes dont deux (02) hommes et d'une femme. Bien que la place de la femme dans la prise des décisions dans ces zones reste encore combattre, AAEDC par l'approche ATPC, a sensibilisé les populations afin d'approuver la présence d'une femme dans ces comités.

Les activités des CLS porteront essentiellement sur l'effectivité des décisions prises par les populations lors du déclenchement. Les participants sont édifiés sur le travail qui est le leur et l'intérêt de la tâche noble qu'est celle du CLS malgré le sacrifice énorme. En définitive, les CLS témoignent de leur volonté dans les engagements qu'ils prennent lors de l'élaboration du plan d'action général qui interpelle la participation de chaque comité. La remarque est la volonté unanime et partagée par tous qui s'exprime généralement par des acclamations.

Après la mise en place des CLS, il a été simplement demandé à chaque communauté de mettre en place son plan communautaire d'action. C'est ainsi que chaque communauté présenta sommairement ce qu'il a programmé de faire juste après les déclenchements. La plupart des plans d'action ressortait clairement qu'il fallait tous mettre en œuvre pour creuser avant l'arrivée des grandes pluies, tout en concentrant un peu de leurs temps aux travaux champêtres et aux marchés périodiques qui sont nécessaires pour la survie des familles.

2.6 Le suivi des plans d'action communautaire

2.6.1 Contexte de la mission

La mission de l'AAEDC se décline en plusieurs étapes dont le suivi post déclenchement. Après le déclenchement, les communautés prennent des mesures appropriées à travers la mise en œuvre d'un plan d'action, puis la construction de latrines pour tous les membres de la communauté. Différentes actions sont menées pour entretenir les dynamiques communautaires créées après le déclenchement de l'ATPC. Des visites régulières sont ainsi effectuées afin d'assister les communautés dans la mise en œuvre de leur plan d'action.

C'est dans ce contexte que s'inscrira la mission de l'ONG pour la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté dans 200 villages/communautés des régions de l'Adamaoua et de l'Est.

2.6.2 L’objectif principal

L’objectif visé par la présente phase d’activité consiste à mesurer et à harmoniser l’état d’avancement de la construction des latrines dans les communautés.

Ce présent rapport fera l’objet du suivi des 214 communautés déclenchées dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est bénéficiaires de la stratégie d'ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC).

2.6.3 Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, il s’agit de :

- Organiser et faire le suivi des plans d’action communautaire en mettant à contribution les leaders communautaires et les leaders naturels ;
- Organiser la mise en œuvre du suivi des plans d’action communautaire ;

2.6.4 Résultat attendu de l’activité

Le résultat attendu est le suivant :

- Les ménages des 214 villages/communautés déclenchés ont changé de comportement.

2.6.5 La méthodologie de travail

Le suivi post déclenchement est une étape fondamentale dans la mise en œuvre de l’ATPC, en ce sens qu’il permet de réaliser les engagements pris par les communautés à l’issue du déclenchement. Pour que le suivi soit efficace, il faut au moins une visite par semaine dans chaque village déclenché. Cette fréquence peut être doublée voire triplée pour les villages n’ayant pas affiché une ferme détermination à mettre fin à la DAL à l’issue du déclenchement. Pour ces types de villages, la stratégie de suivi doit être davantage affinée et l’animateur responsable de la zone pourrait passer au moins une nuit par semaine dans le village jusqu’à ce que tous les ménages du village construisent leurs latrines. La méthodologie de l’activité axée sur :

a. Le Renforcement des capacités des comités locaux de suivi de l’ATPC

Des séances de renforcement des capacités ont été organisées dans chaque localité avec les CLS. Ces séances se sont basées sur le guide de mise en œuvre de l’ATPC au Cameroun. L’accent a été mis au cours de ces séances sur les outils de suivi des plans d’action tel que le cahier de suivi.

b. L’organisation de la mise en œuvre du suivi post déclenchement

Ceci se caractérise par les visites à domiciles ainsi que le suivi de construction des latrines. Cette activité doit être menée par les animateurs, CLS, les agents communaux, les sectoriels (MINEE et MINSANTE).

Chaque acteur joue un rôle très important dans le changement de comportement des communautés. Cela commence par les CLS qui jouent le rôle d'interface entre les communautés et les autres acteurs. Il est chargé du suivi des activités au niveau du village.

Les municipalités occupent une place de choix pour la pérennisation des acquis de l'ATPC, car ils ont la charge de promouvoir le développement au niveau local.

Le suivi de terrain doit être des occasions d'échanges avec les communautés pour briser les réticences quant à l'abandon des normes sociales traditionnelles inappropriées.

c. L'apport d'un appui technique aux CLS

Les techniques utilisées sont notamment les visites dans les villages et dans les ménages, les techniques de collecte de données et les techniques de coaching pour amener les communautés à réaliser ce qu'elles-mêmes ont décidé. Ces techniques sont basées sur un style de communication non interventionniste et participatif qui se fait à travers des questionnements entre le facilitateur et les comités villageois de suivi en vue de la mise en œuvre efficiente du plan d'action. Ces échanges permettent aux communautés de renouveler leurs engagements pour l'atteinte de l'état FDAL.

d. Consolidation des données de suivi

Nous avons opté par l'organisation des focus groupe et le suivi par le porte à porte des ménages. Pour les localités qui trainent encore dans les constructions, la stratégie adoptée était de faire au moins un passage par semaine.

2.6.6 Activités menées

2.6.6.1 Le renforcement des capacités des CLS

Le renforcement des capacités des CLS est primordial pour la maitrise du processus des plans d'actions communautaires et le suivi des constructions des latrines par les communautés. C'est ainsi que chaque CLS a été doter d'un registre ou cahier de suivi.

2.6.6.2 Le suivi des plans d'action communautaire dans les Régions de l'Adamaoua et de l'Est

Le suivi post déclenchement est une étape importante pour la consolidation des acquis et la vérification de mise en œuvre effective des engagements pris par les communautés lors des phases des déclenchements.

L'ATPC a été mise en œuvre dans les départements de Mayo Banyo, Djerem et Abong Mbang. Pour les villages de grande taille, il a été adopté la même stratégie de suivi pour que le délai moyen de trois mois entre le déclenchement et l'atteinte du statut FDAL soit respecté

La méthodologie a été basée sur les visites à domicile (VAD) et le remplissage des outils de collecte.

2.6.6.2.1 Le suivi post-déclenchement dans le département du DJEREM

Compte tenu du contexte de la zone du projet (distance entre les localités et insécurité), l'ONG a d'abord opté pour un travail d'équipe concernant le déclenchement. Chaque équipe était composée de 02 facilitateurs accompagnés soit du superviseur ou de l'agent communal d'hygiène.

Des sensibilisations sur certains thèmes tels que la potabilisation de l'eau à domicile, le lavage des mains, l'hygiène environnementale et corporelle et le choléra ont été abordés.

L'organisation des focus groupe avec les bénéficiaires pour avoir un aperçu général de la situation de l'avancée des constructions et de l'implication des communautés ainsi que des CLS dans le déroulement de l'activité. Une revue du remplissage des cahiers avec les CLS est effectuée pour apprécier leurs compréhensions des différents cahiers et aussi la tenue/remplissage de ces cahiers. Enfin le porte à porte pour la vérification effective de l'engagement des ménages dans la construction de sa latrine.

Un regard sur la situation des points d'eau et l'existence des comités de gestion des points d'eau ainsi que leurs fonctionnements a été aussi fait.

a. Principal résultat attendu au cours de cette période

Le principal résultat attendu au cours de cette période est :

- Toutes les localités déclenchées à l'ATPC sont suivi.

b. Activités menées

Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:

- Le suivi des plans d'action ;
- Les visites à domicile et la collecte des données ;
- La sensibilisation des communautés sur les bonnes pratiques Wash.

Les activités se sont tenues simultanément dans chaque commune. L'implication des populations dans toutes les étapes du suivi telles que :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance ;
- La conduite des visites à domiciles ;
- La construction des latrines ;
- Les séances de sensibilisation.

c. Activités dans la Commune de TIBATI

L'activité dans cette commune a été menée globalement dans 09 aires de santé sur les 15 que compte le DS de TIBATI. 48 communautés ont été suivi dans cette commune;

Le suivi a permis de toucher 3 146 ménages pour un résultat de 805 nouvelles latrines et 1 415 latrines réhabilités. 37 ménages sans latrines et 58 autres latrines en cours de construction, ainsi 97 % de ménages possédant de latrines pour 46 localités sur les 48 suivies avec un statut FDAL.





Photo 55 et 56*: Visite d'une latrine avec un CLS dans la localité de Dan Haoussa (Commune de Tibati)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE DE TIBATI**


Tableau 39 ***:*** *Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune de TIBATI*

District de santé : TIBATI
Commune : TIBATI

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants	Observations
1	MEIDJAMBA	DAN HAOUSSA	47	OUI	15/09/2022	27	14	17	01	00	30	FDAL
2		MEIDJAMBA I	98	OUI	15/09/2022	96	17	43	01	00	23	FDAL
3		GONGONTOUA	63	OUI	19/09/2022	49	22	23	00	00	60	FDAL
4		NYADJIDA	32	OUI	19/09/2022	15	17	08	01	00	18	FDAL
5		SOLA	22	OUI	22/09/2022	12	10	07	00	00	19	FDAL
6		MBITOM C	46	OUI	22/09/2022	30	19	11	00	00	47	FDAL
7		MANGLE	21	OUI	11/10/2023	12	10	06	00	00	19	FDAL
8		MEIDJAMBA 2	96	OUI	05/11/2022	92	08	53	00	00	45	FDAL
9	MBAKAOU	GANTANG	58	OUI	21/09/2022	47	17	31	00	00	26	FDAL
11		NDATAL	40	OUI	26/09/2022	21	16	10	01	00	15	FDAL
13		CARRIERE	13	OUI	26/09/2022	10	02	06	00	00	04	FDAL
14	LIBOUM	LIBOUM	28	OUI	20/09/2022	12	09	07	01	01	92	FDAL
15		SAXON	92	OUI	20/09/2022	63	40	28	10	11	30	DAL
16		SISSIMI	69	OUI	21/09/2022	59	22	30	01	00	29	FDAL
17		BONINTING	46	OUI	21/09/2022	38	10	27	02	08	50	FDAL
18	NGAOUBELA	GAOUBELA I	95	OUI	27/09/2022	79	25	43	00	00	123	FDAL
19		GAOUBELA II	211	OUI	27/09/2022	170	30	100	04	01	157	FDAL
20		MENG	222	OUI	27/09/2022	185	25	97	00	00	86	FDAL
21		MALARBA II A	73	OUI	29/09/2022	59	14	32	02	01	56	FDAL
22		MALARBA II B	80	OUI	28/09/2022	93	04	60	02	00	49	FDAL
23		MALARABA II C	51	OUI	28/09/2022	38	26	25	06	00	56	FDAL
24		MACOUP	58	OUI	05/10/2022	32	36	27	00	00	36	FDAL
25		MAHOR	36	OUI	05/10/2022	22	11	10	02	00	21	FDAL

26		TICHE I (DJALINGO)	36	OUI	05/10/2022	22	12	16	04	00	81	FDAL
27		BANTAI I	102	OUI	24/10/2022	76	33	39	00	00	56	FDAL
28		BANTAI II	69	OUI	24/10/2022	40	29	19	00	00	67	FDAL
29		ALHAMISSA	112	OUI	24/10/2022	85	37	33	01	00	23	FDAL
30	NGATT	KANDJE	49	OUI	04/10/2022	21	13	21	01	00	30	FDAL
31		NGATT I	132	OUI	04/10/2022	120	18	79	00	00	62	FDAL
32		NGATT II	120	OUI	04/10/2022	114	26	97	00	00	96	FDAL
33		DJAORO GARGA	132	OUI	03/10/2022	120	19	83	00	00	20	FDAL
34		WANDJOCK	35	OUI	03/10/2022	20	07	13	00	00	62	FDAL
35		ARDO PALANGUEL	117	OUI	03/10/2022	71	26	34	04	00	25	FDAL
36	TONGO	DABER I	62	OUI	12/10/2022	49	13	24	00	00	29	FDAL
37		DABER II	50	OUI	12/10/2022	42	10	37	00	00	19	FDAL
38	ALLAT MEGAT	SALASSA	42	OUI	13/10/2022	33	11	21	00	00	36	FDAL
39	DJOMBI	HOSSERE KOBA	62	OUI	18/10/2022	32	12	19	05	10	45	DAL
40		BANANA	52	OUI	18/10/2022	31	14	21	02	05	25	FDAL
41		DJOMBI II A	29	OUI	19/10/2022	13	16	06	00	00	32	FDAL
42		DJOMBI II B	36	OUI	19/11/2922	18	18	11	01	00	26	FDAL
43		DJOMBI I A	45	OUI	20/10/2022	36	19	18	00	00	33	FDAL
44		DJOMBI I B	62	OUI	20/10/2022	34	30	18	01	00	41	FDAL
45		MAFO I	58	OUI	26/10/2022	56	07	29	00	00	37	FDAL
46		MAFO II	59	OUI	26/10/2022	52	09	33	00	00	32	FDAL
47	TIBATI	MAKANDAO I	42	OUI	27/10/2022	37	12	21	03	00	24	FDAL
48		MAKANDAO II	46	OUI	27/10/2022	36	16	22	02	00	16	FDAL
	09	**48**	**3146**			**2419**	**811**	**1415**	**58**	**37**	**2008**	

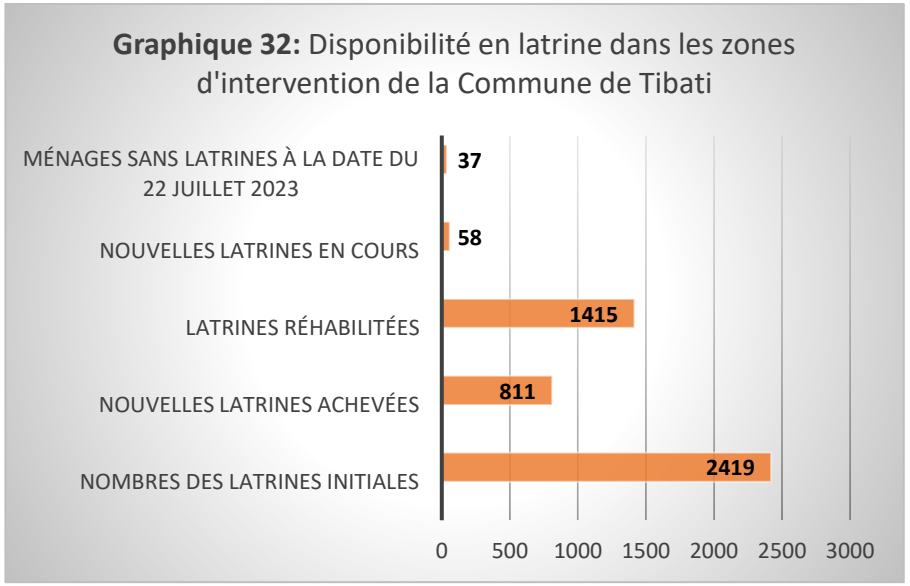

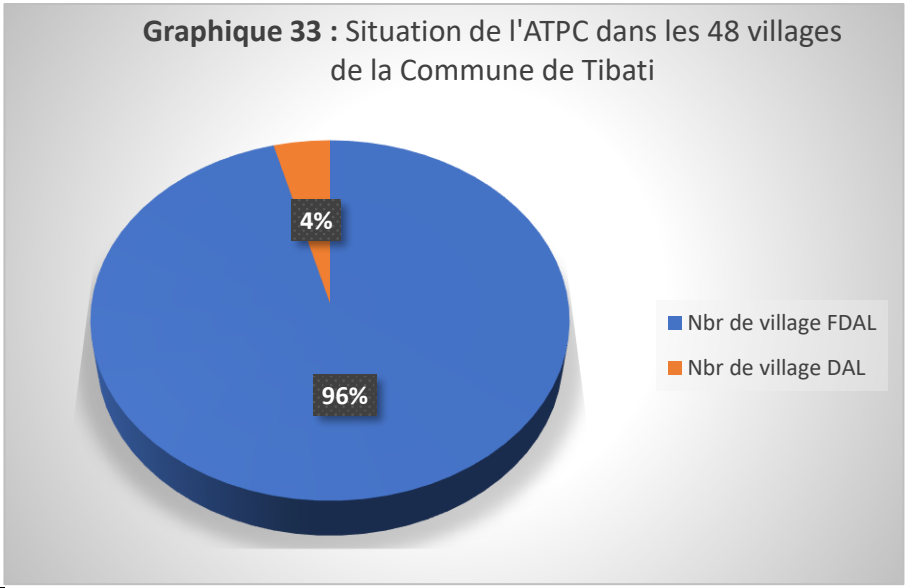

- **SITUATION DES POINTS D'EAU DANS LA COMMUNES DE TIBATI**

Tableau 40 *: Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Commune de TIBATI*

N°	Villages	Nbe. De forages dans les localités		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	DANHAOUSSA	0	1	NON			
2	MEIDJAMBA	2	3	NON			
3	GONGONTOUA	1	1	NON			
4	NYADJIDA	0	1	NON			
5	SOLA	1	1	NON			
6	MBITOMC	2	1	NON			
7	MANGLE	O	1	NON			
8	GANTANG	0	0	NON			

9	DJAORO KOMBO			NON			
10	NDATAL	0	01	NON			
11	CARRIERE	0	0	NON			
12	LIBOUM	2	0	NON			
13	SAXON	1	0	NON			
14	SISSIMI	0	0	NON			
15	BONINTING	1	1	OUI	NON	NON	
16	GAOUBELA	1	2	OUI	OUI	OUI	ADDRA
17	MENG	0	2	NON			
18	MALARBAII	1	1	OUI	OUI	OUI	ADDRA
19	MACOUP	1	0	OUI	OUI	OUI	ADDRA
20	MAHOR	1	0	NON			
21	TICHE I (DJALINGO)	1	0	NON			
22	BANTA II	0	4	OUI,1COGES	OUI	OUI	ADDRA
23	ALHAMISSA	1	0	NON			
24	KANDJE	2	0	OUI	OUI	OUI	ADDRA
25	NGATT	2	0	OUI	OUI	OUI	ADDRA
26	DJAOROGARGA	1	0	NON			
27	WANDJOCK	1	1	OUI	OUI	OUI	ADDRA
28	ARDO PALANGUEL	0	0	NON			
29	DABER	1	1	OUI	OUI	OUI	
30	SALASSA	0	0	NON			
31	HOSSEREKOBA	1	1	NON			
32	BANANA	1	0	NON			
33	DJOMBI	1	3	NON			
34	MAFO	1	1	NON			
35	MAKANDAO	1	0	OUI	OUI	OUI	ADDRA
		28	27				

d. Activités dans la Commune de NGAOUNDAL

Il sera noté que les 30 localités déclenchées dans les 06 aires de santé ont été complètement couvertes lors de cette activité.

Le suivi a permis de toucher 1 501 ménages pour un résultat de 395 nouvelles latrines et 946 latrines réhabilités. 29 ménages sans latrines et 13 autres latrines en cours de construction, ainsi 97 % de ménages possédant de latrines pour 28 localités sur les 30 suivies avec un statut FDAL.



Photo 58 *: Visite d'un ménage dans la Commune de Ngaoundal*



Photo 59 et 60 *: Visite des latrines dans les localités de Djoundé (Commune de Ngaoundal)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE DE NGOUNDAL**

Tableau 41*: Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune de NGAOUNDAL*


District de santé : NGAOUNDAL **Commune** : NGAOUNDAL												
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Nbre de ménage/ Concession**	**Engagement de construction de latrines**	**Date Déclenchement**	**Nombres des latrines initiales**	**Nouvelles latrines achevées**	**Latrines réhabilitées**	**Nouvelles latrines en cours**	**Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023**	**Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants**	**Observations**
1	**NGAOUNDAL CATHOLIQUE**	NOGBAYA	20	OUI	03/11/2022	14	08	08	00	00	09	FDAL
2		MBARNANG BAYA	41	OUI	03/11/2022	37	06	21	00	00	01	FDAL
3		GALAGALA	28	OUI	03/11/2022	27	12	11	00	00	25	FDAL
4		MBARNANG FOULBE	27	OUI	25/11/2022	17	11	10	00	00	07	FDAL
5	**DJOUNDE**	DJOUNDE TIGO	57	OUI	04/11/2022	61	11	36	02	00	17	FDAL
6		DJOUNDE CENTRE I	39	OUI	04/11/2022	40	09	28	00	00	35	FDAL
7		DJOUNDE CENTRE II	27	OUI	04/11/2022	31	12	17	01	00	14	FDAL
8		DJOUNDE NDOKO	168	OUI	01/11/2022	197	50	88	02	00	16	FDAL
9		KASSA MBERE	28	OUI	05/11/2022	26	10	19	01	00	14	FDAL
10	**DANFILI**	DANFILI BLOC5 I	42	OUI	08/11/2022	45	11	30	00	00	15	FDAL
11		DANFILI BLOC4 II	59	OUI	08/11/2022	75	16	48	00	00	07	FDAL
12		DANFILI BLOC5 I	52	OUI	08/11/2022	73	11	47	00	00	10	FDAL
13		DANFILI BLOC5 II	51	OUI	09/11/2022	65	01	55	00	00	16	FDAL
14		GONMANA	62	OUI	09/11/2022	74	18	40	01	00	37	FDAL
15	**BETARA CONGO**	BELLA FOKOU	68	OUI	11/11/2022	47	17	23	02	00	18	FDAL
16		BETARA CONGO	75	OUI	11/11/2022	51	13	23	03	06	19	DAL
17		FEBADI I	67	OUI	12/11/2022	53	21	33	00	00	30	FDAL
18		FEBADI II	44	OUI	16/11/2022	34	22	25	00	00	01	FDAL
19		MBANDOUA	19	OUI	17/11/2022	15	07	09	00	00	02	FDAL
20		MAZOUING	112	OUI	17/11/2022	118	20	77	00	23	04	DAL

21		KASSA 1	27	OUI	17/11/2022	29	09	20	00	00	01	FDAL
22		KASSA II	23	OUI	17/11/2022	20	05	17	00	00	06	FDAL
23		KASSA III	19	OUI	17/11/2022	20	03	17	00	00	04	FDAL
24		NGALBIZE I	81	OUI	15/11/2022	67	18	50	00	00	08	FDAL
25	**CMA**	NGALBIZE II	45	OUI	16/11/2022	75	02	30	00	00	04	FDAL
26	**NGAOUNDAL**	MASSIF PLATEAU	29	OUI	21/11/2022	25	12	14	01	00	05	FDAL
27		BOULAMA PANGAR II	15	OUI	23/11/2022	18	04	12	00	00	09	FDAL
28		MBIWOROU	49	OUI	23/11/2022	52	29	31	00	00	04	FDAL
29	**BEKA GOTTO**	MBAMIYANGA I	80	OUI	23/11/2022	80	13	58	00	00	9	FDAL
30		MBAMIYANGA II	47	OUI	23/11/2022	78	14	49	00	00	4	FDAL
	06	**30**	**1 501**			**1564**	**395**	**946**	**13**	**29**	**351**	

Graphique N° 38 : Disponibilité en latrine dans les zones d'intervention de la Commune de Ngaoundal

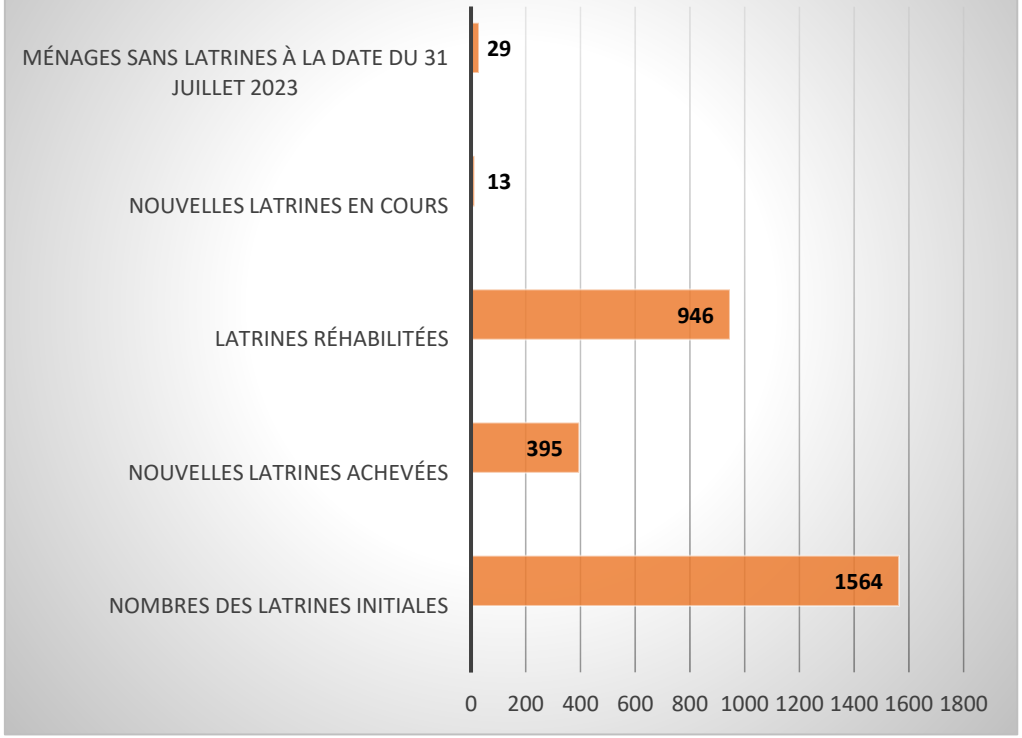

Graphique N° 35 : Situation de l'ATPC dans les 30 villages de la Commune de Ngaoundal

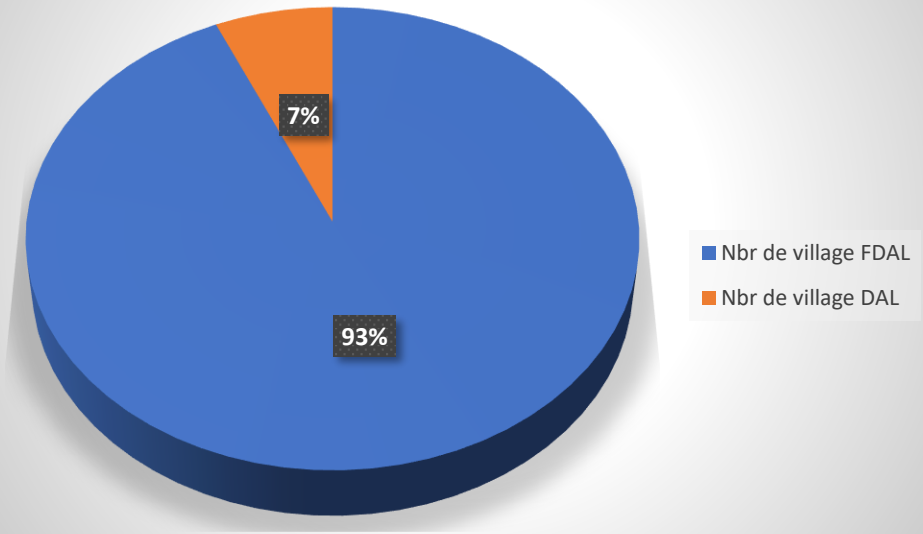

- **SITUATION DES POINTS D'EAU DANS LA COMMUNES DE NGAOUNDAL**

Tableau 42 : *Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Commune de NGAOUNDAL*

N°	Villages	Nbe. De forages dans les localités		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	NOGBAYA	00	00				
2	MBARNANG BAYA	00	00				
3	GALA GALA	00	00				
4	MBARNANG FOULBE	01	00	OUI	OUI	NON	
5	DJOUNDE TIGO	01	00	OUI	OUI	NON	
6	DJOUNDE CCENTRE I	00	01	OUI	NON	NON	
7	DJOUNDE CENTRE II	01	02	OUI	OUI	NON	
8	DJOUNDE NDOKO	00	00				
9	KASSA MBERE	01	00	NON			
10	DANFILI BLOC5 I	00	00				
11	DANFILI BLOC4 II	00	00				
12	DANFILI BLOC5 I	00	00				
13	DANFILI BLOC5 II	00	00				
14	GONMANA	01	01	OUI	OUI	NON	
15	BELLA FOKOU	01	01	NON			
16	BETARA CONGO	03	01	OUI	OUI	NON	
17	FEBADI I	01	02	OUI	OUI	NON	
18	FEBADI II	01	02	OUI	OUI	NON	
19	MBANDOUA	00	00				
20	MAZOUIN	01	00	OUI	OUI	NON	
21	KASSA I	01	00	OUI	OUI	NON	
22	KASSA II	00	00				
23	KASSA III	00	00				
24	NGALBIZE I	00	01				
25	NGALBIZE II	00	00				
26	MASSIF PLATEAU	01	00	OUI	OUI	NON	
27	BOULAMA PANGAR I	02	00	OUI	01	NON	
28	MBIWOROU	01	00	NON			
29	MBAMIYANGA I	01	01	OUI	OUI	NON	
30	MBAMIYANGA II	01	00	OUI	OUI	NON	
		19	12				

2.6.6.2.2 Le suivi post-déclenchement dans le département du MAYO BANYO

Compte tenu du contexte de la zone du projet (distance entre les localités et insécurité), l'ONG a d'abord opté pour un travail d'équipe concernant le déclenchement. Chaque équipe était composée de 02 facilitateurs accompagnés soit du superviseur ou de l'agent communal d'hygiène.

Des sensibilisations sur certains thèmes tels que la potabilisation de l'eau à domicile, le lavage des mains, l'hygiène environnementale et corporelle et le choléra ont été abordés.

Un regard sur la situation des points d'eau et l'existence des comités de gestion des points d'eau ainsi que leurs fonctionnements a été aussi fait.

a. Activités dans la Commune de BANYO

L'activité dans la commune de Banyo a été menée globalement dans 07 aires de santé sur les 11 que compte la commune de Banyo. Ainsi les plans d'action des 38 communautés déclenchées ont été suivis.

Le suivi a permis de toucher 2 848 ménages pour un résultat de 478 nouvelles latrines et 1 510 latrines réhabilités. 12 ménages ne possédant pas de latrines et 09 autres latrines en cours de construction et 15, ainsi 99 % de ménages possédant de latrines pour 37 localités sur les 38 suivies avec un statut FDAL.



Photo 61 *: Sensibilisation dans la localité de Mbassewa (Commune de Banyo)*



Photo 62 et 63 : *Visite des latrines dans les localités Bon marché et Bariki (Commune de Banyo)*

- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE DE BANYO**


Tableau 43 *: Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune de BANYO*

- **District de santé** : BANYO
- **Commune** : BANYO


N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants	Observations
1	**ALLAT**	NYAWA KATARKO I	60	OUI	24/09/2022	82	09	53	00	00	16	FDAL
2		NYAWA KATARKO II	41	OUI	24/09/2022	50	07	25	00	00	11	FDAL
3		NGUM KATARKO	45	OUI	24/09/2022	92	03	42	00	00	38	FDAL
4		TOUKOURWA	37	OUI	23/09/2022	38	05	27	00	00	12	FDAL
5		MAYO-DJANTANG	28	OUI	01/10/2022	44	06	21	00	00	04	FDAL
6		BENGUEDJI WAWA I	110	OUI	04/10/2022	127	20	58	00	00	20	FDAL
7		BENGUEDJI WAWA II	69	OUI	04/10/2022	80	13	40	00	00	17	FDAL
8		ALARBA BANDA	25	OUI	04/10/2022	18	10	17	00	00	06	FDAL
9		SANGUERE DJAORO ABBO	27	OUI	05/10/2022	31	04	20	00	00	06	FDAL
10		MAYO BOUTALI	87	OUI	05/10/2022	92	10	30	00	00	34	FDAL
11		BON MARCHE	21	OUI	05/10/2022	19	09	11	00	00	07	FDAL
12		NGUM GASSIRI	58	OUI	25/11/2022	72	06	27	00	00	16	FDAL
13		MAYO BADJI	33	OUI	24/11/2022	29	12	10	00	00	21	FDAL
14	**SAMBO LABO**	MBAMTI-DJOUMBARE I	70	OUI	14/10/2022	97	26	33	00	00	49	FDAL
15		MBAMTI-DJOUMBERE II	97	OUI	14/10/2022	124	20	54	00	00	27	FDAL
16		MBAH	97	OUI	17/10/2022	103	13	66	00	00	16	FDAL
17	**BANYO-FADA**	MAYO-FOROU LAISSE	96	OUI	12/10/2022	121	30	65	00	00	29	FDAL
18		OURO-GORDI	54	OUI	12/10/2022	70	11	40	00	00	19	FDAL
19		MAYO FOROU DO	19	OUI	20/10/2022	23	02	11	00	00	10	FDAL
20		MAYO-BANYO BARIKI A	48	OUI	17/10/2022	80	14	30	00	00	09	FDAL

21		MAYO-BANYO BARIKI B	39	OUI	17/10/2022	51	08	16	00	00	06	FDAL
22	**NDI WAWA**	GASSOL TAPAWA	50	OUI	18/10/2022	66	27	10	00	00	36	FDAL
23		MBASSEWA	142	OUI	24/11/2022	144	26	97	00	00	24	FDAL
24		OUMYARI A	119	OUI	24/10/2022	109	13	97	00	00	14	FDAL
25		OUMYARI B	43	OUI	24/10/2022	47	13	33	00	00	09	FDAL
26		BOUDJOUNKOURA A	62	OUI	26/10/2022	109	13	77	00	00	10	FDAL
27		BOUDJOUNKOURA B	75	OUI	26/10/2022	78	10	42	00	00	06	FDAL
28	**BANYO-TICKET**	GAOULA ILLANGA	102	OUI	18/10/2022	144	17	79	09	12	12	DAL
29		BENKE	13	OUI	18/10/2022	21	13	10	00	00	05	FDAL
30		TARAM KATARKO	105	OUI	21/09/2022	163	09	76	00	00	38	FDAL
31		MBOUBOU	39	OUI	26/09/2022	47	16	21	00	00	17	FDAL
32		TARAM SIRI	62	OUI	26/09/2022	88	15	43	00	00	62	FDAL
33		NYATI RANCH	45	OUI	25/11/2022	58	14	39	00	00	10	FDAL
34	**MBAMTI KATARKO**	LABARE BAYA	57	OUI	27/10/2022	70	02	48	00	00	14	FDAL
35		LABARE SEINI	30	OUI	27/10/2022	47	15	22	00	00	11	FDAL
36	**TARAM-YABAM**	TARAM-YABAM	24	OUI	01/10/2022	41	04	32	00	00	10	FDAL
37		BANTAY (TARAM)	112	OUI	02/10/2022	141	27	72	00	00	63	FDAL
38		TARAM-BADJAM	21	OUI	01/10/2022	32	06	16	00	00	04	FDAL
	07	**38**	**2262**			**2848**	**478**	**1510**	**9**	**12**	**718**	

Graphique N° 36 : Disponibilité en latrine dans les zones d'intervention de la Commune de Banyo

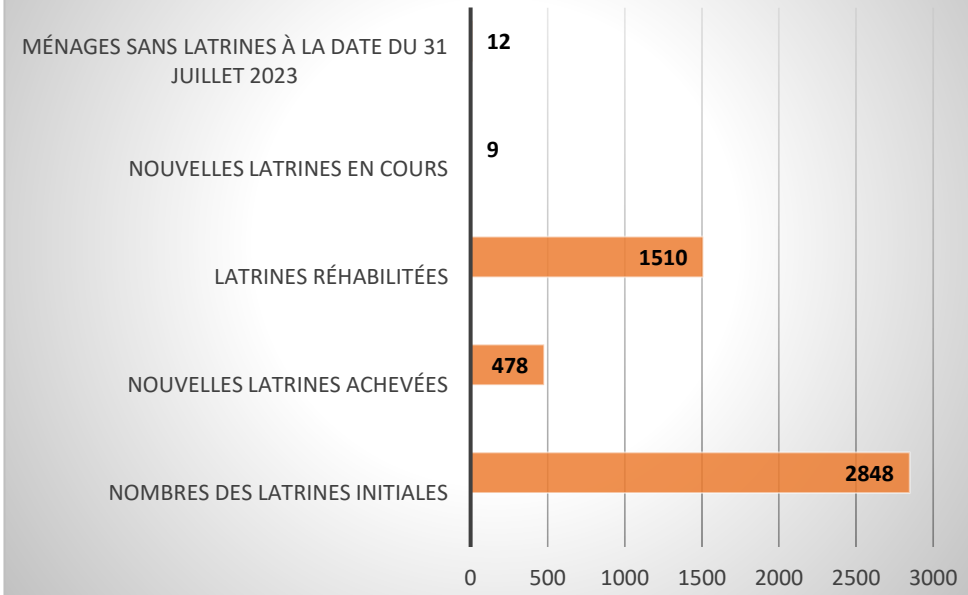

Graphique N° 37 : Situation de l'ATPC dans les 38 villages de la Commune de Banyo

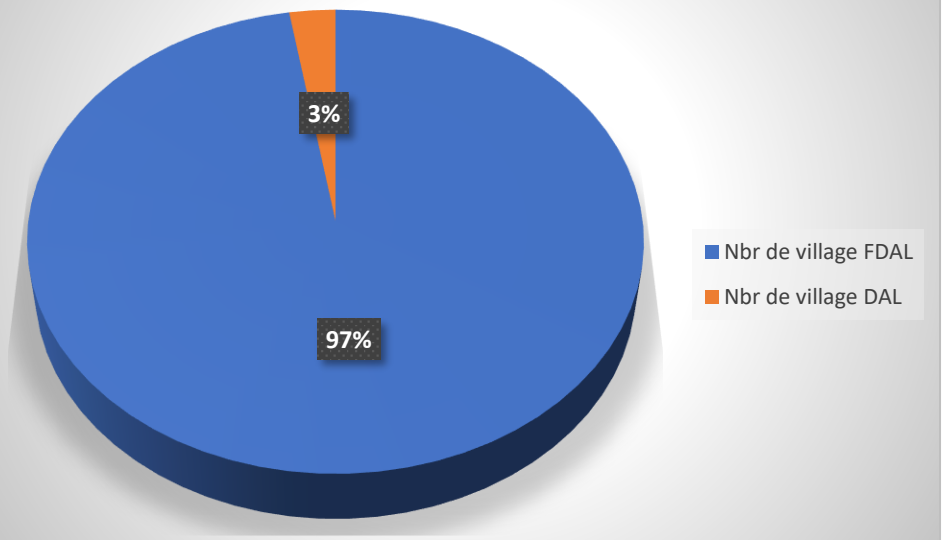

- **SITUATION DES POINTS D'EAU DANS LA COMMUNES DE BANYO**

Tableau 44 *: Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Commune de BANYO*

N°	Villages	Nbe. De forages dans les localités		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	NYAWA KATARKO I	01	01	NON			
2	NGUM KATARKO	0	01	NON			
3	TOUKOURWA	1	0	OUI	NON	NON	
4	MAYO-DJANTANG	0	0				
5	BENGUEDJI WAWA I	01	01	NON			
6	ALARBA BANDA	0	0				
7	SANGUERE DJAORO ABBO	0	0				
8	MAYO BOUTALI	0	01	NON			
9	BON MARCHE	0	0				
10	NGUM GASSIRI	0	01	OUI	NON		
11	MAYO BADJI	0	0				
12	MBAMTI-DJOUMBARE I	0	1	OUI	NON		
13	MBAMTI-DJOUMBERE II	0	1	OUI	NON		
14	MBAH	1	0	NON			
15	MAYO-FOROU LAISSE	1	0	NON			
16	OURO-GORDI	0	0				
17	MAYO FOROU DO	0	0				
18	MAYO-BANYO BARIKI A	0	0				
19	MAYO-BANYO BARIKI B	0	0				

20	YOUKSA TAPAWA	0	0				
21	MBASSEWA	0	1	NON			
22	OUMYARI A	0	2	NON			
23	OUMYARI B	1	1	OUI	OUI	NON	
24	BOUDJOUNKOURA A	1	0	NON			
25	ILLANGA	0	0				
26	BENKE	0	0				
27	TARAM KATARKO	Un château d'eau avec abreuvoir en construction par PRODEL	1	NON			
28	MBOUBOU	0	0				
29	TARAM SIRI	Un château d'eau avec abreuvoir	1				
30	NYATI RANCH	0	0				
31	LABARE BAYA	1	0	NON			
32	LABARE SEINI	2	0	OUI	OUI	NON	
33	TARAM-YABAM	1	1	OUI	NON		
34	BANTAY	0	1	OUI	NON		
35	TARAM-BADJAM	01	0	OUI	NON		
		14	15				

b. Activités dans la Commune de BANKIM

L'activité dans la commune de Bankim a été menée globalement dans 10 aires de santé sur les 14 que compte la commune de Bankim. Ainsi les plans d'action des 48 communautés déclenchées ont été suivis.

Le suivi a permis de toucher 2 498 ménages pour un résultat de 389 nouvelles latrines et 1 212 latrines réhabilités. 178 ménages sans latrines et 87 autres latrines en cours de construction, ainsi 97% de ménages possédant de latrines pour 34 localités sur les 48 suivies avec un statut FDAL.



Photo 65 *: Sensibilisation dans la localité de Mbetock (Commune de Bankim)*






<u>Photo 66 et 67</u> : *Visite des latrines dans la localité de Yimberé (Commune de Bankim)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE DE BANKIM**

Tableau 45 *: Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune de BANKIM*

District de santé : BANKIM **Commune** : BANKIM												
N°	**Aire de santé**	**Villages**	**Nbre de ménage/ Concession**	**Engagement en termes de construction de latrines**	**Date Déclenchement**	**Nombres des latrines initiales**	**Nouvelles latrines achevées**	**Latrines réhabilitées**	**Nouvelles latrines en cours**	**Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023**	**Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants**	**Observations**
1	**NGATTI**	NYAKONG MAPE	47	OUI	04/11/2022	19	10	09	04	00	17	FDAL
2		MBADJI I	39	OUI	04/11/2022	26	02	20	01	10	29	DAL
3		MBADJI II	31	OUI	04/11/2022	10	11	19	01	00	18	FDAL
4		MBOUNGAM FIDELE	60	OUI	05/11/2022	49	12	13	02	00	97	FDAL
5		MBAMBOUAH	40	OUI	05/11/2022	29	03	10	01	11	100	DAL
6		GLORY	75	OUI	05/11/2022	50	23	32	02	00	27	FDAL
7		MBEUTOCK	23	OUI	05/11/2022	17	04	11	03	00	29	FDAL
8		MIBELONG	81	OUI	13/11/2022	69	03	49	02	10	28	DAL
9		NGATTI	93	OUI	17/11/2022	69	10	28	06	14	19	DAL
10	**BANKIM RURAL**	CITE MAPE I	50	OUI	07/11/2022	36	06	30	00	14	19	DAL
11		CITE MAPE II	39	OUI	07/11/2022	28	07	17	02	00	42	FDAL
12		MBOUGAM CARREFOUR	48	OUI	07/11/2022	30	02	18	00	16	70	DAL
13	**DIEKI**	QUARTIER BAMOUN I	36	OUI	08/11/2022	31	15	29	01	00	30	FDAL
14		QUARTIER BAMOUN II	42	OUI	08/11/2022	39	07	11	02	00	20	FDAL
15	**BANDAM**	KONGUI DJOM	50	OUI	14/11/2022	39	02	19	02	14	28	DAL
16		TCHIM I	50	OUI	14/11/2022	37	01	29	00	12	39	DAL
17		TCHIM II	29	OUI	14/11/2022	14	11	19	02	00	43	FDAL
18		NYAKONG I	52	OUI	15/11/2022	30	04	31	00	18	52	DAL
19		NYAKONG II	30	OUI	15/11/2022	23	06	19	01	00	39	FDAL

20		BANDAM I	155	OUI	17/11/2022	138	12	26	03	00	40	FDAL
21		BANDAM II	205	OUI	17/11/2022	199	12	10	00	00	29	FDAL
22		MVOUH	56	OUI	16/11/2022	50	04	37	00	00	10	FDAL
23	**NYAMBOYA**	YIMBERE	145	OUI	16/11/2022	127	10	98	03	11	46	DAL
24		BARRAGE LUNDI	40	OUI	19/11/2022	32	07	20	02	00	29	FDAL
25		NDOUMDJANDI I	57	OUI	19/11/2022	44	06	28	01	11	28	DAL
26		NDOUMDJANDJI II	23	OUI	19/11/2022	19	06	10	03	00	26	FDAL
27	**TCHAMBA**	NEM NDEM	72	OUI	24/11/2022	63	11	44	00	00	17	FDAL
28		NDUM DJUM	214	OUI	24/11/2022	198	10	130	03	14	37	DAL
29		TCHAMBA I	51	OUI	24/11/2022	43	04	17	02	00	12	FDAL
30		TCHAMBA II	45	OUI	24/11/2022	35	02	14	01	11	08	DAL
31		TCHAMBA II	59	OUI	24/11/2022	51	04	20	00	00	10	FDAL
32		TCHAMBA IV	41	OUI	24/11/2022	39	06	17	02	00	18	FDAL
33		TCHAMBA V	35	OUI	24/11/2022	34	02	21	00	00	18	FDAL
34	**ATTA**	KILA et MELEM	52	OUI	22/11/2022	33	11	28	04	00	22	FDAL
35		PETIT ATTA	60	OUI	22/11/2022	39	10	22	02	00	29	FDAL
36		FIVOURI	20	OUI	22/11/2022	14	11	07	02	00	14	FDAL
37	**SOMIE**	NEW GROUP	40	OUI	22/11/2022	30	16	17	04	00	27	FDAL
38		MBONDJANGA	50	OUI	25/11/2022	30	09	17	06	00	37	FDAL
39		NKUI	118	OUI	25/11/2022	89	16	67	00	00	33	FDAL
40		KONGUI DOUOH I	32	OUI	26/11/2022	25	09	17	02	00	16	FDAL
41		KONGUI DOUOH II	34	OUI	26/11/2022	22	03	10	00	12	18	DAL
42		KONGUI DOUOH III	19	OUI	26/11/2022	17	06	10	01	00	28	FDAL
43		SARKI BAKA I	50	OUI	27/11/2022	37	15	33	03	00	26	FDAL
44		SARKI BAKA II	36	OUI	27/11/2022	29	11	16	04	00	33	FDAL
45		KOUROUM I	30	OUI	28/11/2022	35	11	16	02	00	24	FDAL
46		KOUROUM II	21	OUI	28/11/2022	20	06	10	00	00	18	FDAL
47	**SONKOLONG**	LOUMDE (KOLOK)	35	OUI	28/11/2022	26	09	19	03	00	13	FDAL
48		FINGONG II	46	OUI	29/11/2022	32	11	18	02	00	12	FDAL
	08	**48**	**2756**			**2195**	**389**	**1212**	**87**	**178**	**1424**	

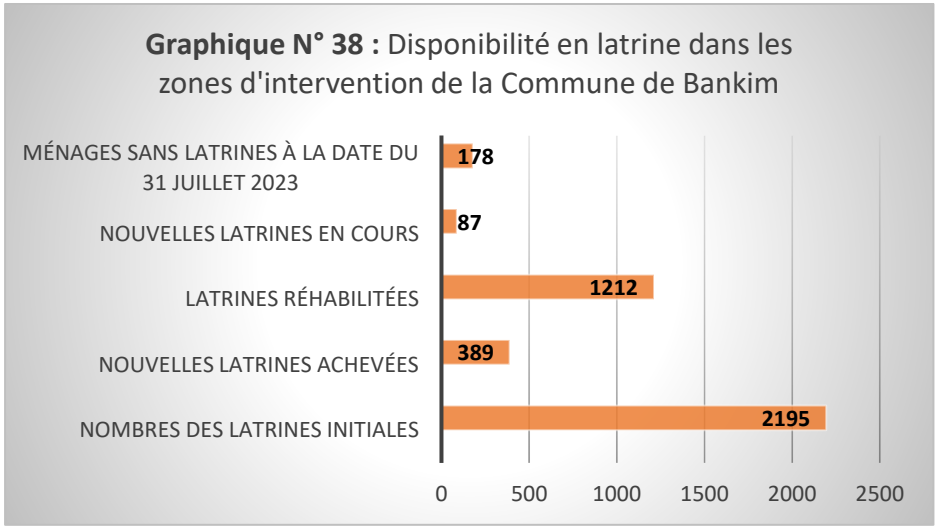

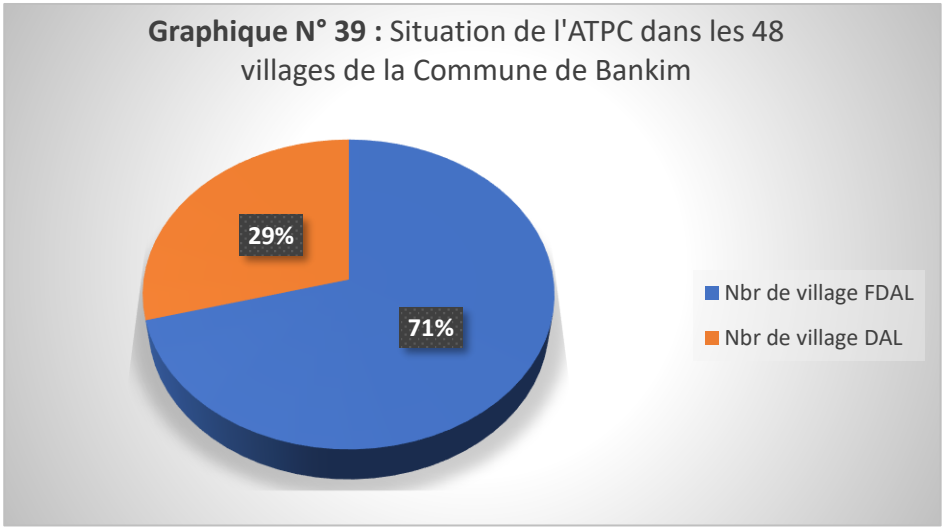

- **SITUATION DES POINTS D'EAU DANS LA COMMUNES DE BANKIM**

Tableau 46 *: Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Commune de BANKIM*

N°	Villages	Nbe. De forages dans les localités		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	NYAKONG MAPE	0	0				
2	NGATTI	2	2	OUI	NON		
3	MBADJI I	0	2	NON			
4	MBOUGAM CHEFFERIE	1	0	1'artisan réparateur qui existe			
5	MBAMBOUAH	1	0	NON			
6	MIBELONG	1	1	OUI	NON		

7	GLORY	2	1	OUI	NON		
8	MBETOCK						
9	CITE MAPE I						
10	MBOUGAM CARREFOUR	1	0	1 artisan réparateur qui existe			
11	QUARTIER BAMOUN I	1	0	OUI	NON		
12	KONGUI DJOM	0	0				
13	TCHIM I	1	0	OUI	NON		
14	NYAKONG I	0	2	OUI	NON		
15	NYAKONG II						
16	BANDAM I	1	5	OUI	NON		
17	MVOUH						
18	YIMBERE	1	2	NON			
19	BARRAGE LUNDI	0	0				
20	NDOUMDJANDI I	1	1	NON			
21	NDEM NDEM	1	0	NON			
22	NDUM DJUM	1	0	NON			
23	TCHAMBA I	1	0	1 artisan réparateur qui existe			
24	KILA et MELEM	0	0				
25	PETIT ATTA	0	1	NON			
26	FIVOURI	2	0	OUI	NON		
27	NEW GROUP						
28	MBONDJANGA	0	1	NON			
29	NKUI	0	0				
30	KONGUI DOUOH I	0	1	NON			
31	SARKI BAKA I	1	3	NON			
32	KOUROUM I	0	2	OUI	NON		
33	LOUMD2 (KOLOK)	0	0				
34	FINGONG II	0	0				
		19	**24**				

c. Activités dans la Commune de MAYO DARLE

L'activité dans la commune de Mayo Darlé a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 05 que compte la commune de Mayo Darlé. Ainsi dix 10 communautés déclenchées ont été suivis durant cette activité.

Le suivi a permis de toucher 488 ménages pour un résultat de 83 nouvelles latrines et 288 latrines réhabilités. Ainsi 100 % de ménages possédent de latrines sur les 10 suivies avec un statut FDAL.



Photo 70 ***:*** *Visite d'une latrine en cours de construction dans la localité de Mondial (Commune de Mayo Darlé)*






Photo 71 et 72 : *Visite des latrines dans la localité de Nguidouga (Commune de Mayo Darlé)*


- **COMMUNAUTES SUIVES DANS LA COMMUNE DE MAYO DARLE**

Tableau 47 *: Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune de MAYO DARLE*

- **District de santé** : BANYO
- **Commune** : MAYO-DARLE

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des	Observations
1	**RIBAO**	GWAYA MAMBILA	31	OUI	17/11/2022	26	11	13	00	00	09	FDAL
2		OURO YOBI I	47	OUI	17/11/2022	115	04	33	00	00	23	FDAL
3		OUURO YOBI II	22	OUI	17/11/2022	32	06	20	00	00	16	FDAL
4		GWAYA YAMBA	70	OUI	18/11/2022	68	07	55	00	00	18	FDAL
5		MAYO-BOUNWA	76	OUI	18/11/2022	80	16	10	00	00	09	FDAL
6		MAYO NGUIDOUNGA	116	OUI	22/11/2022	50	55	26	00	00	36	FDAL
7	**BOUMDO**	YOLI	42	OUI	14/10/2022	49	06	15	00	00	11	FDAL
8		YOLI II	47	OUI	24/11/2022	115	04	26	00	00	29	FDAL
9		MONDIAL I	27	OUI	24/11/2022	19	12	09	00	00	16	FDAL
10		MONDIAL II	84	OUI	24/11/2022	62	42	19	00	00	10	FDAL
	02	**10**	**562**			**616**	**163**	**226**	**00**	**00**	**177**	

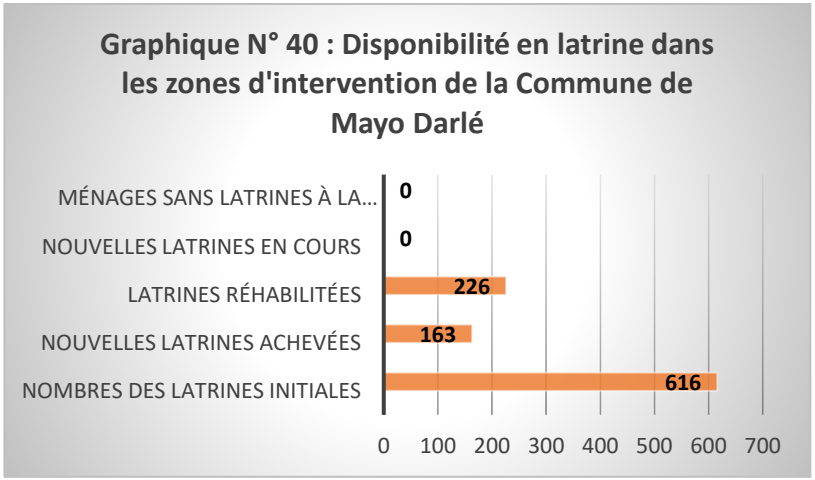

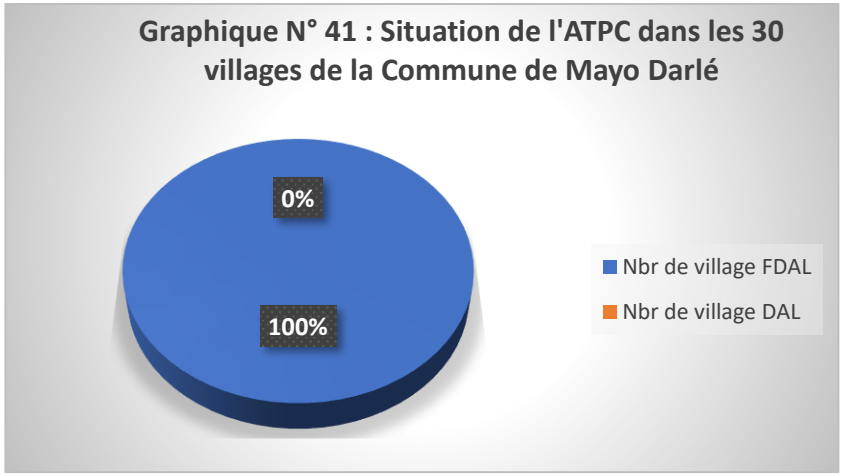

- **SITUATION DES POINTS D'EAU DANS LA COMMUNES DE MAYO DARLE**

Tableau 48 *: Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Commune de MAYO DARLE*

N°	Villages	Nbe. de forages dans le village		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	GWAYA MAMBILA	0	0				
2	OURO YOBI I	1	2	Seul l'artisanat réparateur joue son rôle			
3	GWAYA YAMBA	1	0	OUI	NON	NON	
4	MAYO-BOUNWA	0	0				
5	MAYO NGUIDOUNGA	0	0	NON			

6	YOLI	1	1	Seul l'artisanat réparateur joue son rôle			
7	YOLI II	0	0				
8	MONDIAL I	1	0	OUI	OUI	NON	
9	MONDIAL II	0	1	NON			
TOTAL		**4**	**4**				

2.6.6.2.3 SYNTHESE DES COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA REGION DE L'ADAMAOUA

Tableau 49 *: Récapitulatif des communautés suivies dans la Région de l'Adamaoua*

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants	Observations
1	MEIDJAMBA	DAN HAOUSSA	47	OUI	15/09/2022	27	14	17	1	0	30	FDAL
2		MEIDJAMBA I	98	OUI	15/09/2022	96	17	43	1	0	23	FDAL
3		GONGONTOUA	63	OUI	19/09/2022	49	22	23	0	0	60	FDAL
4		NYADJIDA	32	OUI	19/09/2022	15	17	8	1	0	18	FDAL
5		SOLA	22	OUI	22/09/2022	12	10	7	0	0	19	FDAL
6		MBITOM C	46	OUI	22/09/2022	30	19	11	0	0	47	FDAL
7		MANGLE	21	OUI	11/10/2023	12	10	6	0	0	19	FDAL
8		MEIDJAMBA 2	96	OUI	05/11/2022	92	8	53	0	0	45	FDAL
9	MBAKAOU	GANTANG	58	OUI	21/09/2022	47	17	31	0	0	26	FDAL
10		NDATAL	40	OUI	26/09/2022	21	16	10	1	0	15	FDAL
11		CARRIERE	13	OUI	26/09/2022	10	2	6	0	0	4	FDAL

12	LIBOUM	LIBOUM	28	OUI	20/09/2022	12	9	7	1	1	92	FDAL
13		SAXON	92	OUI	20/09/2022	63	40	28	10	11	30	DAL
14		SISSIMI	69	OUI	21/09/2022	59	22	30	1	0	29	FDAL
15		BONINTING	46	OUI	21/09/2022	38	10	27	2	8	50	FDAL
16		GAOUBELA I	95	OUI	27/09/2022	79	25	43	0	0	123	FDAL
17	NGAOUBELA	GAOUBELA II	211	OUI	27/09/2022	170	30	100	4	1	157	FDAL
18		MENG	222	OUI	27/09/2022	185	25	97	0	0	86	FDAL
19		MALARBA II A	73	OUI	29/09/2022	59	14	32	2	1	56	FDAL
20		MALARBA II B	80	OUI	28/09/2022	93	4	60	2	0	49	FDAL
21		MALARABA II C	51	OUI	28/09/2022	38	26	25	6	0	56	FDAL
22		MACOUP	58	OUI	05/10/2022	32	36	27	0	0	36	FDAL
23		MAHOR	36	OUI	05/10/2022	22	11	10	2	0	21	FDAL
24		TICHE I (DJALINGO)	36	OUI	05/10/2022	22	12	16	4	0	81	FDAL
25		BANTAI I	102	OUI	24/10/2022	76	33	39	0	0	56	FDAL
26		BANTAI II	69	OUI	24/10/2022	40	29	19	0	0	67	FDAL
27		ALHAMISSA	112	OUI	24/10/2022	85	37	33	1	0	23	FDAL
28	NGATT	KANDJE	49	OUI	04/10/2022	21	13	21	1	0	30	FDAL
29		NGATT I	132	OUI	04/10/2022	120	18	79	0	0	62	FDAL
30		NGATT II	120	OUI	04/10/2022	114	26	97	0	0	96	FDAL
31		DJAORO GARGA	132	OUI	03/10/2022	120	19	83	0	0	20	FDAL
32		WANDJOCK	35	OUI	03/10/2022	20	7	13	0	0	62	FDAL
33		ARDO PALANGUEL	117	OUI	03/10/2022	71	26	34	4	0	25	FDAL
34	TONGO	DABER I	62	OUI	12/10/2022	49	13	24	0	0	69	FDAL
35		DABER II	50	OUI	12/10/2022	42	10	37	0	0	79	FDAL
36	ALLAT MEGAT	SALASSA	42	OUI	13/10/2022	33	11	21	0	0	36	FDAL
37		HOSSERE KOBA	62	OUI	18/10/2022	32	12	19	5	10	45	DAL
38	DJOMBI	BANANA	52	OUI	18/10/2022	31	14	21	2	5	25	FDAL

39		DJOMBI II A	29	OUI	19/10/2022	13	16	6	0	0	32	FDAL
40		DJOMBI II B	36	OUI	19/11/2922	18	18	11	1	0	26	FDAL
41		DJOMBI I A	45	OUI	20/10/2022	36	19	18	0	0	33	FDAL
42		DJOMBI I B	62	OUI	20/10/2022	34	30	18	1	0	41	FDAL
43		MAFO I	58	OUI	26/10/2022	56	7	29	0	0	37	FDAL
44		MAFO II	59	OUI	26/10/2022	52	9	33	0	0	32	FDAL
45	TIBATI	MAKANDAO I	42	OUI	27/10/2022	37	12	21	3	0	24	FDAL
46		MAKANDAO II	46	OUI	27/10/2022	36	16	22	2	0	16	FDAL
47	**NGAOUNDAL CATHOLIQUE**	NOGBAYA	20	OUI	03/11/2022	14	8	8	0	0	9	FDAL
48		MBARNANG BAYA	41	OUI	03/11/2022	37	6	21	0	0	1	FDAL
49		GALA	28	OUI	03/11/2022	27	12	11	0	0	25	FDAL
50		MBARNANG FOULBE	27	OUI	25/11/2022	17	11	10	0	0	7	FDAL
51	**DJOUNDE**	DJOUNDE TIGO	57	OUI	04/11/2022	61	11	36	2	0	17	FDAL
52		DJOUNDE CENTRE I	39	OUI	04/11/2022	40	9	28	0	0	35	FDAL
53		DJOUNDE CENTRE II	27	OUI	04/11/2022	31	12	17	1	0	14	FDAL
54		DJOUNDE NDOKO	168	OUI	01/11/2022	197	50	88	2	0	16	FDAL
55		KASSA MBERE	28	OUI	05/11/2022	26	10	19	1	0	14	FDAL
56	**DANFILI**	DANFILI BLOC5 I	42	OUI	08/11/2022	45	11	30	0	0	15	FDAL
57		DANFILI BLOC4 II	59	OUI	08/11/2022	75	16	48	0	0	7	FDAL
58		DANFILI BLOC5 I	52	OUI	08/11/2022	73	11	47	0	0	10	FDAL
59		DANFILI BLOC5 II	51	OUI	09/11/2022	65	1	55	0	0	16	FDAL
60		GONMANA	62	OUI	09/11/2022	74	18	40	1	0	37	FDAL
61	**BETARA CONGO**	BELLA FOKOU	68	OUI	11/11/2022	47	17	23	2	0	18	FDAL
62		BETARA CONGO	75	OUI	11/11/2022	51	13	23	3	6	19	DAL
63		FEBADI I	67	OUI	12/11/2022	53	21	33	0	0	30	FDAL
64		FEBADI II	44	OUI	16/11/2022	34	22	25	0	0	1	FDAL
65		MBANDOUA	19	OUI	17/11/2022	15	7	9	0	0	2	FDAL


66		MAZOUING	112	OUI	17/11/2022	118	20	77	0	23	4	DAL
67		KASSA 1	27	OUI	17/11/2022	29	9	20	0	0	1	FDAL
68		KASSA II	23	OUI	17/11/2022	20	5	17	0	0		FDAL
69		KASSA III	19	OUI	17/11/2022	20	3	17	0	0		FDAL
70	**CMA NGAOUNDAL**	NGALBIZE I	81	OUI	15/11/2022	67	18	50	0	0	8	FDAL
71		NGALBIZE II	45	OUI	16/11/2022	75	2	30	0	0	4	FDAL
72		MASSIF PLATEAU	29	OUI	21/11/2022	25	12	14	1	0	5	FDAL
73		BOULAMA PANGAR II	15	OUI	23/11/2022	18	4	12	0	0	9	FDAL
74	**BEKA GOTTO**	MBIWOROU	49	OUI	23/11/2022	52	29	31	0	0	4	FDAL
75		MBAMIYANGA I	80	OUI	23/11/2022	80	13	58	0	0	9	FDAL
76		MBAMIYANGA II	47	OUI	23/11/2022	78	14	49	0	0	4	FDAL
77	**ALLAT**	NYAWA KATARKO I	60	OUI	24/09/2022	82	9	53	0	0	16	FDAL
78		NYAWA KATARKO II	41	OUI	24/09/2022	50	7	25	0	0	11	FDAL
79		NGUM KATARKO	45	OUI	24/09/2022	92	3	42	0	0	16	FDAL
80		TOUKOURWA	37	OUI	23/09/2022	38	5	27	0	0	12	FDAL
81		MAYO-DJANTANG	28	OUI	01/10/2022	44	6	21	0	0	4	FDAL
82		BENGUEDJI WAWA I	110	OUI	04/10/2022	127	20	58	0	0	20	FDAL
83		BENGUEDJI WAWA II	69	OUI	04/10/2022	80	13	40	0	0	17	FDAL
84		ALARBA BANDA	25	OUI	04/10/2022	18	10	17	0	0	6	FDAL
85		SANGUERE DJAORO ABBO	27	OUI	05/10/2022	31	4	20	0	0	6	FDAL
86		MAYO BOUTALI	87	OUI	05/10/2022	92	10	30	0	0	4	FDAL
87		BON MARCHE	21	OUI	05/10/2022	19	9	11	0	0	3	FDAL
88		NGUM GASSIRI	58	OUI	25/11/2022	72	6	27	0	0	16	FDAL
89		MAYO BADJI	33	OUI	24/11/2022	29	12	10	0	0	7	FDAL
90	**SAMBO LABO**	MBAMTI-DJOUMBARE I	70	OUI	14/10/2022	97	26	33	0	0	17	FDAL
91		MBAMTI-DJOUMBERE II	97	OUI	14/10/2022	124	20	54	0	0	27	FDAL
92		MBAH	97	OUI	17/10/2022	103	13	66	0	0	16	FDAL
93	**BANYO-FADA**	MAYO-FOROU LAISSE	96	OUI	12/10/2022	121	30	65	0	0	18	FDAL


94		OURO-GORDI	54	OUI	12/10/2022	70	11	40	0	0	19	FDAL
95		MAYO FOROU DO	19	OUI	20/10/2022	23	2	11	0	0	10	FDAL
96		MAYO-BANYO BARIKI A	48	OUI	17/10/2022	80	14	30	0	0	9	FDAL
97		MAYO-BANYO BARIKI B	39	OUI	17/10/2022	51	8	16	0	0	6	FDAL
98	**NDI WAWA**	GASSOL TAPAWA	50	OUI	18/10/2022	66	27	10	0	0	6	FDAL
99		MBASSEWA	142	OUI	24/11/2022	144	26	97	0	0	24	FDAL
100		OUMYARI A	119	OUI	24/10/2022	109	13	97	0	0	14	FDAL
101		OUMYARI B	43	OUI	24/10/2022	47	13	33	0	0	9	FDAL
102		BOUDJOUNKOURA A	62	OUI	26/10/2022	109	13	77	0	0	10	FDAL
103		BOUDJOUNKOURA B	75	OUI	26/10/2022	78	10	42	0	0	6	FDAL
104	**BANYO-TICKET**	GAOULA ILLANGA	102	OUI	18/10/2022	144	17	79	9	12	2	DAL
105		BENKE	13	OUI	18/10/2022	21	13	10	0	0	5	FDAL
106		TARAM KATARKO	105	OUI	21/09/2022	163	9	76	0	0	38	FDAL
107		MBOUBOU	39	OUI	26/09/2022	47	16	21	0	0	7	FDAL
108		TARAM SIRI	62	OUI	26/09/2022	88	15	43	0	0	12	FDAL
109		NYATI RANCH	45	OUI	25/11/2022	58	14	39	0	0	10	FDAL
110	**MBAMTI KATARKO**	LABARE BAYA	57	OUI	27/10/2022	70	2	48	0	0	14	FDAL
111		LABARE SEINI	30	OUI	27/10/2022	47	15	22	0	0	11	FDAL
112	**TARAM-YABAM**	TARAM-YABAM	24	OUI	01/10/2022	41	4	32	0	0	10	FDAL
113		BANTAY (TARAM)	112	OUI	02/10/2022	141	27	72	0	0	4	FDAL
114		TARAM-BADJAM	21	OUI	01/10/2022	32	6	16	0	0	4	FDAL
115	**NGATTI**	NYAKONG MAPE	47	OUI	04/11/2022	19	10	9	4	0	17	FDAL
116		MBADJI I	39	OUI	04/11/2022	26	2	20	1	10	29	DAL
117		MBADJI II	31	OUI	04/11/2022	10	11	19	1	0		FDAL
118		MBOUNGAM FIDELE	60	OUI	05/11/2022	49	12	13	2	0	97	FDAL
119		MBAMBOUAH	40	OUI	05/11/2022	29	3	10	1	11	100	DAL
120		GLORY	75	OUI	05/11/2022	50	23	32	2	0	27	FDAL

121		MBETOCK	23	OUI	05/11/2022	17	4	11	3	0	29	FDAL
122		MIBELONG	81	OUI	13/11/2022	69	3	49	2	10	28	DAL
123		NGATTI	93	OUI	17/11/2022	69	10	28	6	14	19	DAL
124	**BANKIM RURAL**	CITE MAPE I	50	OUI	07/11/2022	36	6	30	0	14	19	DAL
125		CITE MAPE II	39	OUI	07/11/2022	28	7	17	2	0	42	FDAL
126		MBOUGAM CARREFOUR	48	OUI	07/11/2022	30	2	18	0	16	70	DAL
127	**DIEKI**	QUARTIER BAMOUN I	36	OUI	08/11/2022	31	15	29	1	0	30	FDAL
128		QUARTIER BAMOUN II	42	OUI	08/11/2022	39	7	11	2	0	20	FDAL
129	**BANDAM**	KONGUI DJOM	50	OUI	14/11/2022	39	2	19	2	14	28	DAL
130		TCHIM I	50	OUI	14/11/2022	37	1	29	0	12	39	DAL
131		TCHIM II	29	OUI	14/11/2022	14	11	19	2	0	43	FDAL
132		NYAKONG I	52	OUI	15/11/2022	30	4	31	0	18	52	DAL
133		NYAKONG II	30	OUI	15/11/2022	23	6	19	1	0	39	FDAL
134		BANDAM I	155	OUI	17/11/2022	138	12	26	3	0	40	FDAL
135		BANDAM II	205	OUI	17/11/2022	199	12	10	0	0	29	FDAL
136		MVOUH	56	OUI	16/11/2022	50	4	37	0	0	10	FDAL
137	**NYAMBOYA**	YIMBERE	145	OUI	16/11/2022	127	10	98	3	11	46	DAL
138		BARRAGE LUNDI	40	OUI	19/11/2022	32	7	20	2	0	29	FDAL
139		NDOUMDJANDI I	57	OUI	19/11/2022	44	6	28	1	11	28	DAL
140		NDOUMDJANDJI II	23	OUI	19/11/2022	19	6	10	3	0	26	FDAL
141	**TCHAMBA**	NEM NDEM	72	OUI	24/11/2022	63	11	44	0	0	17	FDAL
142		NDUM DJUM	214	OUI	24/11/2022	198	10	130	3	14	37	DAL
143		TCHAMBA I	51	OUI	24/11/2022	43	4	17	2	0	12	FDAL
144		TCHAMBA II	45	OUI	24/11/2022	35	2	14	1	11	8	DAL
145		TCHAMBA II	59	OUI	24/11/2022	51	4	20	0	0	10	FDAL
146		TCHAMBA IV	41	OUI	24/11/2022	39	6	17	2	0	18	FDAL
147		TCHAMBA V	35	OUI	24/11/2022	34	2	21	0	0	18	FDAL

148		KILA et MELEM	52	OUI	22/11/2022	33	11	28	4	0	22	FDAL
149	**ATTA**	PETIT ATTA	60	OUI	22/11/2022	39	10	22	2	0	29	FDAL
150		FIVOURI	20	OUI	22/11/2022	14	11	7	2	0	14	FDAL
151		NEW GROUP	40	OUI	22/11/2022	30	16	17	4	0	27	FDAL
152		MBONDJANGA	50	OUI	25/11/2022	30	9	17	6	0	37	FDAL
153		NKUI	118	OUI	25/11/2022	89	16	67	0	0	33	FDAL
154		KONGUI DOUOH I	32	OUI	26/11/2022	25	9	17	2	0	16	FDAL
155		KONGUI DOUOH II	34	OUI	26/11/2022	22	3	10	0	12	18	DAL
156	**SOMIE**	KONGUI DOUOH III	19	OUI	26/11/2022	17	6	10	1	0	28	FDAL
157		SARKI BAKA I	50	OUI	27/11/2022	37	15	33	3	0	26	FDAL
158		SARKI BAKA II	36	OUI	27/11/2022	29	11	16	4	0	33	FDAL
159		KOUROUM I	30	OUI	28/11/2022	35	11	16	2	0	24	FDAL
160		KOUROUM II	21	OUI	28/11/2022	20	6	10	0	0	18	FDAL
161	**SONKOLONG**	LOUMDE (KOLOK)	35	OUI	28/11/2022	26	9	19	3	0	13	FDAL
162		FINGONG II	46	OUI	29/11/2022	32	11	18	2	0	12	FDAL
163		GWAYA MAMBILA	31	OUI	17/11/2022	26	11	13	0	0	9	FDAL
164		OURO YOBI I	47	OUI	17/11/2022	115	4	33	0	0	23	FDAL
165	**RIBAO**	OUURO YOBI II	22	OUI	17/11/2022	32	6	20	0	0	16	FDAL
166		GWAYA YAMBA	70	OUI	18/11/2022	68	7	55	0	0	18	FDAL
167		MAYO-BOUNWA	76	OUI	18/11/2022	80	16	10	0	0	9	FDAL
168		MAYO NGUIDOUNGA	116	OUI	22/11/2022	50	55	26	0	0	10	FDAL
169		YOLI	42	OUI	14/10/2022	49	6	15	0	0	11	FDAL
170	**BOUMDO**	YOLI II	47	OUI	24/11/2022	115	4	26	0	0	10	FDAL
171		MONDIAL I	27	OUI	24/11/2022	19	12	9	0	0	16	FDAL
172		MONDIAL II	84	OUI	24/11/2022	62	42	19	0	0	10	FDAL
	33	**172**	**10227**			**9642**	**2236**	**5309**	**167**	**256**	**4678**	

Globalement le suivi des plans d'action communautaire dans la région de l'Adamaoua nous permis de toucher 10 227 ménages pour un résultat de 2 236 nouvelles latrines et 5 309 latrines réhabilités. 256 ménages sans latrines et 167 autres latrines en cours de construction, ainsi 96 % de ménages possédant de latrines pour 155 localités sur les 172 suivies avec un statut FDAL.

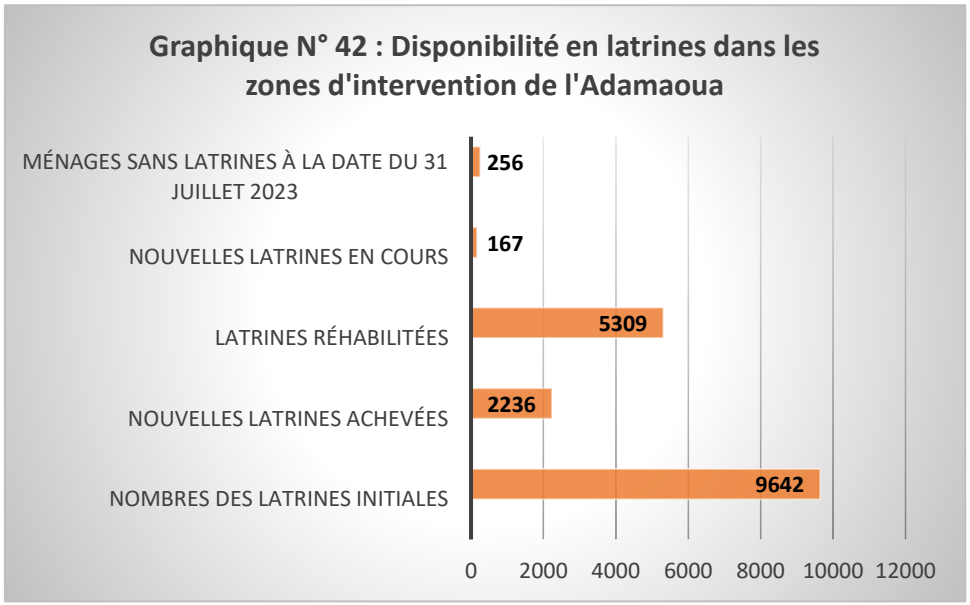

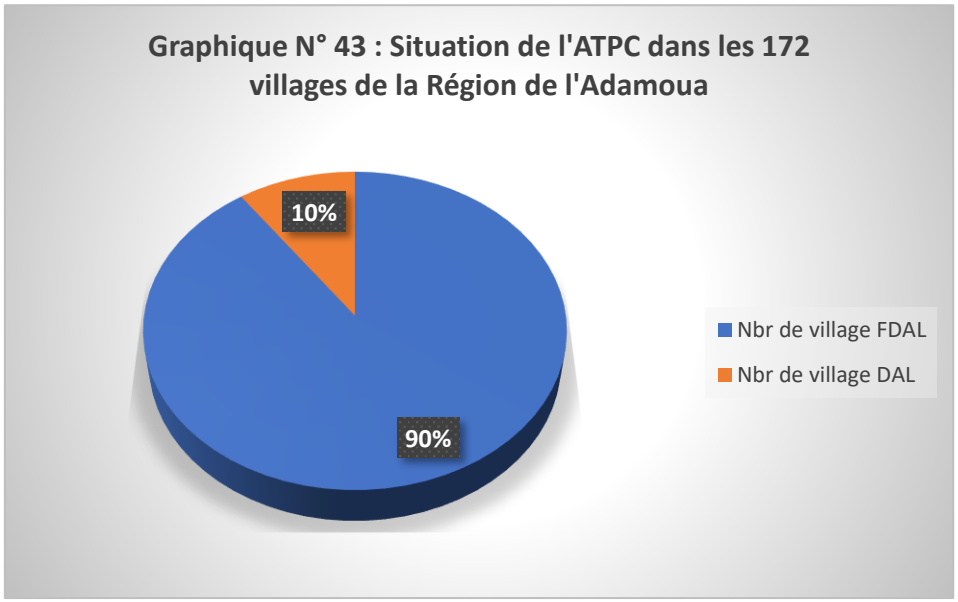

2.6.6.2.4 Synthese des communautes sensibilisees dans la region de l'adamaoua

Tableau 50 *: Récapitulatif des données des campagnes de sensibilisation dans la Région de l'Adamaoua*

COMMUNE	THEMES DEVELOPPES LORS DU SUIVI POST DECLENCHEMENT											
	Potabilisation de l'eau			Hygiène environnementale et corporelle			Technique et moment clés de lavage des mains			Prévention et traitement contre le cholera		
	H	**F**	**E**	**H**	**F**	**E**	**H**	**F**	**E**	**H**	**F**	**E**
BANYO	74	69	75	225	186	173	307	331	298	0	0	0
MAYO DARLE	69	73	49	74	99	69	0	0	0	0	0	0
NGAOUNDAL	227	318	201	175	269	178	100	154	103	14	17	06
TIBATI	243	314	189	281	416	267	274	416	302	233	361	242
	613	**774**	**514**	**755**	**970**	**687**	**681**	**901**	**703**	**247**	**378**	**248**

2.6.6.2.5 Le suivi post-déclenchement dans le département du HAUT-NYONG

Pendant la période, l'ONG a mené des activités de suivi des plans d'action communautaire post-déclenchement dans les communes d'ABONG MBANG, MINDOUROU et ANGOSSAS ; Département de Haut Nyong, Région de l'Est.

a. Principal résultat attend au cours de cette période

Le principal résultat attendu au cours de cette période est :

- Toutes les localités déclenchées à l'ATPC sont suivi.

b. Activités menées durant la période

Pendant cette période, les activités ci-dessous ont été menées:

- Le suivi des plans d'action ;
- Les visites à domicile et la collecte des données ;
- La sensibilisation des communautés sur les bonnes pratiques Wash.

Les activités se sont tenues simultanément dans chaque commune. L'implication des populations dans toutes les étapes du suivi telles que :

- Introduction et établissement d'une relation de confiance ;
- La conduite des visites à domiciles ;
- La construction des latrines ;
- Les séances de sensibilisation.

c. Activités dans la Commune d'ABONG MBANG

L'activité dans cette commune a été menée globalement dans 04 aires de santé. Ainsi dix 19 communautés déclenchées ont été suivies durant cette activité.

Le suivi a permis de toucher 1 707 ménages pour un résultat de 394 nouvelles latrines et 116 latrines réhabilités. 255 ménages sans latrines et 58 autres latrines en cours de construction, ainsi 82% de ménages possédant de latrines et 06 localités FDAL sur les 19 suivies avec un statut FDAL.




Photo 73 et 74 : *Remplissage du cahier par la facilitatrice et suivi des constructions des latrines avec un CLS Plan dans la localité de NKouak (Commune d'Abong Mbang)*




Photo 75 et 76 : ***S****uivi des constructions des latrines avec un CLS Plan dans la localité de Zoguembou (Commune d'Abong Mbang)*




<u>Photo 77 et 78</u>*: Porte à porte avec un CLS dans la localité d'Adouma (Commune d'Angossas)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE D'ABONG MBANG**

Tableau 51 *: Récapitulatif des données par communautés lors du suivi dans la Commune d'ABONG MBANG*


- **District de santé** : ABONG-MBANG
- **Commune** : ABONG-MBANG

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des	Observations
1	**ABONG MBANG SUD**	DJENASSOUME	105	OUI	17/11/2022	60	37	2	3	5	0	FDAL
2		ANZIE	130	OUI	17/11/2022	72	15	7	8	12	22	DAL
3		ANKOAMBOM	48	OUI	24/11/2022	24	19	9	2	3	0	DAL
4		ZOGUEMBOU	55	OUI	17/11/2022	34	14	4	2	5	2	DAL
5		NKOUOLOU	62	OUI	18/11/2022	10	12	4	4	21		DAL
6		OBOUL 2	50	OUI	23/11/2022	26	21	7	0	3	0	FDAL
7		NTIMBE I	83	OUI	19/11/2022	31	5	3	4	40		DAL
8	**ABONG MBANG OUEST**	ADOUMA	149	OUI	19/11/2022	79	39	5	11	20	28	DAL
9		BAGOFIT	128	OUI	20/11/2022	97	15	3	0	16	7	DAL
10		ANKOUNG	70	OUI	21/11/2022	32	30	12	4	4		DAL
11		NKOUAL	86	OUI	21/11/2022	48	28	12	2	8	5	DAL
12		NDJODJOCK	70	OUI	21/11/2022	43	20	7	4	3		FDAL
13		DJIBE	63	OUI	22/11/2022	37	21	11	2	3		FDAL
14		MAZABE	104	OUI	20/11/2022	65	21	1	2	16	0	DAL
15	**ABONG MBANG EST**	TIMBE II	122	OUI	23/11/2022	73	3	4	2	40		DAL
16		MPEMZOCK I	112	OUI	22/11/2022	67	34	7	2	9		FDAL
17		MPEMZOCK II	46	OUI	23/11/2022	20	3	9	0	14		DAL
18		BAMAKO	115	OUI	19/11/2022	71	28	3	4	12		FDAL
19	**NKOUACK**	SOKAMALAM	109	OUI	22/11/2022	57	29	6	2	21	31	DAL
TOTAL			**1707**			**946**	**394**	**116**	**58**	**255**	**95**	

Graphique N° 44 : Disponibilité en latrine dans les zones d'intervention de la Commune d'Abong Mbang

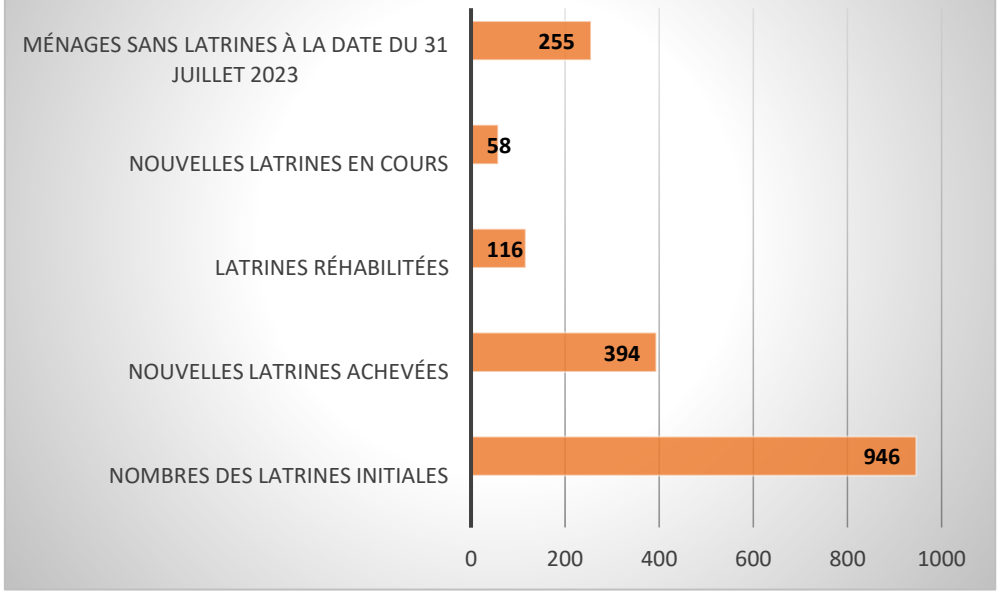

Graphique 45 : Situation de l'ATPC dans les 19 villages de la Commune d'Abong Mbang

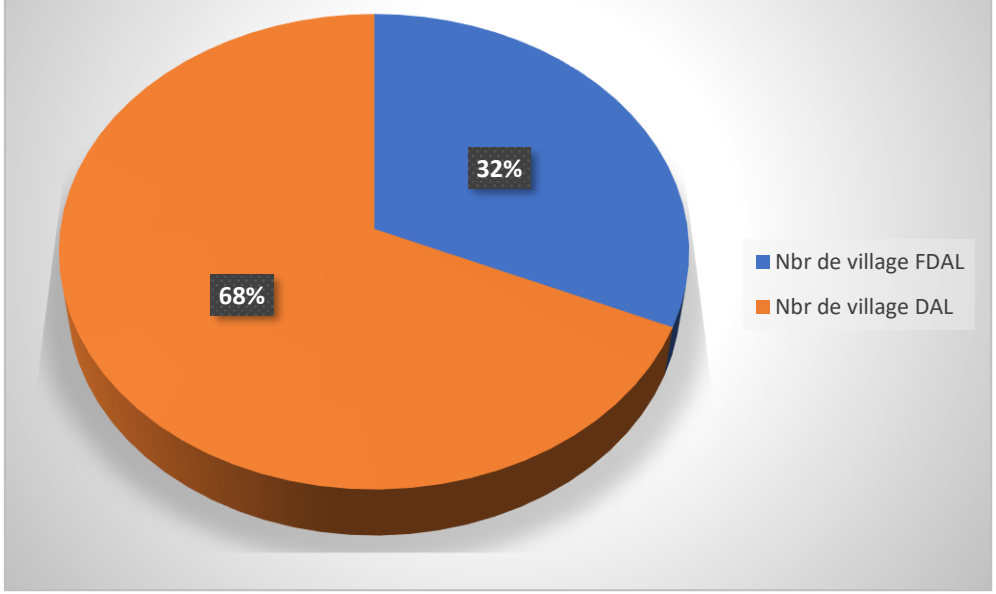

d. Activités dans la Commune de MINDOUROU

L'activité dans cette commune a été menée globalement dans 02 aires de santé sur les 04 que compte la commune de Mindourou.

Le suivi a permis de toucher 975 ménages pour un résultat de 177 nouvelles latrines et 135 latrines réhabilités. 460 ménages sans latrines et 54 autres latrines en cours de construction, ainsi 53 % de ménages possédant de latrines et 01 localité FDAL sur les 15 suivies avec un statut FDAL.





Photo 79 et 80 *: Mobilisation communautaire lors du déclenchement dans la localité Nkouak (Commune de Mindourou)*





Photo 81 et 82 *: Suivi des constructions des latrines dans la localité de Dioula (Commune de Mindourou)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE DE MINDOUROU**

Tableau 52 : *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune de MINDOUROU*


- **District de santé** : MINDOUROU
- **Commune** : MINDOUROU

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nbres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants	Observations
1	NKOUAK	NKOUAK	75	OUI	30/11/2022	16	13	18	11	12	06	DAL
2		NONGBWALA	45	OUI	05/12/2022	05	07	06	04	16	03	DAL
3		DJOUYAYA	48	OUI	05/12/2022	07	09	14	18	27	03	DAL
4		ETSIEK	46	OUI	01/12/2022	16	08	05	03	10	02	DAL
5		KAGNOL	38	OUI	01/12/2022	11	3	0	1	23		DAL
6		DJOLEMPOUM	71	OUI	01/12/2022	28	06	11	05	21	04	DAL
7		MALENE	56	OUI	02/12/2022	10	09	06	00	32	06	DAL
8		BEDOUMO	92	OUI	03/12/2022	04	08	06	00	54	00	DAL
9		MAYANG	42	OUI	02/12/2022	22	17	7	02	01	09	FDAL
10		AMPEL	85	OUI	08/12/2022	16	07	03	03	44	04	DAL
11		MEDJOH	144	OUI	03/12/2022	14	12	04	00	112	05	DAL
12		EDEN	48	OUI	04/12/2022	06	01	09	00	32	02	DAL
13	DJAPOSTEN	TONKLA	62	OUI	04/12/2022	12	11	09	00	26	02	DAL
14		NKOUL	56	OUI	04/12/2022	04	09	13	02	28	03	DAL
15		DIOULA	67	OUI	04/12/2022	06	13	24	04	22	04	DAL
	02	**15**	**975**			**177**	**133**	**135**	**54**	**460**	**51**	

Graphique N° 46 : Disponibilité en latrine dans les zones d'intervention de la Commune de Mindourou

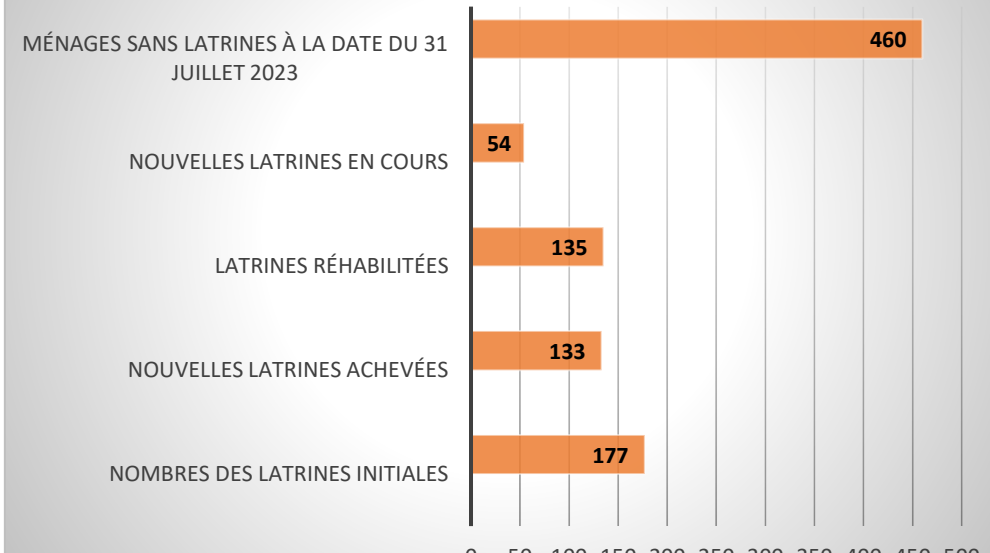

Graphique 47 : Situation de l'ATPC dans les 15 villages de la Commune de Mindourou

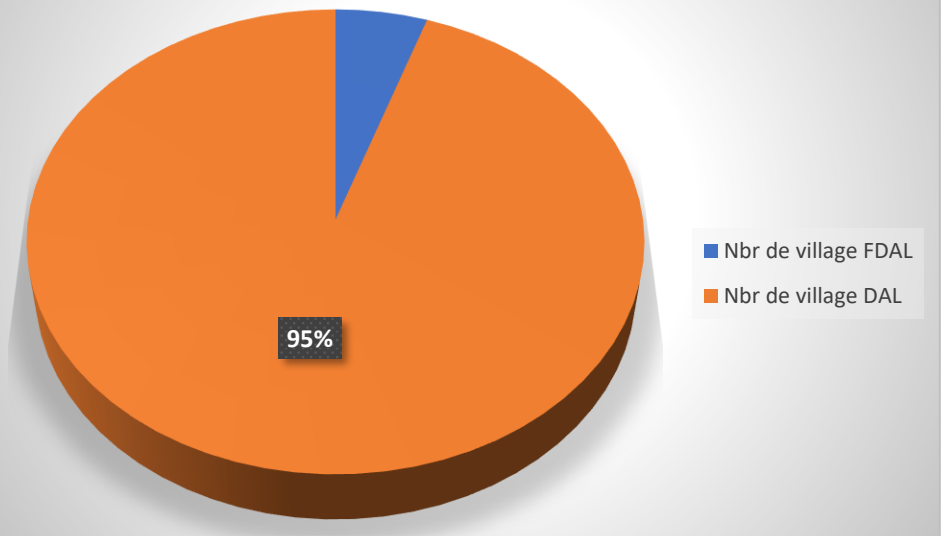

e. Activités dans la Commune d'ANGOSSAS

L'activité dans cette commune a été menée globalement dans 01 aire de santé sur les 05 que compte la commune.

Le suivi a permis de toucher 534 ménages pour un résultat de 415 nouvelles latrines et 157 latrines réhabilités. 33 ménages sans latrines et 16 autres latrines en cours de construction, ainsi 92 % de ménages possédant de latrines et 04 localités FDAL sur les 05 suivies avec un statut FDAL.




Photo 83 ***:*** *Remplissage du cahier par la facilitatrice en présence des CLS Plan dans la localité de Bagbézé 2 (Commune d'Angossas)*


- **COMMUNAUTES SUIVIES DANS LA COMMUNE D'ANGOSSAS**

Tableau 53 ***:*** *Récapitulatif des données par communautés lors des déclenchements dans la Commune d'ANGOSSAS*

- **District de santé** : ANGOSSAS
- **Commune** : ANGOSSAS

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des	Observations
1	ANGOSSAS	BAGOLOUL	108	OUI	01/11/2022	59	34	16	4	11	03	DAL
2		DJIKOUNDJI	82	OUI	02/11/2022	58	22	9	0	2	03	FADL
3		ABONIS	64	OUI	03/11/2022	37	21	14	2	4	04	FDAL
4		BAGBEZE 2	167	OUI	04/11/2022	108	41	16	8	10	05	FDAL
5		NKEK	200	OUI	01/10/2022	153	39	39	2	6	03	FDAL
	01	**05**	**621**			**415**	**157**	**94**	**16**	**33**	**18**	

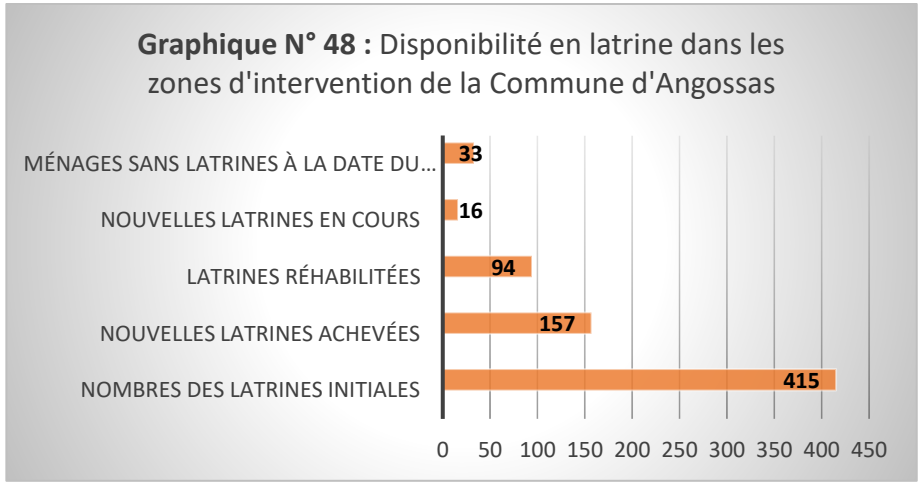

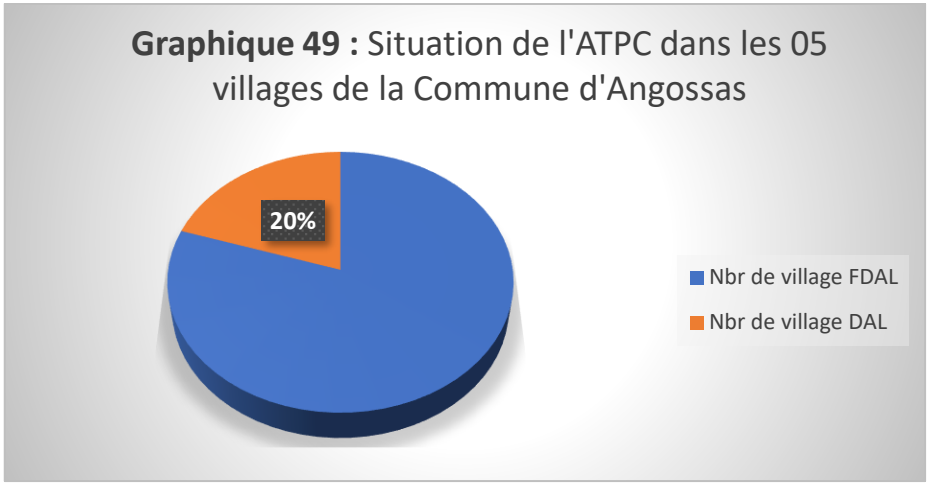

2.6.6.2.6 Synthese communautes suivies dans la region de l'est


Tableau 54 *: Récapitulatif des communautés suivies dans la Région de l'Est*

N°	Aire de santé	Villages	Nbre de ménage/ Concession	Engagement en termes de construction de latrines	Date Déclenchement	Nombres des latrines initiales	Nouvelles latrines achevées	Latrines réhabilitées	Nouvelles latrines en cours	Ménages sans latrines à la date du 31 Juillet 2023	Nombre de ménages équipés d'un pot pour la défécation des enfants	Observations
1		DJENASSOUME	105	OUI	17/11/2022	60	37	2	3	5	0	FDAL
2		ANZIE	130	OUI	17/11/2022	72	15	7	8	12	22	DAL
3	**ABONG**	ANKOAMBOM	48	OUI	24/11/2022	24	19	9	2	3	0	DAL
4	**MBANG**	ZOGUEMBOU	55	OUI	17/11/2022	34	14	4	2	5	2	DAL
5	**SUD**	NKOUOLOU	62	OUI	18/11/2022	10	12	4	4	21		DAL
6		OBOUL I	50	OUI	23/11/2022	26	21	7	0	3	0	FDAL
7		NTIMBE I	83	OUI	19/11/2022	31	5	3	4	40		DAL
8		ADOUMA	149	OUI	19/11/2022	79	39	5	11	20	28	DAL


9	**ABONG MBANG OUEST**	BAGOFIT	128	OUI	20/11/2022	97	15	3	0	16	7	DAL
10		ANKOUNG	70	OUI	21/11/2022	32	30	12	4	4		DAL
11		NKOUAL	86	OUI	21/11/2022	48	28	12	2	8	5	DAL
12		NDJODJOCK	70	OUI	21/11/2022	43	20	7	4	3		FDAL
13		DJIBE	63	OUI	22/11/2022	37	21	11	2	3		FDAL
14		MAZABE	104	OUI	20/11/2022	65	21	1	2	16	0	DAL
15	**ABONG MBANG EST**	TIMBE II	122	OUI	23/11/2022	73	3	4	2	40		DAL
16		MPEMZOCK I	112	OUI	22/11/2022	67	34	7	2	9		FDAL
17		MPEMZOCK II	46	OUI	23/11/2022	20	3	9	0	14		DAL
18		BAMAKO	115	OUI	19/11/2022	71	28	3	4	12		FDAL
19	**NKOUACK**	SOKAMALAM	109	OUI	22/11/2022	57	29	6	2	21	31	DAL
20	NKOUAK	NKOUAK	75	OUI	30/11/2022	16	13	18	11	12	6	DAL
21		NONGBWALA	45	OUI	05/12/2022	5	7	6	4	16	3	DAL
22		DJOUYAYA	48	OUI	05/12/2022	7	9	14	18	27	3	DAL
23		ETSIEK	46	OUI	01/12/2022	16	8	5	3	10	2	DAL
24		KAGNOL	38	OUI	01/12/2022	11	3	0	1	23		DAL
25		DJOLEMPOUM	71	OUI	01/12/2022	28	6	11	5	21	4	DAL
26		MALENE	56	OUI	02/12/2022	10	9	6	0	32	4	DAL
27		BEDOUMO	92	OUI	03/12/2022	4	8	6	0	54	0	DAL
28		MAYANG	42	OUI	02/12/2022	22	17	7	2	1	9	FDAL
29		AMPEL	85	OUI	08/12/2022	16	7	3	3	44	4	DAL
30		MEDJOH	144	OUI	03/12/2022	14	12	4	0	112	5	DAL
31		EDEN	48	OUI	04/12/2022	6	1	9	0	32	2	DAL
32	DJAPOSTEN	TONKLA	62	OUI	04/12/2022	12	11	9	0	26	2	DAL
33		NKOUL	56	OUI	04/12/2022	4	9	13	2	28	3	DAL
34		DIOULA	67	OUI	04/12/2022	6	13	24	4	22	4	DAL
35	**ANGOSSAS**	BAGOLOUL	108	OUI	01/11/2022	59	34	16	4	11	3	DAL
36		DJIKOUNDJI	82	OUI	02/11/2022	58	22	9	0	2	3	FADL
37		ABONIS	64	OUI	03/11/2022	37	21	14	2	4	4	FDAL
38		BAGBEZE 2	167	OUI	04/11/2022	108	41	16	8	10	5	FDAL
39		NKEK	200	OUI	01/10/2022	153	39	39	2	6	3	FDAL
	07	**39**	**3303**			**1538**	**684**	**345**	**127**	**748**	**164**	

Globalement le suivi des plans d'action communautaire dans la région de l'Est nous a permis de toucher 3 303 ménages pour un résultat de 684 nouvelles latrines et 345 latrines réhabilités. 748 ménages sans latrines et 127 autres latrines en cours de construction, ainsi 57 % de ménages possédant de latrines, et 11 localités FDAL sur les 39 suivies avec un statut FDAL

Graphique N° 50 : Disponibilité en latrines dans les zones d'intervention du Haut Nyong

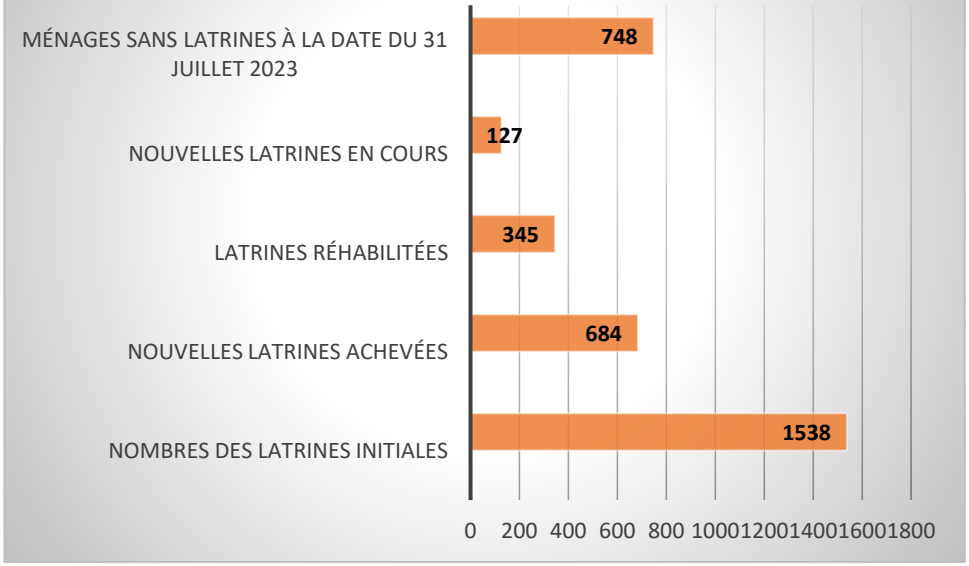

Graphique 51 : Situation de l'ATPC dans les 39 villages du Département du Haut Nyong

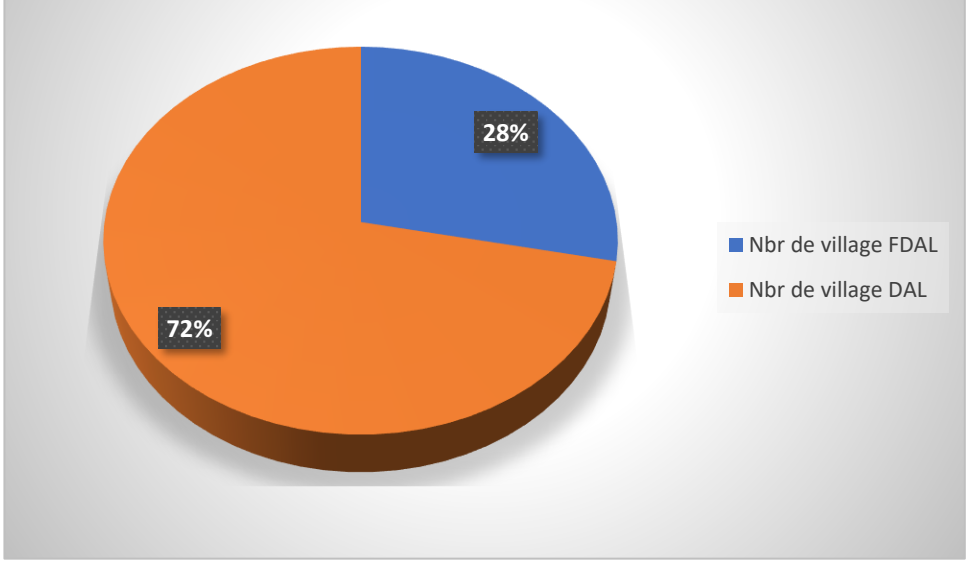

2.6.6.2.7 Synthese de la situation des points d'eau dans la region de l'est

Tableau 55 *: Récapitulatif des données des points d'eau et COGES dans la Région de l'Est*


N°	Villages	Nbe. de forages dans le village		Existence de COGES	COGES fonctionnel	COGES reçu la formation	Structure ayant formé le COGES
		Forages fonctionnels	Forages non fonctionnels				
1	BAGBEZE2	1	2	NON			
2	ABONIS	2	2	NON			
3	KEK	1	1				
4	DIKOUNDJI	0	1	NON			
5	BAGOLOUL	1	2				
6	MPEMZOCK2	2	1	NON			
7	MPEMZOCK1	0	1	NON			
8	SOKAMALAM	1	3				
9	OBOUL2	1	0				
10	NDIBE	2	0	NON			
11	NKOUAL	1	2				
12	NDJODJOCK	1	1				
13	BAMAKO	1	2				
14	ANKOUNG	1	2				
15	MAZABE	1	1	OUI	NON	NON	
16	BAGOFIT	1	2	OUI	OUI	non	
17	ADOUMA	1	1				
18	NTIMBE1	0	0	OUI	OUI	non	
19	OBOUL1	0	0	OUI	OUI	non	
20	ANKOUABOMB	1	0			non	
21	NKOUOULOU	0	0	NON		non	
22	ZOGUEMBOU	1	2	OUI	OUI	non	
23	DJENASSOUME	1	0			non	


24	ANZIE	1	2	OUI	OUI	non	
25	DIOLA	1	2	OUI	OUI	non	
26	NKOUAK	1	2			non	
27	MALENE	0	2	OUI	OUI	non	
28	MAYENE	1	2	Oui		non	
29	DJOUYAYA	1	3	OUI	OUI	non	
30	AMPEL	2	4	Oui			
31	MAYANG	1	2	Oui			
32	TONKLA	2	4	non			
33	MEDJO	0	2	non			
34	NONGBWALA	0	3	non			
35	ETSIEK	0	2	OUI	OUI	non	
TOTAL		**31**	**56**				

2.7 Résultats obtenus

Tout au long de l'activité, nous avons obtenu les résultats suivants :

- 02 régions touchées à savoir les Régions de l'Adamaoua et de l'Est;
- 03 départements touchés dont le Haut Nyong, le Mayo Banyo et le Djérem ;
- 08 Districts de santé touchés à savoir les DS de Tibati, de Banyo, de Bankim, de Mindourou, d'Angossas, de Mayo Darle, de Ngaoundal et d'Abong Mbang ;
- 40 aires de santé touchées ;
- 255 localités touchées ;
- 29 877 ménages visités pour une population totale de 244 613 personnes composée de 88 634 hommes, 105 845 femmes et 50 134 enfants de moins de 5 ans ;
- 214 communautés déclenchées ;
- 213 communautés déclenchées, 193 ont été déclarées au statut FDAL (marqué par leur certification) pour un taux de 91,07% ;
- Au total 13 530 ménages visités, 2 920 nouvelles latrines et 5 654 réhabilités, 1 004 ménages ne possédant pas de latrines et 294 autres latrines en cours de construction ;
- 91,07 % de ménages suivies possèdent de latrines pour 166 localités suivies avec un statut FDAL ;
- 7471 personnes touchées dans les séances de sensibilisation soit 2296 hommes, 3023 femmes et 2152 enfants.

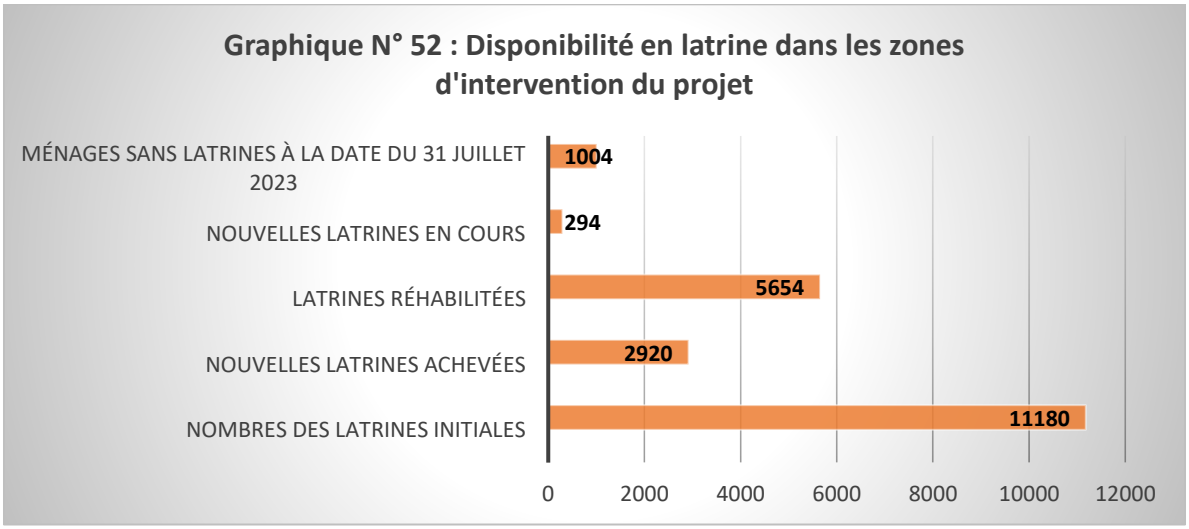

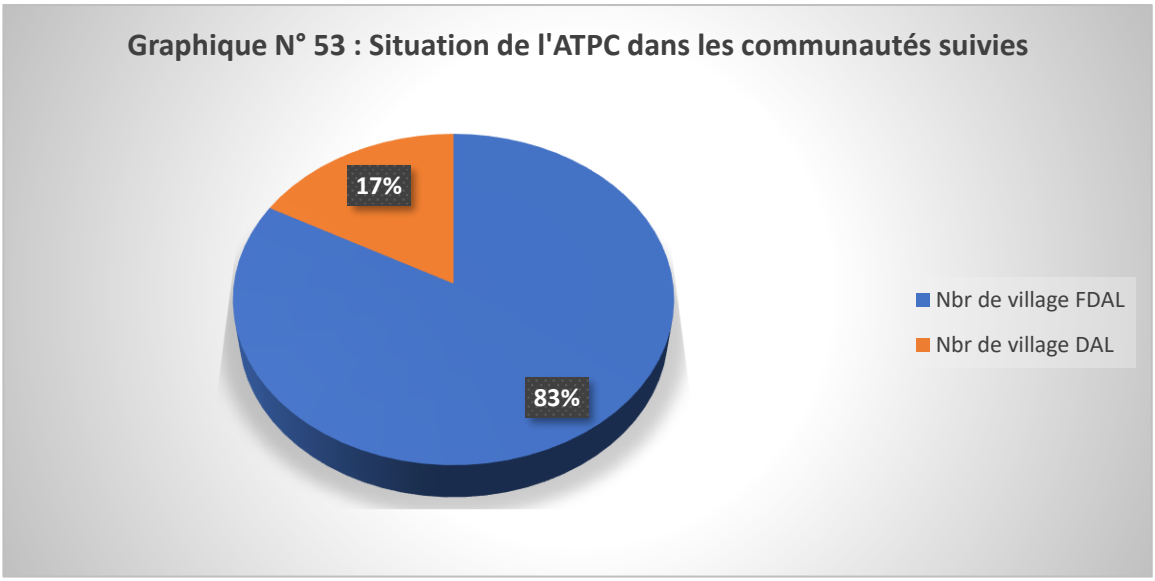

2.8 Difficultés rencontrées et solutions proposées

- Faible mobilisation des populations lors des mobilisations à cause de la période des débuts des travaux champêtres et des pluies ;
- Le déni de l'utilisation des latrines par certaines populations ;
- Mauvaises volontés dans certaines localités de l'Est qui demandent une subvention pour l'acquisition des latrines;
- Des CLS de certaines localités qui demande une motivation pour la mise en œuvre des activités et qui sont soutenus par le chef du village ;
- L'abandon ou démission de certains CLS ;
- Faible revenu des ménages pour motiver la main d'œuvre pour les fouilles de la fosse ;
- Faible suivi au niveau de l'ONG, communal et aussi départemental ;
- Les pluies de plus en plus présentes ;
- Les grandes distances entre les localités dans la même commune ;
- La longue distance séparant les ménages d'un même village ;
- Phénomène de la transhumance récurrent entrainant l'exode de population ;
- La divagation des animaux domestiques ;
- L'enclavement / l'inaccessibilité de certains villages par la voiture en saison de pluie.

2.9 Suggestions

- Des rendez-vous ont été reprogrammés et des CLS ont été remplacé ;
- Des visites à une fréquence des quotidiennes pour les localités réfractaires aux changements de comportement et hebdomadaires pour celle qui ont déjà un statut FDAL
- Encadrer les comités villageois de suivi
- Créer un bon climat de confiance pendant les prises des rendez-vous pour une meilleure présence de la population ;
- Rassurer et s'accorder avec les communautés à reprogrammer les rendez-vous ratés pour cause de pluie.
- Forte recommandation aux animateurs de quitter le terrain au plus tard à 16H ;

- Les points focaux communaux ainsi que les sectoriels aux niveaux départemental devraient multiplier des descentes sur le terrain.

2.10 Leçons apprises et un succes story (l'histoire raconté par un maire relativement à l'adoption des bonne pratiques

- C'est important que les membres de la communauté soient les guides pendant le suivi aussi elles peuvent voir comment les actions prévues se passent sur le terrain, et les modifier comme nécessaire.
- Les populations de certaines localités de Ngaoundal qui avaient comme croyance que l'utilisation des latrines ralentissait la reproduction animale. Dès lors que la sensibilisation est passée dans ces localités, ils se sont rendu compte que c'étaient simplement des mauvaises habitudes et ont construit des latrines et l'utilisent.
- Certaines communautés dans la commune de Bankim utilisent plutôt une latrines pour plusieurs ménages et sont plus des latrines communautaires que familiales.

2.11 Conclusion

Cette activité de l'ATPC a permis aux membres des communautés de visualiser une échelle d'assainissement où tout le monde peut grimper à sa manière vers la fin de la défécation à l'air libre. Pour y arriver, des différentes pratiques et installations ont été possible pour réduire la défécation à l'air libre et tout ceci initié par les communautés elles-mêmes.

Les communautés ont excellé par la création des solutions et technologies appropriées et faisables, spécifiquement adaptées aux conditions locales. Pendant cette activité, la communauté a mis en avant le changement de comportement.

Ce changement de comportement fondamental est le résultat du suivi des plans d'actions pour permettre à la communauté de réaliser les améliorations qu'elle a conçues ou prévues.

Nous tenons à dire une fois de plus un grand merci aux communautés de nous avoir facilité les visites dans les domiciles.

Nous tenons aussi à remercier les autorités administratives, les communes, les autorités traditionnelles ainsi que toute l'équipe du projet pour leurs disponibilités, leurs implications sans toutefois minimiser les conseils et autres recommandations qui ont été faites en autre encontre.

J'aimerais aussi dire un merci aux équipes de terrain qui ont tout au long du projet surmonter des difficultés avec bravoures telles que les aléas climatiques, les mauvais états des routes, les dénis et autres mauvaises volontés des certains communautés.

Le plus dur restera sans doute la capacité de tous les acteurs à pouvoir maintenir de manière définitive le statut des communautés FDAL et aussi de stimuler, impulser un changement de mentalité dans toutes les localités des communes qui ont été touchées lors de ce projet.
